



VOORTGANGSRAPPORTAGE

MEI 2018

Regioprojecten Infrastructuur



INHOUD

Samenvatting	5
Projecten Regio Noord	6
Overzichtskaart 2018	6
Projecten 2018	7
Waar staan we	8
Toprisico	8
Doorkijk 2019 - 2022	9
Projecten 2019 - 2022	10
Projecten Regio Oost	11
Overzichtskaart 2018	11
Projecten 2018	12
Waar staan we	12
Toprisico	12
Doorkijk 2019 - 2022	13
Projecten 2019 - 2022	14
Projecten Regio Zuid	15
Overzichtskaart 2018	15
Projecten 2018	16
Waar staan we	16
Toprisico	16
Doorkijk 2019 - 2022	17
Projecten 2019 - 2022	18
Besluitvorming en rol Provinciale Staten	19
Externe Communicatie	19

SAMENVATTING

Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de reguliere projecten, die in de drie Flevolandse regio's in 2018 uitgevoerd worden. Het jaarprogramma 2018 is per regio door middel van een kaart inzichtelijk gemaakt. In de tabellen staat de voortgang beschreven van de projecten, die conform de opgestelde projectplannen verloopt. De projecten die afwijken in tijd en/of scope zijn nader toegelicht.


De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen (MBVI 2018). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastructuur op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de infrastructurele projecten (niet-jaarlijks onderhoud) die we in de regio opleveren.

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan de doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van de provinciale vaarwegen. Door gebruik te maken van programmamanagement, goed risicomanagement, adequaat contractmanagement en te anticiperen op de marktsituatie is het mogelijk om de gewenste resultaten binnen het projectbudget te realiseren.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de projecten in 2018 conform de projectplanning worden gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat, na een zorgvuldige afweging van belangen, ervoor is gekozen om een aantal projecten in de regio Noord te verschuiven van planjaar 2018 naar 2019 of 2020.

PROJECTEN REGIO NOORD

Overzichtskaart 2018

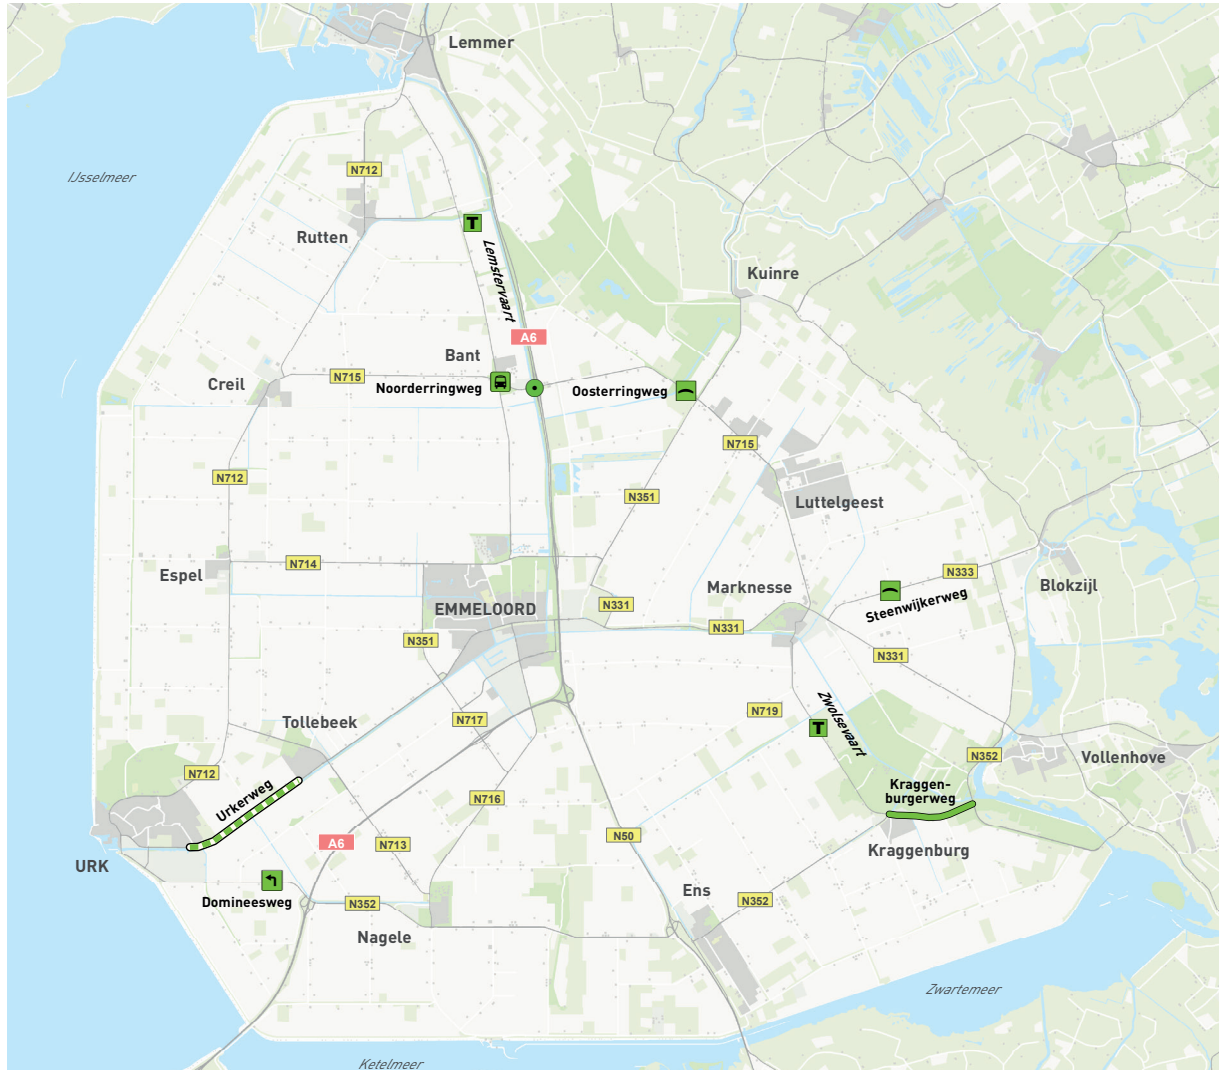

PROJECTEN REGIO NOORD



Soort werkzaamheden

- Onderhoud rijbaan
- Onderhoud fietspad
- Werkzaamheden rotonde
- Werkzaamheden plateau
- Aanleg linksafvak
- Werkzaamheden bushaltes
- Aanleg trailerhelling

Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
16140 Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne	Realiseren nieuw linksafvak ter hoogte van Windinformatiecentrum 11 beaufort.
18127 Aansluiting afrit A6 - Oosterringweg	De aanleg van een rotonde bij de op- en afrit van de A6 bij Bant, inclusief het onderhoud aan het brugdek.
18105 fietspad Urkerweg	Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf bebouwde kom Urk tot Tollebeek.
17111 rijbaan Kraggenburgerweg	Reconstructie Kraggenburgerweg vanaf rotonde Kraggenburgerweg tot Voorstersluis.
17111 rijbaan Repelweg	Reconstructie Repelweg vanaf Voorstersluis tot rotonde Vollenhoverweg.
16103 rijbaan Zuidwesterringweg	Reconstructie Zuidwesterringweg vanaf Staartweg tot A6.
18105 fietspad Domineesweg	Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf bebouwde kom Urk tot A6.
19103 rijbaan Noorderringweg	Reconstructie van de Noorderringweg tussen de Graaf Florislaan (bebouwde kom Creil) tot en met de rotonde bij Bant

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
16140 Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne	2018	ja
18127 Aansluiting afrit A6 - Oosterringweg	2018	ja
18105 fietspad Urkerweg	2018	ja
17111 rijbaan Kraggenburgerweg	2018	ja
17111 rijbaan Repelweg	2019	nee (zie toelichting)
16103 rijbaan Zuidwesterringweg	2019	nee (zie toelichting)
18105 fietspad Domineesweg	2019	nee (zie toelichting)
19103 rijbaan Noorderringweg	2019	nee (zie toelichting)

Verbreding Zuidwesterringweg

De uitvoering van de projecten Zuidwesterringweg en Repelweg schuift één jaar door, naar 2019. Dit is het gevolg van een conflict tussen de gewenste wegverbreding en de aanwezigheid van bomen (op korte afstand) langs de wegen. Hierdoor moet naar een alternatieve verbredingswijze worden gezocht. Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveiligheid op de wegen.

Repelweg

Zie Zuidwesterringweg.

Fietspad Domineesweg

Er loopt een juridische procedure, inzake beheerstroken, met bewoners aan de Domineesweg die de voortuin hebben doorgetrokken tot aan het fietspad. De aanleg van het betonnen fietspad is uitgesteld tot na afronding van de procedure. Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveiligheid.

Verbreding Noorderringweg

Omdat een traditionele wegverbreding moeilijk uitvoerbaar is bij de Noorderringweg, is afgelopen najaar een nieuwe funderingstechniek getest. Deze proef heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom wordt deze zomer een tweede proef gedaan. Het onderhoud en de verbreding van de weg schuift daarom één jaar door, naar 2019. Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveiligheid op de Noorderringweg.

Toprisico

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Slechte fundering weg vanuit het verleden	Tijdig aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals boringen en bodemscans. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de huidige situatie en kunnen hier rekening mee houden in tijd en budget.

Doorkijk 2019 - 2022



PROJECTEN REGIO NOORD

	Soort werkzaamheden
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werkzaamheden rotonde
	Werkzaamheden verkeersregelinstanties
	Werkzaamheden bushaltes
	Werkzaamheden bij (fiets)brug
	Werkzaamheden bij sluis
	Aanleg faunavoorzieningen
	Vervanging beplanting
	Werkzaamheden oever / beschoeiing
	Vervanging remmingswerk
	Jaar van uitvoering
	2019
	2020
	2021
	2022




Projecten 2019 - 2022

Naam project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
19122 Repelweg	planuitwerkingsfase	2019
16103 rijbaan Zuidwesterringweg	planuitwerkingsfase	2019
20120 fietspad Domineesweg	planuitwerkingsfase	2019
19103 rijbaan Noorderringweg	planuitwerkingsfase	2019
19113 rotonde Muntweg/Kuinderweg en fietspad Muntweg	planuitwerkingsfase	2019
19102 Natuurvriendelijke oevers Zwolsevaart (Emmeloord - Marknesse)	definitiefase	2019/2020
19120 Urkervaart en Lemstervaart (repareren betonnen oeverbeschoeiingen en vervangen Remmingswerk)	initiatieffase	2019/2021
20118 Leemringweg	definitiefase	2019
20101 rijbaan Espelerringweg	planuitwerkingsfase	2020
20103 fietspad Nagelerweg, Zuiderringweg, Kamperweg en Gemaalweg	initiatieffase	2020
Vervangen fietsbrug Marknesserweg	initiatieffase	2020
21101 rijbaan Oosterringweg	verkenningsfase	2021
21102 rijbaan Espelerweg	initiatieffase	2021
21301 brug Hannie Schaftweg	initiatieffase	2021
19112 Oosterringweg	verkenningsfase	2021
21109 Marknessersluis NJO	initiatieffase	2021
18201 bomen Kuinderweg	initiatieffase	2022
22105 rijbaan Zuiderringweg	initiatieffase	2022
22106 rijbaan Urkerweg	initiatieffase	2022
18201 rijbaan Kuinderweg	initiatieffase	2022
22202 Vervanging bomen Wrakkenweg	initiatieffase	2022

PROJECTEN REGIO OOST

Overzichtskaart 2018

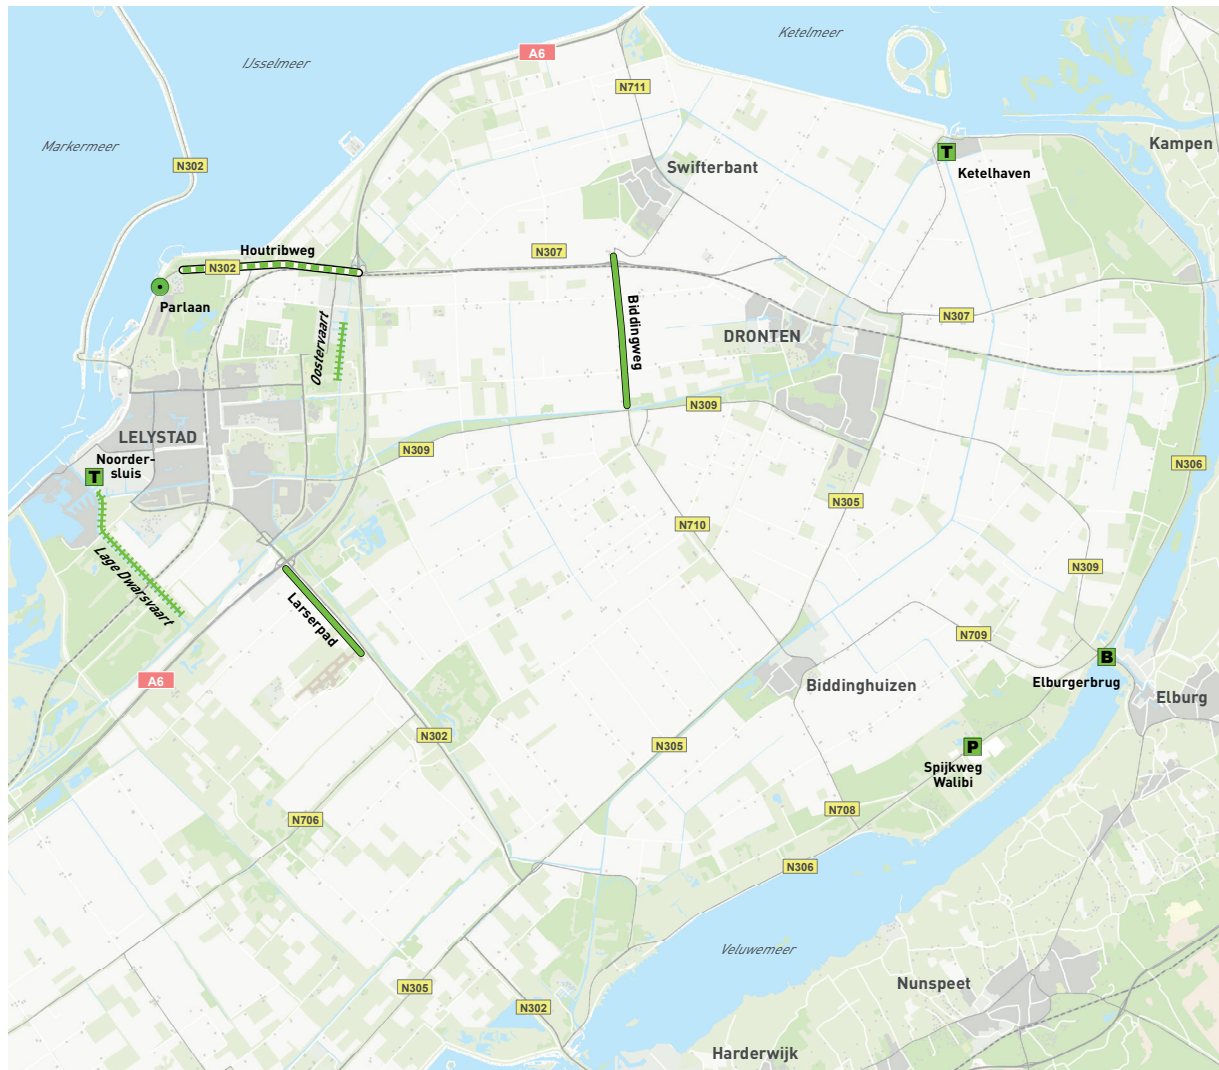

PROJECTEN REGIO OOST

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werkzaamheden rotonde
	Ontsluiting parkeerplaats
	Werkzaamheden bij brug
	Werkzaamheden oever/beschoeiing
	Aanleg trailerhelling



Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
17122 Biddingweg	Onderhoud hoofdrijbaan van de Biddingweg te Dronten van hm 3,0 tot hm 6,6.
17128 Larserpad	Onderhoud en reconstructie parallelrijbaan van het Larserpad te Lelystad van de kruising Larserpad - Eendenweg tot de brug over de Lage Vaart.
18124 Oostervaart	Groot onderhoud beschoeiingen van de beide oevers van de Lage Vaart te Lelystad van de aansluiting op de Lage Vaart tot de Steenstraat
18130 Lage Dwarsvaart	Verspreid over de gehele Lage Dwarsvaart te Lelystad, op een aantal plaatsen werkzaamheden aan beschoeiingen op beide oevers.
18116 Houtribdijk fietspad IJsselmeerdijk en VRI	Onderhoud fietspad tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk in combinatie met realisatie geregelde ontsluiting van Flevokust op Houtribweg

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
17122 Biddingweg	2018	Ja
17128 Larserpad	2018	Ja
18124 Oostervaart	2019	Ja
18130 Lage Dwarsvaart	2019	Ja
18116 Houtribdijk	2018	Ja
Geen afwijking in het programma		

Toprisico


Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering werkzaamheden in relatie tot bezoek recreatieparken en evenementen in regio Oostelijk Flevoland.	In nauw overleg met stakeholders wegafsluitingen plannen voor de opening van het recreatieseizoen en/of tussen de grote evenementen door.

Doorkijk 2019 - 2022



PROJECTEN REGIO OOST

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
Jaar van uitvoering	
	2019
	2020
	2021
	2022



Projecten 2019 - 2022

Naam Project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
18107 Biddingringweg	planuitwerkingsfase	2019
18110 Hanzeweg	verkenningenfase	2019
18117 fp Dronterweg	planuitwerkingsfase	2019
19107 Oldebroekerweg	planuitwerkingsfase	2019
19110 Larserweg	planuitwerkingsfase	2019
20107 Swifterraingweg	planuitwerkingsfase	2020
20108 Harderdijk	planuitwerkingsfase	2020
20109 Dronterweg	planuitwerkingsfase	2020
20201 Harderbosweg	planuitwerkingsfase	2021
21103 Larserpad II	planuitwerkingsfase	2021
21107 Biddingringweg	planuitwerkingsfase	2021
22104 Bremerbergweg	planuitwerkingsfase	2022
22113 Swifterweg	planuitwerkingsfase	2022

Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
18203 bomen Nijkerkerweg	Kap en aanplant van bomen langs de Nijkerkerweg tussen de Flediteweg en de Gooiseweg en het vervangen van dode bomen tussen de Flediteweg en Slingerweg
18123 fietspad Spiekweg	Aanleg van een fietspad tussen de Horsterweg en het Nulderpad met CO2 neutraal beton
20110 Schollevaarweg-Spiekweg	Reconstructie van de rijbaan tussen de brug over de Hoge Vaart en de Roerdompweg
19109 Vogelweg	Reconstructie van de rijbaan tussen de A27 en Waterlandseweg en onderhoud aan het kunstwerk over de Hoge Vaart
18127 aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27	De aanleg van een rotonde bij de afrit A6 op de Buitenring en de aanleg van een middengeleider bij de op- en afrit A27 op de Vogelweg.

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
18203 bomen Nijkerkerweg	2018	Ja
18123 fietspad Spiekweg	2018	Ja
20110 Schollevaarweg-Spiekweg	2018	Ja
19109 Vogelweg	2018	Ja
18127 aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27	2018	Ja
Geen afwijking in het programma		

Toprisico


Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infrastructurele werkzaamheden rondom Almere	Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Doorkijk 2019 - 2022



PROJECTEN REGIO ZUID

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werkzaamheden rotonde
	Werkzaamheden VRI
	Vervanging beplanting
	Werkzaamheden oever/beschoeiing
Jaar van uitvoering	
	2019
	2020
	2021
	2022



Projecten 2019 - 2022

Naam Project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
16132 rijbaan Slingerweg	planuitwerkingsfase	2019
19201 populieren Buitenring	planuitwerkingsfase	2019
19108 rijbaan Spiekweg	planuitwerkingsfase	2019
19118 Oevers Hoge Vaart	planuitwerkingsfase	2019
21105 rijbaan Futenweg	definitiefase	2020
15303 VRI 1017 en 1061	definitiefase	2020
21106 Fietspad Oostvaardersdijk	definitiefase	2020
21104 Rijbaan Eemmeerdiijk	verkenningenfase	2020
21201 Bomen Hogering	verkenningenfase	2021
21108 rotonde NBC	verkenningenfase	2021
21110 Oevers Hoge Vaart	verkenningenfase	2021
22201 bomen Tussenring	verkenningenfase	2022
22102 rijbaan Oostvaardersdijk	verkenningenfase	2022
22103 kruising Nijkerkerweg-Spiekweg	verkenningenfase	2022
22112 oevers Hoge Vaart	verkenningenfase	2022

BESLUITVORMING EN ROL PROVINCIALE STATEN

- Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.

In het coalitieakkoord is afgesproken een sobere en doelmatige uitvoering na te streven.

EXTERNE COMMUNICATIE

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg;
- Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins, aankondiging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken;
- Social media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, voortgang van werkzaamheden, calamiteiten e.d.

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten.

COLOFON

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 26 55 66
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Mei 2018
eDocs #2221299
