



*Onderwerp*

2e voortgangsrapportage regioprojecten infrastructuur 2022

*Kern mededeling:*

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regelmaat over de voortgang van de infrastructurele projecten.

*Mededeling:*

Bijgaande voortgangsrapportage geeft u de voortgang van de groot onderhoud projecten op de provinciale infrastructuur met peildatum oktober 2022.

*Bijlagen*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
2 <sup>e</sup> voortgangsrapportage regioprojecten INFRA 2022	3009527	Ja

*Registratienummer*

3052528

*Datum*

27 december 2022

*Afdeling/Bureau*

INFRA

*Openbaarheid*

**Openbaar**

*Portefeuillehouder*

**Reus, J. de**

**Ter kennisname aan PS en burgerleden**



PROVINCIE FLEVOLAND

# 2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage

## regioprojecten



Oktober 2022

# Samenvatting

**Dit is de voortgangsrapportage van de regioprojecten. Daarnaast is er nog een aantal grote infrastructurele projecten waarvoor u aparte voortgangsrapportages ontvangt. Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de projecten voor groot onderhoud aan onze wegen en vaarwegen. Het gaat hier om reguliere projecten zoals de vervanging van wegen en fietspaden, kleinere reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook verkeerslichten, beplanting en aanleg van walbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers e.d.**

Tijdens het tweede coronajaar (2021) zijn de prijzen fors opgelopen en doorlooptijden opgelopen door de schaarste aan mensen en materiaal. In 2022 is de situatie verslechterd door de situatie in Oekraïne. Dit heeft nadelige consequenties voor zowel de provincie als haar contractpartners.


In deze voortgangsrapportage is het jaarprogramma 2022 per regio inzichtelijk gemaakt door middel van een kaart. In de tabellen onder de kaart staat een omschrijving van de projecten en kunt u de voortgang zien. Daarnaast zijn enkele topisico's nader toegelicht en presenteren wij een doorkijk van onze regionale projecten voor de periode 2023-2026.

Van de 27 projecten die geprogrammeerd zijn wordt in deze VGR de oplevering van 4 projecten (doorgeschoven naar 2023). Deze 4 projecten hebben de volgende redenen van vertraging:

- Langere duur werkzaamheden nutsbedrijven;
- Capaciteitsproblemen projectleiders;
- Planten van bomen in plantseizoen;
- Technische complexiteit.

# Projecten regio Noord 2022

## Overzichtskaart 2022

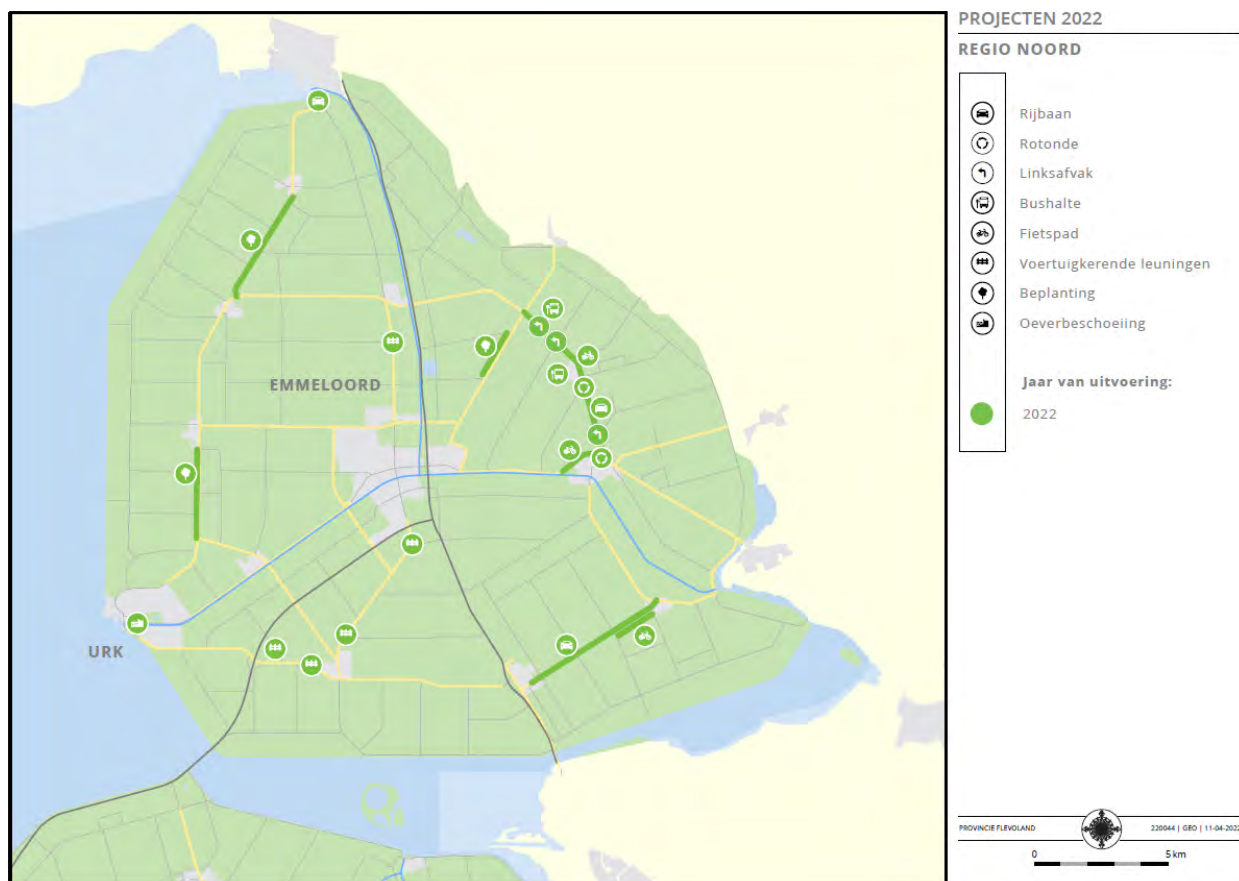

## Projecten 2022

Naam project	Korte omschrijving
Bomen Espelerringweg	Vervangen bomen.
Bomen Wrakkenweg	Vervanging bomen fietspadzijde.
Voertuigkerende leuning op 5 bruggen.	Aanbrengen voertuigkerende leuning op bruggen in de Nagelerweg, Akkerstraat, Banterweg en Domineesweg.
Reconstructie Oosterringweg tussen Kuinderweg en Marknesserweg	Onderhoud rijbaan, rotonde en fietspad en de aanleg drie linksafvakken en nieuwe rotonde.
Bomen Kuinderweg	Vervangen bomen.
Schouwpad Marknesserweg	Reconstructie verharding tussen Emmeloordseweg en Oosterringweg.
Rijbaan Zuiderringweg en fietspad	Onderhoud verharding rijbaan en gedeelte fietspad Hertenweg – Neushoornweg.
Asfaltconstructie Friesesluis, Marknessersluis.	Vervangen asfaltverharding.
Oeverconstructie Urkervaart	Vervanging oeverconstructie.


## Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Bomen Espelerringweg	2022	Ja
Bomen Wrakkenweg	2023	Ja
Voertuigkerende leuningen op 5 bruggen.	2023	Nee, vanwege de complexiteit rondom de brugconstructies neemt de voorbereiding meer tijd in beslag dan de andere reguliere projecten. De aanbesteding start in 2022, maar de uitvoering zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.
Reconstructie Oosterringweg tussen Kuinderweg en Marknesserweg	2022	Deels. Door onvoorziene werkzaamheden bij nutsbedrijven is de uitvoering vertraagd. De reconstructie van de weg is gereed, maar de reconstructie van het fietspad wordt doorgeschoven naar het voorjaar van 2023.
Bomen Kuinderweg	2022	Ja
Schouwpad Marknesserweg	2022	Ja
Rijbaan Zuiderringweg en fietspad	2022	Ja
Asfaltconstructie Friesesluis, Marknessersluis.	2022	Ja
Overconstructie Urkervaart	2022	Ja

## Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Krapte in de berm zorgt bij wegverbreding voor complexiteit met kabels / leidingen en bomen.	Andere (constructieve) oplossingen toepassen, zoals: Licht funderen over de kabels en leidingen heen; Bomenrij weghalen; Grond aankopen om bomen en kabels en leidingen te verplaatsen.
Om conflicten tijdens de oogstperiode te voorkomen worden de projecten in het voorjaar en de zomer uitgevoerd. Hierdoor ontstaat het risico dat er onvoldoende mogelijkheden voor het goed omleiden van het verkeer, omdat er dan ook werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.

## Doorkijk 2023-2026

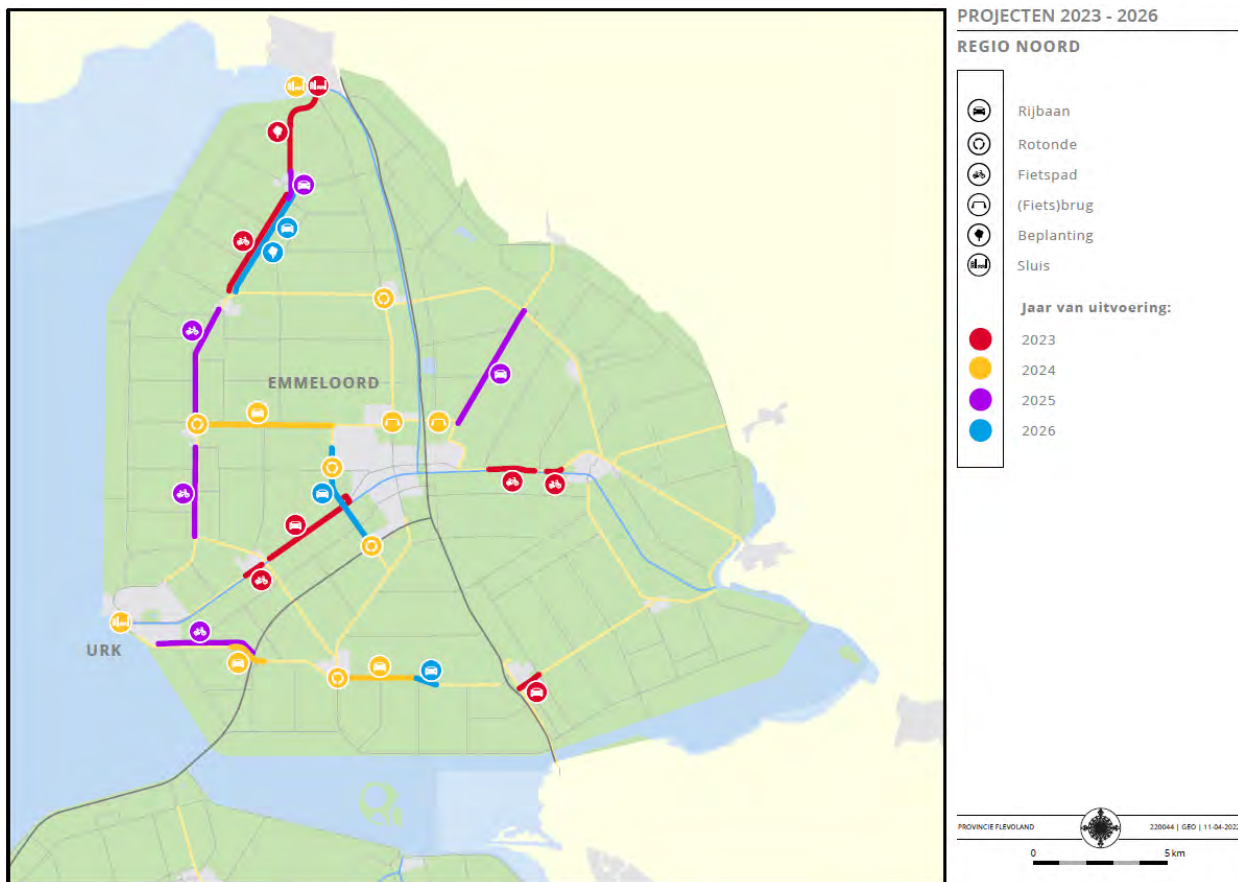


Om de overzichtskaarten overzichtelijk te houden zijn de volgende regio-overschrijdende projecten niet opgenomen op de kaart:

- - 2023 Verlichting: noord: 11 locaties, oost: 15 locaties, zuid: 17 locaties;
- - 2023 Leuningen op bruggen: noord: 4 locaties, oost: 7 locaties, zuid: 11 locaties;
- - 2023 Verkeerslichten: noord: 1 locatie, oost: 9 stuks, zuid: 29 stuks.

# Projecten regio Oost 2022

## Overzichtskaart 2022

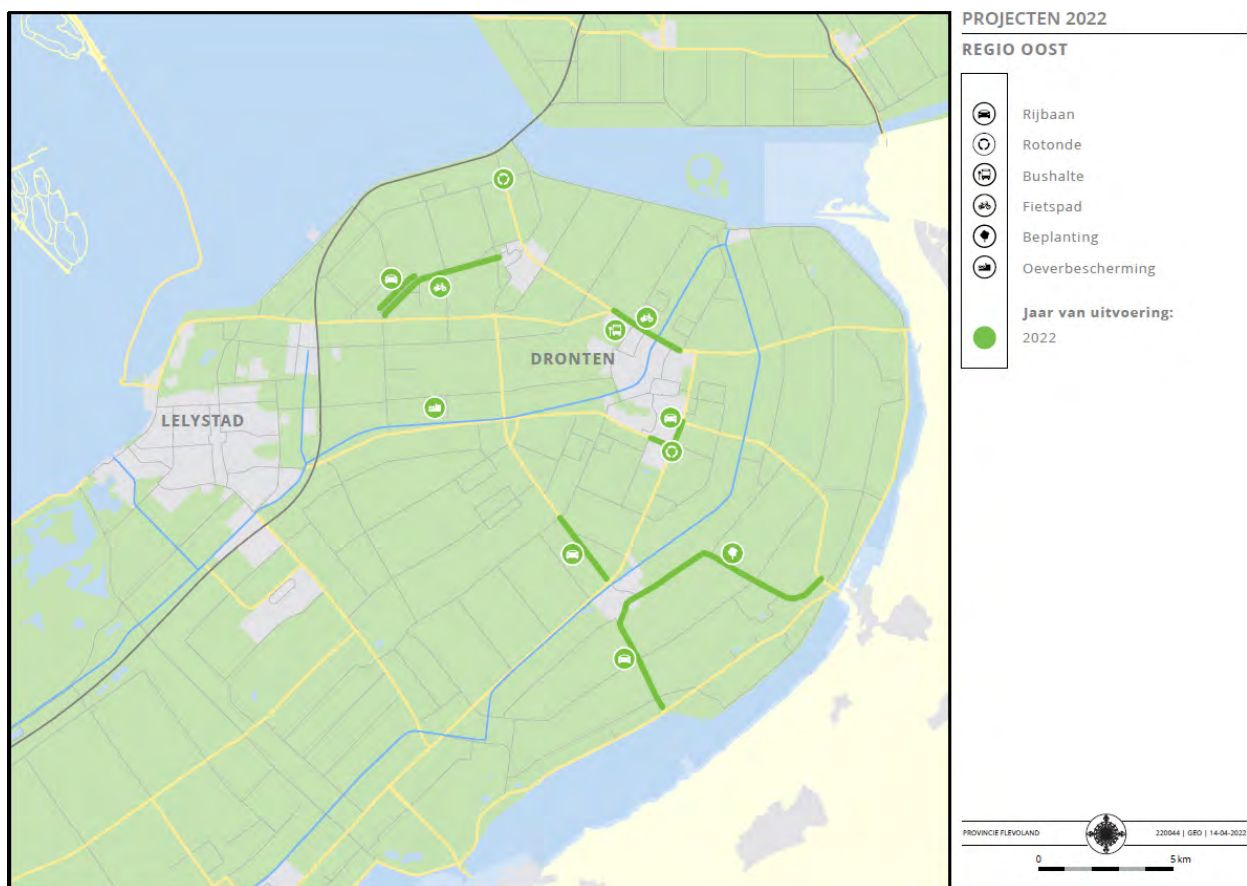

## Projecten 2022

Naam project	Korte omschrijving
Rijbaan Swiferringweg	Vervangen fietspad door beton; onderhoud rijbaan.
Rotonde en rijbaan Biddingringweg – Dronterweg	Aanleg nieuwe rotonde [in beton]; vervanging asfaltdeklaag Dronterweg tussen rotondes de West en De Zuid; vervanging asfalt linker rijbaan Biddingring-weg tussen Dronterweg en Elburgerweg.
Beplanting Oldebroekerweg / Bremerbergweg	Vervangen bomen.
Rotonde Kamperhoekweg	Groot onderhoud rotonde.
Rijbaan Swifterweg	Groot onderhoud rijbaan en verbreding van Rotonde Rietweg <-> Aansluiting Biddingringweg.
Fietspad Dronterringweg	Vervangen asfaltfietspad door beton van hm 6.6 (ten noorden van Ovonde Overijsselse-weg) - rotonde De Noord.
Rijbaan Bremerbergweg	Groot onderhoud rijbaan en verbreding van Bebouwde kom Biddinghuizen <-> Rotonde Harderdijk.
Oeverconstructie Lage Vaart	Vervanging oeverconstructie.

## Waar staan we


Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Rijbaan Swiferringweg	2022	Ja
Rijbaan Biddingringweg – Dronterweg rotonde en	2022	Ja
Bepanting Oldebroekerweg / Bremerbergweg	2022	Ja
Rotonde Kamperhoekweg	2022	Ja
Rijbaan Swifterweg	2022/2024	Ja
Fietspad Dronterringweg	2022	Vanwege capaciteitsproblemen bij projectleiders heeft het project vertraging opgelopen in de voorbereiding. Hierdoor zal een deel van de werkzaamheden doorschuiven naar 2023.
Rijbaan Bremerbergweg	2022	Ja
Oeverconstructie Lage Vaart	2023	Ja

## Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Door de grote hoeveelheid projecten die gelijktijdig in de uitvoering komen zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het goed omleiden van het verkeer.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.



## Doorkijk 2023-2026

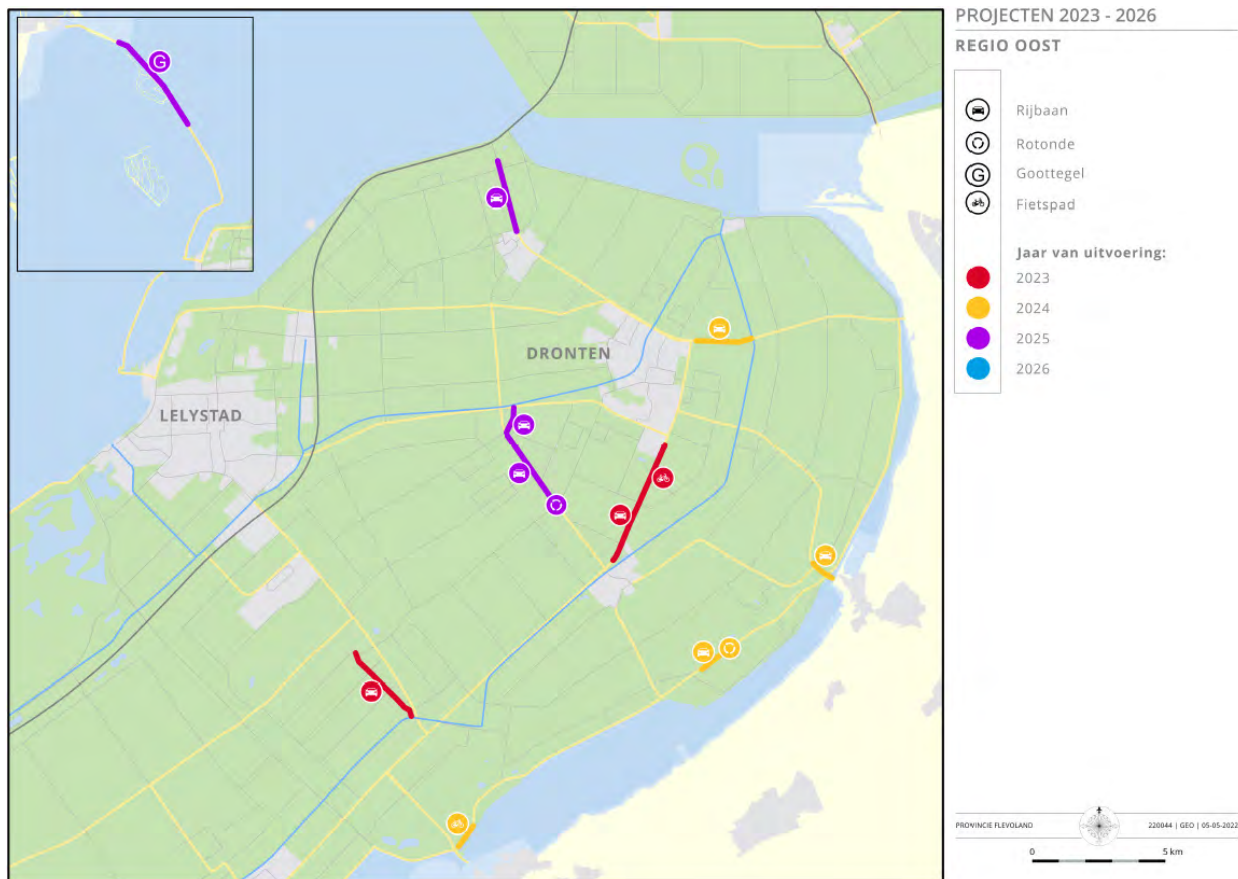


Om de overzichtskaarten overzichtelijk te houden zijn de volgende regio-overschrijdende projecten niet opgenomen op de kaart:

- - 2023 Verlichting: noord: 11 locaties, oost: 15 locaties, zuid: 17 locaties;
- - 2023 Leuningen op bruggen: noord: 4 locaties, oost: 7 locaties, zuid: 11 locaties;
- - 2023 Verkeerslichten: noord: 1 locatie, oost: 9 stuks, zuid: 29 stuks.

# Projecten regio Zuid 2022

## Overzichtskaart 2022

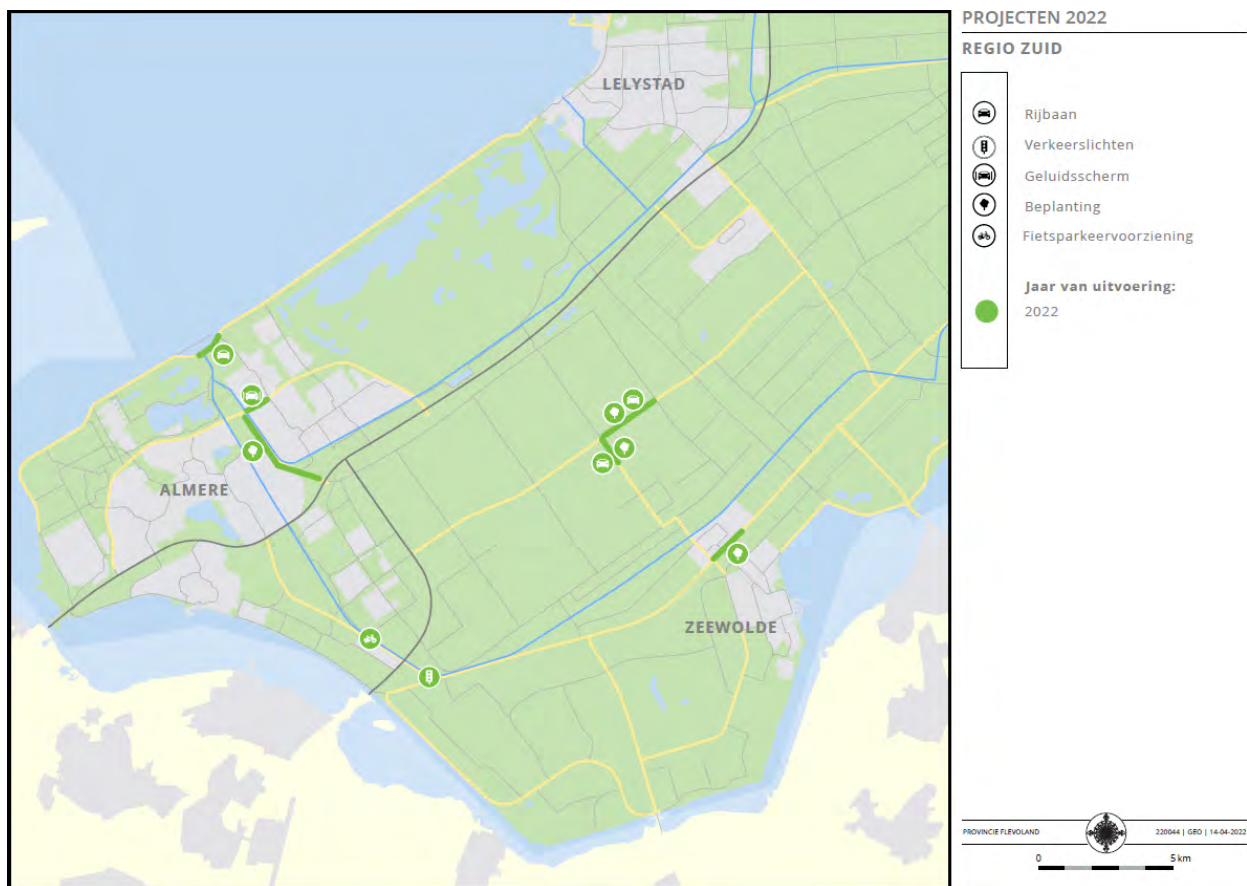

## Projecten 2022

Naam project	Korte omschrijving
Verkeerslichten Gooimeerdijk Oost	Vervangen voedingskabel.
Geluidsscherm Buitenring	Plaatsen geluidsscherm.
Bepanting Gooiseweg en Roerdompweg	Vervangen bomen Gooiseweg en kappen 50% bomen Roerdompweg.
Kleine korte termijn maatregelen Oostvaardersdijk Blocq van Kuffeler	Aanbrengen middengeleiders, voetpaden en bebording ter verbetering van de verkeersveiligheid.
Bepanting Tussenring tussen de vaarten fase 1	Vervangen populieren.
Verharding Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg	Onderhoud verharding rijbaan.
Verharding Roerdompweg (hm 16.2-hm 16.75)	Onderhoud verharding rijbaan.
Bepanting Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg	Verwijderen bomen.
Bepanting Roerdompweg	Verwijderen bomen (hm 16.2-hm 16.75).
Fietsparkeervoorziening 2 bushaltes Waterlandseweg	Aanbrengen fietsparkeervoorzieningen bij de fietsbrug Waterlandseweg.


## Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Verkeerslichten Gooimeerdijk Oost	2022	Ja
Geluidscherm Buitenring	2022	Ja
Beplanting Gooiseweg en Roerdompweg	2022	Deels, 2021 kap beplanting, eerste kwartaal 2022 nieuwe aanplant.
Kleine korte termijn maatregelen Oostvaardersdijk Blocq van Kuffeler	2022	Ja
Beplanting Tussenring tussen de vaarten fase 1	2023	Ja
Verharding Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg	2022	Ja
Verharding Roerdompweg (hm 16.2-hm 16.75)	2022	Ja
Beplanting Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg	2023	Ja
Beplanting Roerdompweg	2023	Ja
Fietsparkeervoorziening 2 bushaltes Waterlandseweg	2022/2023	Ja

## Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infrastructurele werkzaamheden rondom Almere.	Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

## Doorkijk 2023-2026

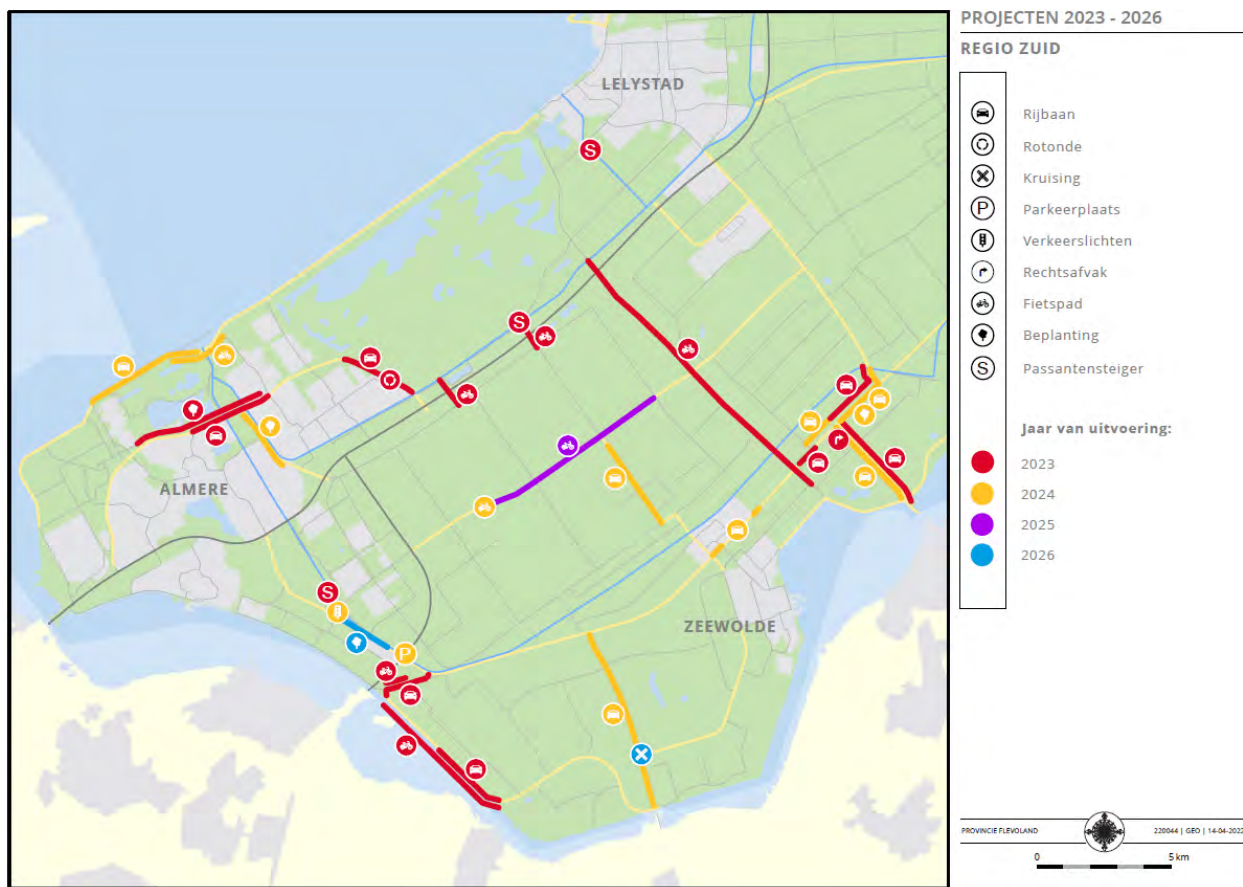

Om de overzichtskaarten overzichtelijk te houden zijn de volgende regio-overschrijdende projecten niet opgenomen op de kaart:

- - 2023 Verlichting: noord: 11 locaties, oost: 15 locaties, zuid: 17 locaties;
- - 2023 Leuningen op bruggen: noord: 4 locaties, oost: 7 locaties, zuid: 11 locaties;
- - 2023 Verkeerslichten: noord: 1 locatie, oost: 9 stuks, zuid: 29 stuks.

## Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT).

## Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met externen toegepast:

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, Nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;
- Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van infobulletins en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt middels spandoeken en bouwboarden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, de provinciale website, de website Flevowegen.nl en de sociale mediakanalen. Het doel van deze communicatie is het zo goed mogelijk informeren en zodoende de overlast zo veel mogelijk te beperken.

# Colofon

**Dit is een uitgave van:**

Afdeling Infrastructuur  
Provincie Flevoland  
Visarenddreef 1  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

**Contact:**

**T** 0320 265 265

**E** [info@flevoland.nl](mailto:info@flevoland.nl)

**W** [www.flevoland.nl](http://www.flevoland.nl)

Oktober 2022

eDocs 3009527
