



Onderwerp
2e voortgangsrapportage regioprojecten infrastructuur 2024

Kern mededeling:
Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regelmaat over de voortgang van de infrastructurele projecten.

Mededeling:
Bijgaande voortgangsrapportage geeft u de voortgang van de groot onderhoudsprojecten op de provinciale infrastructuur met peildatum oktober 2024.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
2 ^e voortgangsrapportage regioprojecten INFRA 2024	3311295	Ja

Registratienummer
3322912
Datum
15 oktober 2024
Expertiseteam
ETPI

Openbaarheid
Openbaar

Portefeuillehouder
Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



PROVINCIE FLEVOLAND

2^e Voortgangsrapportage regioprojecten

Oktober 2024



Inhoud

Samenvatting	3
Projecten regio Noord 2024	4
Doorkijk 2025-2028	6
Projecten regio Oost 2024	7
Doorkijk 2025-2028	9
Projecten regio Zuid 2024	10
Doorkijk 2025-2028	12
Projecten regio-overstijgend	13
Besluitvorming en rol Provinciale Staten	14
Externe communicatie	14
Colofon	15



Samenvatting

Dit is de voortgangsrapportage van de infrastructurele regioprojecten. Dit betreft reguliere projecten zoals niet-jaarlijks onderhoud aan wegen en fietspaden en aanpassingen zoals de aanleg van rotondes, het plaatsen van verkeerslichten, het kappen en herplanten van bomen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

In deze voortgangsrapportage is het jaarprogramma 2024 per regio inzichtelijk gemaakt. In de tabellen onder de kaart staat een omschrijving van de projecten en wordt de voortgang beschreven. Daarnaast worden de toprisico's nader toegelicht en wordt een doorkijk gegeven van de regioprojecten voor de periode 2025-2028.


Van de 26 projecten die geprogrammeerd staan in 2024 wordt in deze voortgangsrapportage de oplevering van twee projecten uitgesteld. Zes projecten zijn gestart in 2024, maar worden niet in dit jaar afgerond.

Zoals ook vermeld in de voorgaande voortgangsrapportage hebben we te maken met diverse ontwikkelingen die voor vertraging (kunnen) zorgen in de uitvoering van onze projecten. Deze ontwikkelingen betreffen:

- netbeheerders hebben weinig capaciteit waardoor het verleggen van kabels en leidingen langer duurt;
- het doorlopen van participatietrajecten en planologische procedures kost meer tijd en de vereisten voor het verkrijgen van vergunningen worden groter door de beperkte stikstofruimte en introductie van de Omgevingswet. Hierdoor is er meer tijd en capaciteit nodig om procedures te doorlopen;
- begin 2025 wordt naar verwachting de nieuwe wegencategorisering door GS vastgesteld. Deze hercategorisering kan een aanpassing betekenen van de weginrichting van een aantal provinciale wegen. Deze aanpassingen zullen pas in realisatie gaan na definitieve vaststelling door GS.

Projecten regio Noord 2024

Overzichtskaart 2024

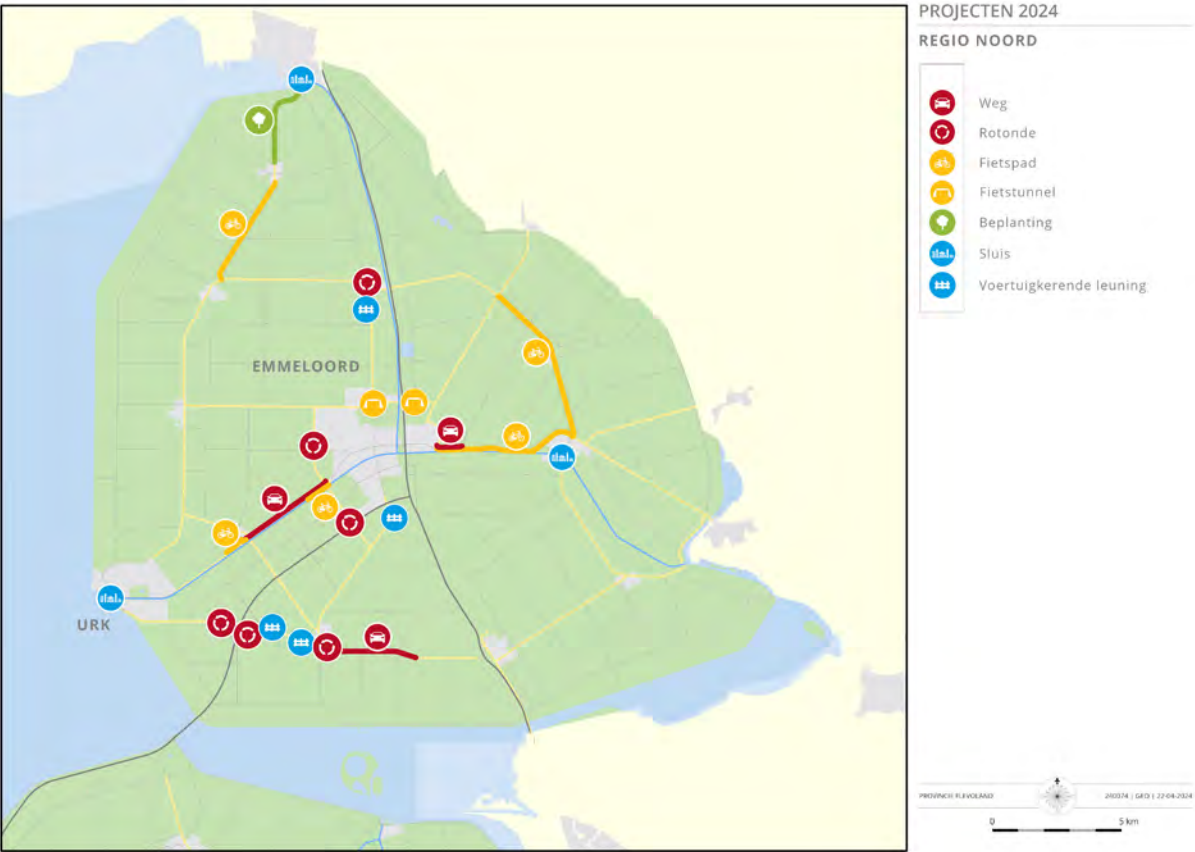

Projecten 2024

Naam project	Korte omschrijving
Rijbaan en fietspad Urkerweg	Vervangen asfalt en aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen; aanleg fietspad bij Tollebeek
Rotondes Hannie Schaftweg	Onderhouden asfaltverharding
Rijbaan Schokkerringweg	Vervangen asfalt en aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen
Fietspaden Marknesserweg en Wrakkenweg	Vervangen asfaltfietspad Marknesserweg door beton; Wrakkenweg betonfietspad vernieuwen
Bomen Gemaalweg	Kappen en aanplanten bomen
Fietspad Oosterringweg	Vervangen asfaltfietspad door beton
Voertuigkerende leuningen op vier bruggen	Aanbrengen van voertuigkerende leuningen op bruggen in de Nagelerweg, Banterweg en Domineesweg
Geluidswal Marknesse	Aanleggen 136 meter "Greenwall" langs de Marknesserweg


Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Rijbaan en fietspad Urkerweg	2024	Ja
Rotondes Hannie Schaftweg	2025	Nee, dit project stond gepland ná het onderhoud aan de Urkerweg. Dat werk heeft circa zes weken langer geduurd dan gepland waardoor het niet meer mogelijk was om deze werkzaamheden vóór de start van het oogstseizoen uit te voeren. Uitvoering is daarom doorgeschoven naar Q2 2025
Rijbaan Schokkeringweg	2026	Ja
Fietspad Marknesserweg en Wrakkenweg	2024	Ja
Bomen Gemaalweg	2024/2026	Deels, de bomen zijn gekapt in 2024 en worden in 2025 herplant
Fietspad Oosterringweg	2024	Ja
Voertuigkerende leuningen op vier bruggen	2025	Nee, onderzoeken hebben vervuiling in de bodem (waar een klein deel van de fundering van de leuningen moet komen) vastgesteld. Aanvullend onderzoek heeft tot gevolg dat dit project in Q2 2025 wordt gerealiseerd
Geluidswal Marknesse	2024	Ja

Toprisico's


Omschrijving	Beheersmaatregelen
Lange voorbereidingstijd van nutsbedrijven voor de verlegging van kabels en leidingen zorgt voor vertraging in projecten	- Nutsbedrijven in een zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven voor verlegging - Indien verleggingen worden voorzien, project eerder opstarten
Bepaalde bermbreedte zorgt bij wegverbreding voor complexiteit met kabels en leidingen en bomen	Andere technische oplossingen toepassen
Percelen van agrariërs zijn tijdens de oogstperiode niet of slecht bereikbaar vanwege werkzaamheden	- Werkzaamheden zo veel mogelijk uitvoeren in het voorjaar en de zomer - Vroegtijdige afstemming met agrariërs ten aanzien van uitvoeringsperiodes
Het niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning zorgt voor vertraging en/of scopeaanpassing	In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag

Doorkijk 2025-2028

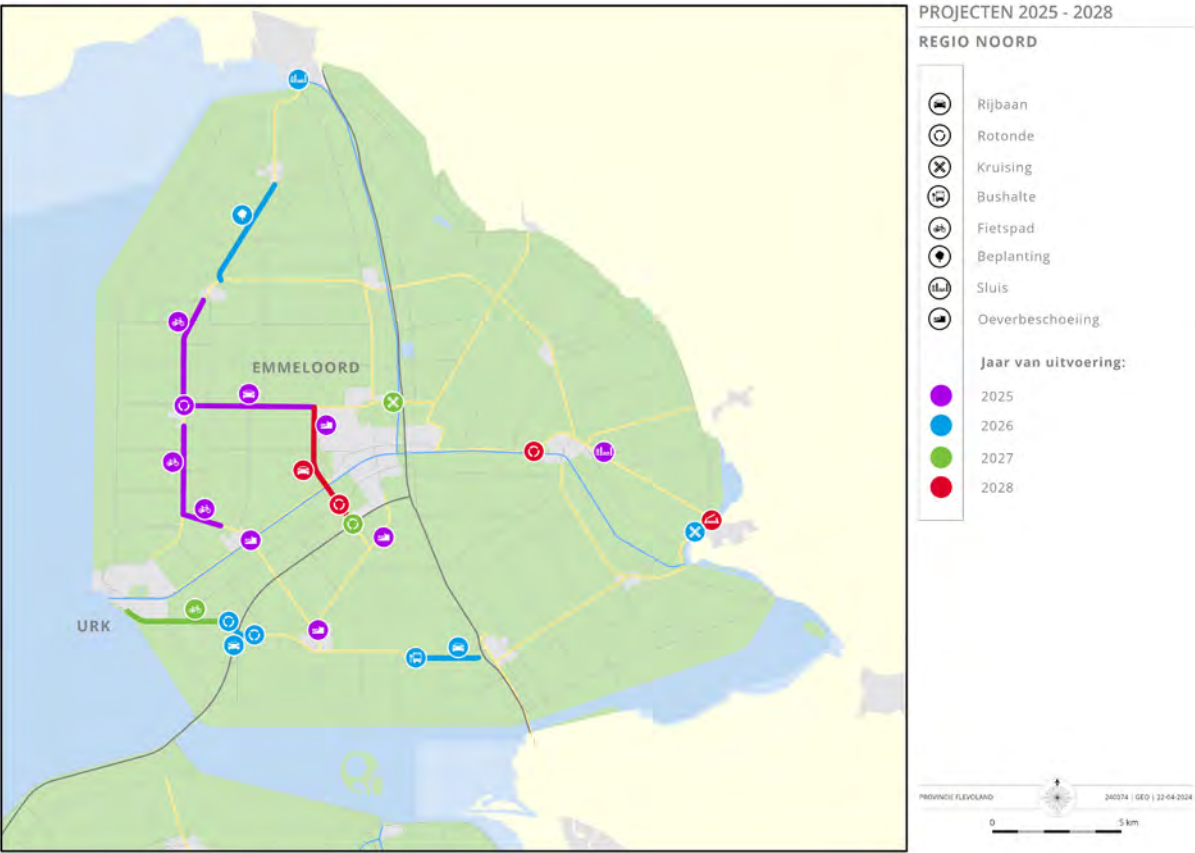

Projecten regio Oost 2024

Overzichtskaart 2024

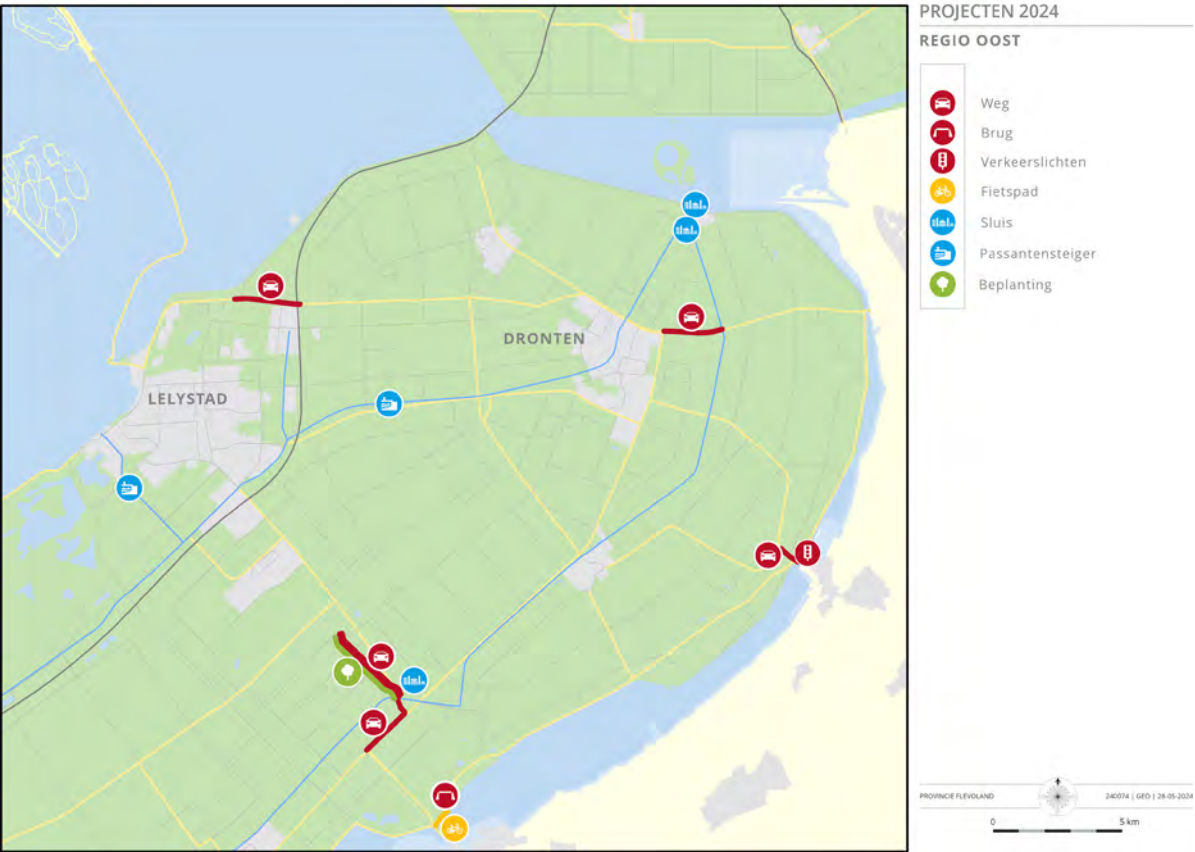

Projecten 2024

Naam project	Korte omschrijving
Rijbaan Hanzeweg	Vervangen asfalt en verplaatsen en aanpassen bushaltes
Rijbaan Houtribweg	Vervangen asfalt en aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen
Rijbaan Larserpad en rijbaan Futenweg	Vervangen asfalt en aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen; aanplant van bomen in het najaar
Rijbaan Elburgerweg en Elburgerbrug	Vervangen asfalt kruispunt en brug en herstel betondek brug.
Brugdek Harderdijk	Vervangen asfalt door beton op fietspad en brugdek
Aanleg vergevingsgezinde bermen	Ophogen bermen langs diverse fietspaden
Vervangen verkeersregelinstantaties	Vervangen verkeerslichten kruispunt Larserweg/Vogelweg en Elburgerweg/Spijkweg


Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Rijbaan Hanzeweg	2024	Ja
Rijbaan Houtribweg	2024	Ja
Rijbaan Larserpad en rijbaan Futenweg	2024	Ja
Rijbaan Elburgerweg en Elburgerbrug	2024	Ja
Brugdek Harderdijk	2024	Ja
Aanleg vergevingsgezinde bermen	2024/2025	Deels, gereed eind 2025
Vervangen verkeersregelinstanties	2024	Ja

Toprisico's


Omschrijving	Beheersmaatregelen
Lange voorbereidingstijd van nutsbedrijven voor de verlegging van kabels en leidingen zorgt voor vertraging in projecten	- Nutsbedrijven in een zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven voor verlegging - Indien verleggingen worden voorzien, project eerder opstarten
Wijzigingen in projectopdrachten (door bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) zijn niet tijdig bekend waardoor projecten vertraging oplopen	- In gesprek zijn en blijven met diverse partijen om tijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en besluiten - Voorbereidingen treffen voor voorgenomen wijzigingen zonder dat deze definitief zijn
Het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen zorgt voor vertraging en/of scopeaanpassing	In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag zodat noodzakelijke aanpassingen tijdig gedaan worden

Doorkijk 2025-2028

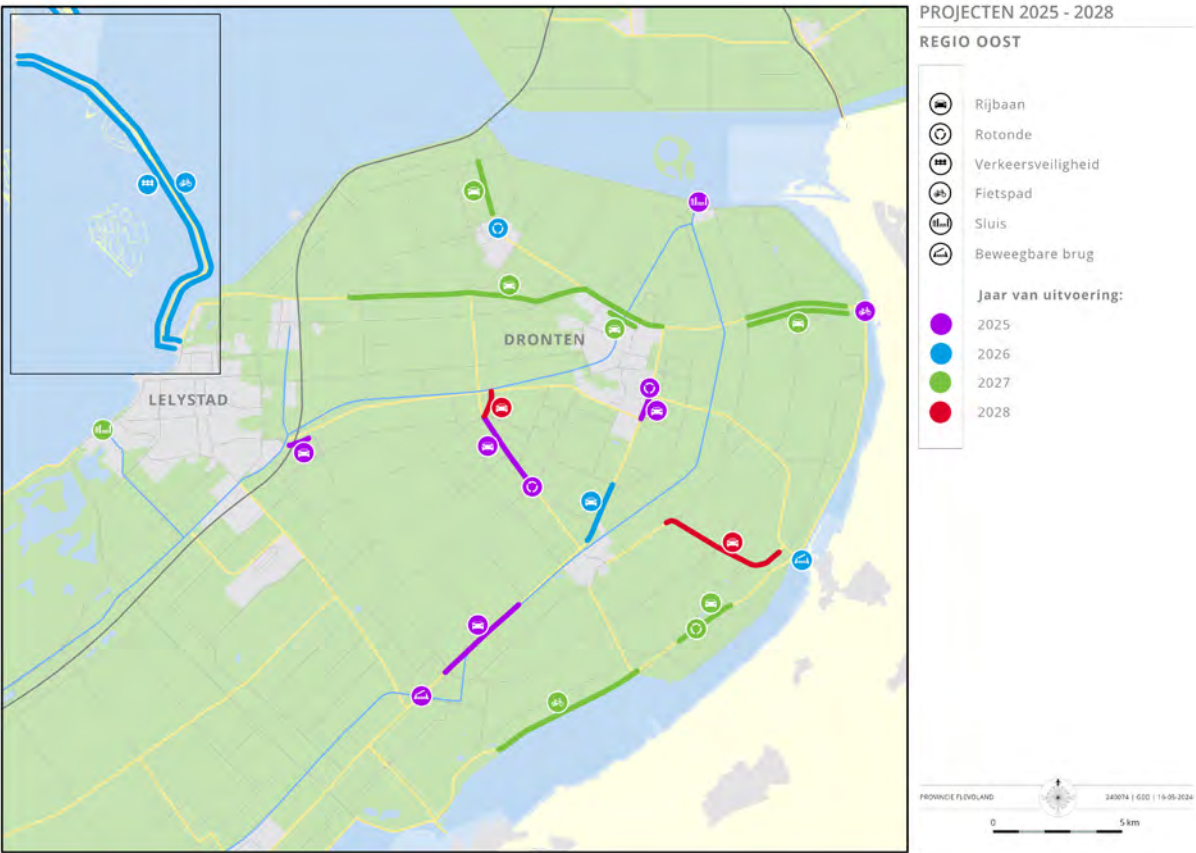

Projecten regio Zuid 2024

Overzichtskaart 2024

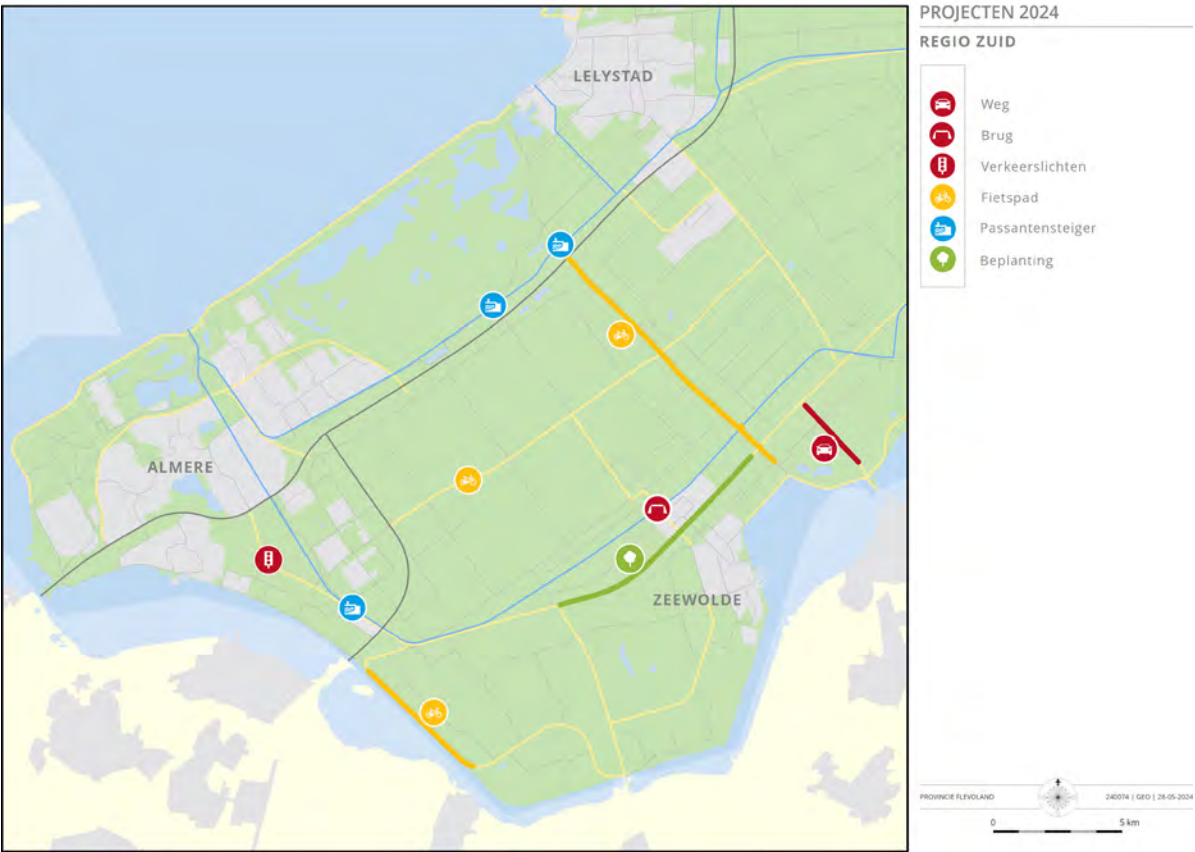

Projecten 2024

Naam project	Korte omschrijving
Verkeersregelininstallatie Waterlandseweg	Vervangen verkeersregelininstallatie kruispunt Waterlandseweg/Meentweg
Aanleg van drie passantensteigers	Realisatie van steigers in de Lage Dwarsvaart, Lage Vaart en de Hoge Vaart
Rijbaan Ganzenweg	Vervangen asfalt, aanbrengen verkeersveiligheidsmaatregelen en verlenging van het linksafvak
Vervangen van drie passantensteigers	Vervangen van bestaande steigers in de Lage Vaart en Hoge Vaart
Kruispunt Vogelweg/Grote Trap	Verbeteren verkeersveiligheid van de bestaande fietsoversteek
Bomen Gooiseweg	Kappen van bomen; herplanten volgt in 2025/2026
Fietspad Ooievaarsplas	Vervangen verharding fietspad


Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Verkeersregelininstallatie Waterlandseweg	2024	Ja
Aanleg van drie passantensteigers	2024	Ja
Rijbaan Ganzenweg	2024	Ja
Vervangen van drie passantensteigers	2024/2025	Deels, het project wordt grotendeels gerealiseerd in 2024 en is gereed in Q1 2025
Kruispunt Vogelweg/Grote Trap	2024	Ja
Bomen Gooiseweg	2024-2026	Deels, de bomen zijn gekapt in 2024 en worden in 2025/2026 herplant
Fietspad Ooievaarsplas	2024/2025	Deels, werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2024; afronding vindt plaats in Q1 2025

Toprisico's

Omschrijving	Beheersmaatregelen
Lange voorbereidingstijd van nutsbedrijven voor de verlegging van kabels en leidingen zorgt voor vertraging in projecten	- Nutsbedrijven in een zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven voor verlegging - Indien verleggingen worden voorzien, project eerder opstarten
Omgeving ervaart overlast doordat werkzaamheden kort na elkaar op dezelfde locatie worden uitgevoerd	Hinder beperken door met verschillende werkzaamheden te combineren
Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor langere doorlooptijd en lagere kwaliteit bij adviesbureaus	- Uitvragen nog duidelijker opstellen - Planvoorbereiding tijdig starten zodat adviesbureaus voldoende voorbereidingstijd hebben
Het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen zorgt voor vertraging en/of scopeaanpassing	In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag zodat noodzakelijke aanpassingen tijdig gedaan worden

Doorkijk 2025-2028

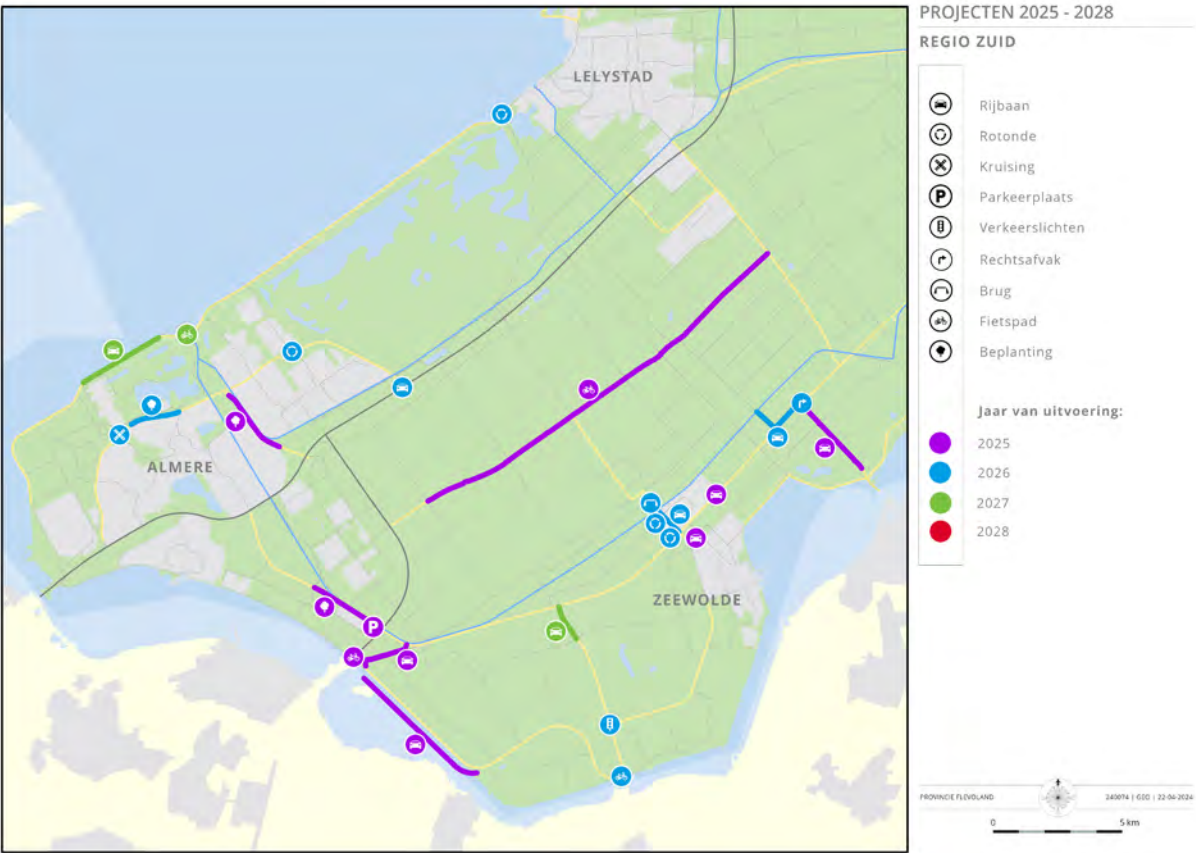

Projecten regio-overstijgend

Projecten

Naam project	Korte omschrijving
Conserveren van leuningen en herstellen van betonschades op bruggen	Onderhouden en herstellen van leuningen en betonschades op bruggen en viaducten
Groot onderhoud natuurvriendelijke oevers	Uitbaggeren en revitaliseren van oevers
Verkeersregelinstallaties voorzien van noodstroomvoorziening	Het aanbrengen van noodstroomvoorzieningen bij verkeerslichten
Vervangen LED-armaturen	Het aanpassen van verlichting naar duurzaam LED

Waar staan we

Naam project	Jaar gereed	Conform planning
Conserveren van leuningen op bruggen	2024/2025	Ja
Groot onderhoud natuurvriendelijke oevers	2024-2028	Ja
Verkeersregelinstallaties voorzien van noodstroomvoorziening	2024	Ja
Vervangen LED-armaturen	2024/2025	Ja

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met externen toegepast:

- Met stakeholders en samenwerkingspartners zoals gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;
- Op jaarlijkse basis wordt gesproken met verschillende partijen zoals het 10-dorpen overleg, de concessiehouder openbaar vervoer en diverse belangenorganisaties;
- Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van infobulletins en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt middels spandoeken en bouwboarden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, de provinciale website en de sociale mediakanalen. Het doel van deze communicatie is het zo goed mogelijk informeren en zodoende de hinder zo veel mogelijk te beperken.





Colofon

Dit is een uitgave van:
Expertiseteam Projectbureau Infra
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T 0320 – 265 265
E info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl

Oktober 2024
eDocs 3311295
