

*Onderwerp*

Voortgangsrapportage Regioprojecten Infrastructuur november 2017

Kern mededeling:

Hierbij treft u de voortgangsrapportage aan van de Regioprojecten Infrastructuur november 2017. Bij de Zomernota is de stand van zaken van mei 2017 meegezonden. Deze opvolgende rapportage geeft de stand van zaken weer van november 2017.

Mededeling:

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de realisatie van alle projecten in 2017 goed op koers ligt.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
voortgangsrapportage Regioprojecten Infrastructuur november 2017	2152883	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

2157728

Datum

17 november 2017

Auteur

ing. M. Martejn

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en burgerleden



VOORTGANGSRAPPORTAGE

NOVEMBER 2017

Regioprojecten Infrastructuur



INHOUD

Samenvatting	3
Projecten Regio Noord	4
Overzichtskaart 2017	4
Projecten 2017	4
Waar staan we	5
Toprisico	5
Projecten Regio Oost	7
Overzichtskaart 2017	7
Projecten 2017	7
Waar staan we	8
Toprisico	8
Projecten Regio Zuid	10
Overzichtskaart 2017	10
Waar staan we	11
Toprisico	11
Besluitvorming en rol Provinciale Staten	12
Externe Communicatie	12

SAMENVATTING

In deze voortgangsrapportage staat de stand van zaken weergegeven van de projecten die in 2017 in de drie Flevolandse regio's worden uitgevoerd en opgeleverd. Het jaarprogramma 2017 is per regio door middel van een kaart inzichtelijk gemaakt. Bij een aantal projecten vinden afwijkingen plaats, inherent aan het dynamische proces van infrastructuurontwikkeling. Deze afwijkingen in tijd en scope zijn nader toegelicht.


De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen (MBVI 2017). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastructuur op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de infrastructurele projecten (niet-jaarlijks onderhoud), die we elk jaar in de regio opleveren.

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan de doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van de provinciale vaarwegen. Door gebruik te maken van programmamanagement, goed risicomanagement, adequaat contractmanagement en te anticiperen op de marktsituatie is het mogelijk om de gewenste resultaten binnen het projectbudget te realiseren.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de realisatie van alle projecten in 2017 goed op koers ligt. Voor de jaren 2018 t/m 2021 (MBVI 2018) kan worden opgemerkt dat er wederom een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden over de jaren heen ligt. Wel is het zo dat in de regio Noord een duidelijke groei in de werkzaamheden zichtbaar is, die tot meer overlast kan leiden.

PROJECTEN REGIO NOORD

Overzichtskaart 2017

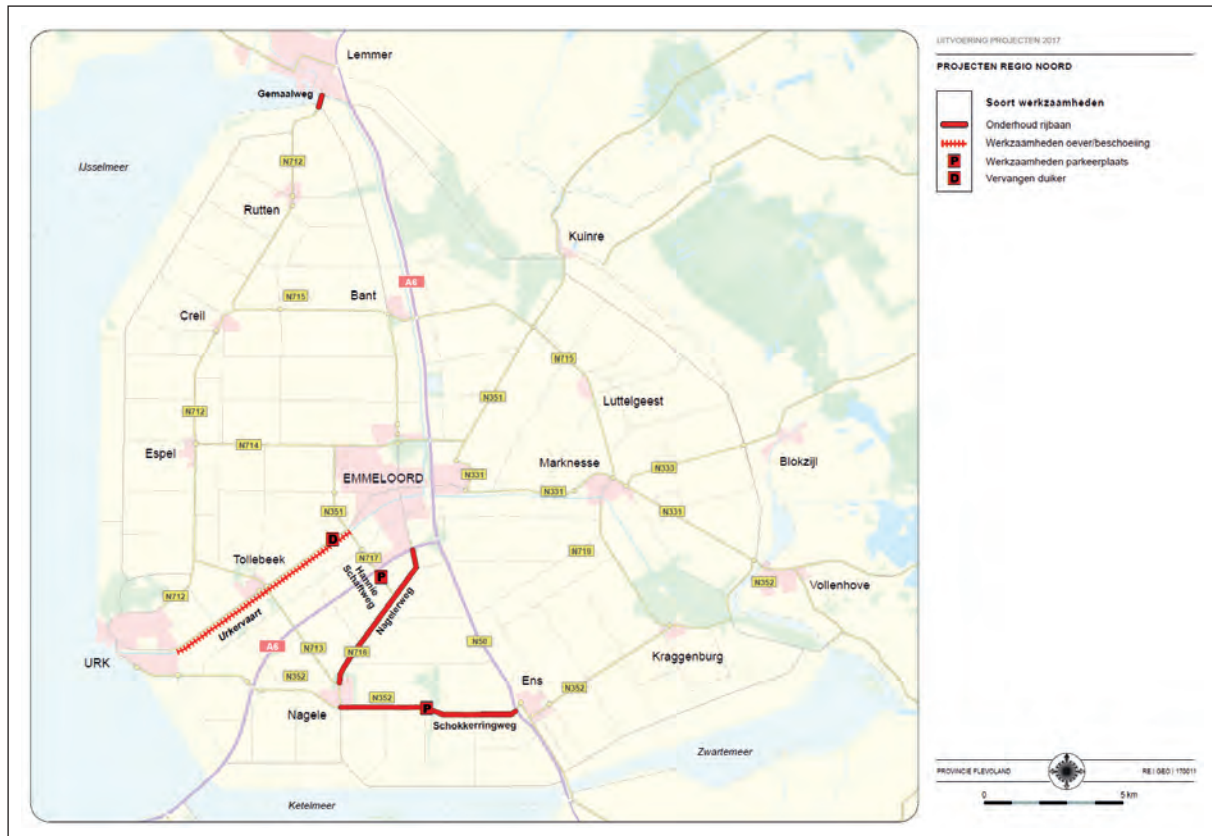

Projecten 2017

Naam Project	Korte omschrijving
16104 Nagelerweg	Reconstructie Nagelerweg vanaf kruising Zuidwesterringweg tot bebouwde kom Emmeloord en onderhoud kunstwerken Nagelervaart en Zuidertocht.
17112 Schokkerringweg	Reconstructie parallelweg Schokkerringweg, vanaf rotonde Nagele tot de rotonde oprit N50. De parallelweg van asfalt wordt vervangen voor een betonnen fietspad. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, Het Flevo-landschap en Museum Schokland een parkeer-voorziening aangelegd ter hoogte van het Schokkerbos.
20106 Gemaalweg	Reconstructie rijbaan tussen de Lemsterweg en de Friese sluis en conserveren brugdek gemaal Buma.
18106 Duiker Urkerweg	Vervangen duiker Pilotentocht onder de Urkerweg.
17126 Urkervaart	Aanleg natuurvriendelijke oevers Urkervaart tussen Urk en Emmeloord. Houten beschoeiing wordt vervangen door kraagstukken met stortsteen.
18128 Carpoolplaats Hannie Schaftweg	De huidige carpoolplaats wordt opnieuw ingericht en de capaciteit wordt vergroot.

Waar staan we

Naam project	Geplande periode uitvoering	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
16104 Nagelerweg	maart - mei	ja	nee (zie toelichting)
17112 Schokkerringweg	juni - augustus	ja	ja
20106 Gemaalweg	september - oktober	ja	ja
18106 Duiker Urkerweg	juni - juli	ja	nee (eerder, zie toelichting)
17126 Urkervaart	september - december	december 2017	ja
18128 Carpoolplaats Hannie Schaftweg	november	november 2017	nee (eerder, zie toelichting)

Toelichting

16104 Nagelerweg: Fase 1 en 2 in het dorp Nagele zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2016. Bij fase 3 t/m 6 is een fundering in zeer slechte staat aangetroffen. I.v.m. afspraken met de omgeving (aanwonenden, Tennet, RWS, gemeente e.d.) was een uitvoering in 2016 niet meer haalbaar. De werkzaamheden in fase 3 t/m 6 zijn doorgeschoven naar het voorjaar van 2017 en inmiddels uitgevoerd.

18106 Duiker Urkerweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio is het project qua uitvoering een jaar naar voren gehaald.

18128 Carpoolplaats Hannie Schaftweg: In verband met de vele projecten in 2018 en 2019 in de regio en de eenvoud van de maatregel is het project qua uitvoering een jaar naar voren gehaald.

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Slechte fundering weg vanuit het verleden	Tijdig aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals boringen en bodemscans. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de huidige situatie en kunnen hier rekening mee houden in tijd en budget.

Waar staan we

Naam project	Geplande periode uitvoering	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
12116 Dronterringweg	juli - augustus	ja	ja
17130 Spijkweg	maart	ja	ja
15132 Lage Dwarsvaart	januari -juli	ja	ja
15201 Vervangen wilgen Biddingringweg	januari - februari	ja	ja
17341 Versnelde toepassing LED	september - december	december 2017	ja
19105 Houtribweg	september - oktober	april 2018	nee
18108 Gooiseweg - Biddingringweg incl. de "Bult"	augustus - september	november 2017	ja


Toelichting

19105 Aanpassingen bij rotonde vanwege de langer benodigde doorlooptijd van het vergunningetraject in afstemming met het waterschap ZZL verschoven van het programma 2017 naar april 2018

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering werkzaamheden in relatie tot bezoek recreatieparken en evenementen in regio Oostelijk Flevoland.	In nauw overleg met stakeholders wegafsluitingen plannen voor de opening van het recreatieseizoen en/of plannen tussen de grote evenementen door.

PROJECTEN REGIO ZUID

Overzichtskaart 2017

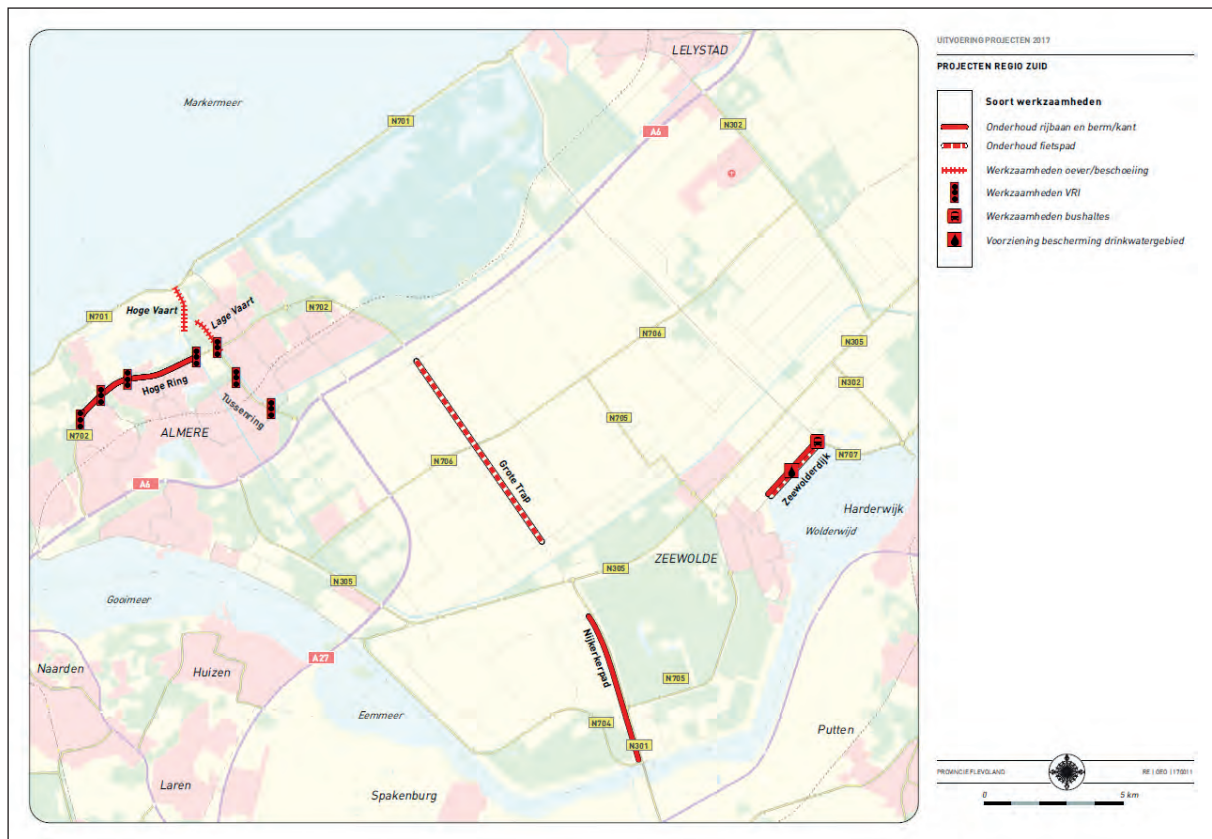

Projecten 2017

Naam Project	Korte omschrijving
15112 Hogering	Vervanging verharding Hogering tussen de Herman Gorterweg en het spoorviaduct, tussen de Contrabasweg en de Karperweg en onderhoud aan een zevental kunstwerken op het traject.
16109 Zeewolderdijk	Reconstructie rijbaan en fietspad Zeewolderdijk tussen de Knardijk en de komgrens Zeewolde. Het fietspad wordt voorzien van beton met een lage CO2-emissie.
18118 Nijkerkerpad	Reconstructie Nijkerkerpad tussen de Winkelweg en de Slingerweg.
17127 Hoge en Lage Vaart	Vervanging oeverbeschoeiing langs de Hoge en Lage Vaart tussen hm. 0 en 2.0. De bestaande damwand wordt ingekort en voorzien van een betonblokkenmat.
15303 VRI's Hogering	Vervanging van verkeersreginstallaties en verkeersslussen op de Hogering.
15137 inhaalslag NVO's	Het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers langs de Hoge en Lage vaart.
16019 Grote Trap	Het aanleggen van een recreatief fietspad tussen de Gooiseweg en A6 en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Duikertocht, Dodaarstocht en Wulptocht.

Waar staan we

Naam project	Geplande periode uitvoering	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
15112 Hogering	juni - september	ja	ja
16109 Zeewolderdijk	juli- augustus	ja	Ja
18118 Nijkerkerpad	juni- juli	ja	Ja
17127 Hoge en Lage Vaart	september- december	december 2017	ja
15303 VRI's Hogering	juni - september	september 2017	nee (zie toelichting)
15137 inhaalslag NVO's	oktober-december	december 2017	ja
16019 Grote Trap	september 2017-maart 2019	maart 2019	ja
Toelichting			
15303 VRI's vanwege de levertijd van 2 VRI's kan de installatie op de Tussenring pas worden uitgevoerd in 2018.			

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infrastructurele werkzaamheden rondom Almere	Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

- Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.

In het coalitieakkoord is afgesproken een sober en doelmatig beleid na te streven. Dit vraagt vooral bij de uitvoering van de infrastructurele projecten een sterke sturing om de afgesproken ambities te realiseren.

Externe Communicatie

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg;
- Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins, aankondiging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken;
- Social media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, calamiteiten e.d.

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten. Transparantie en mondigheid van stakeholders leiden evenwel tot een toename in communicatie en een langere voorbereidingstijd. Dit vergt goede voorbereiding, vooral gericht op de kwaliteit van de te doorlopen procedures.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 265 265

E-mail: info@flevoland.nl

www.flevoland.nl

November 2017

eDocs 20799170
