

**Onderwerp**

Mededeling PS bij voortgangsrapportage project 'N305 Gooiseweg fase 3'
(peildatum december 2018)

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.

Mededeling:

Hierbij treft u de voortgangsrapportage peildatum december 2018 aan van het project 'N305 Gooiseweg fase 3'. In deze rapportage leest u hoe het project ervoor staat.

Registratienummer

2332895

Datum

12 december 2018

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
2018-12 Bestuurlijke Voortgangsrapportage project N305 Gooiseweg fase 3	2330580	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)



VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2018


N305 Gooiseweg Fase 3



HET PROJECT N305 GOOISEWEG FASE 3

Het project ligt tussen de A27 en de Nijkerkerweg. Deze weg is zowel voor Almere, Zeewolde als Lelystad Airport een belangrijke verbindingsweg. Tevens is de weg een alternatieve route voor verkeer bij incidenten op de A28, A6 en A27.

Overzichtsk kaart

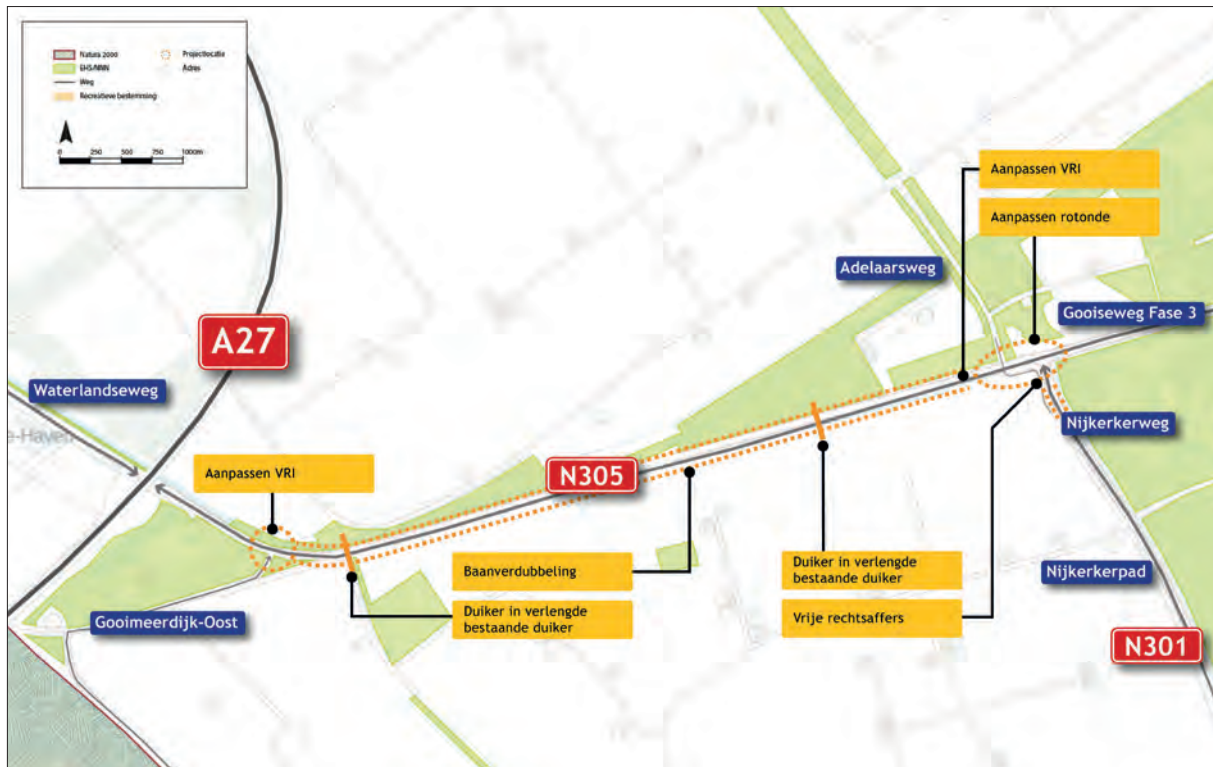

Maatregelen Gooiseweg fase 3

Aanleiding

In haar huidige vorm loopt de N305 Gooiseweg, traject Nijkerkerweg - Gooimeerdijk-Oost, in de periode 2020-2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Door de weg te verdubbelen verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en wordt het carré van 2x2 autowegen en autosnelwegen rondom Lelystad Airport gesloten.


Projectkenmerken

Het project omvat het:

- Verdubbelen van de huidige weg van 1 x 2 rijstroken naar 2 x 2 rijstroken met een tussenberm over een traject van ca. 6 km. De nieuwe rijbaan wordt ten Noorden van de huidige rijbaan gerealiseerd;
- Aanpassen van de kruispunten van de N305 met de Nijkerkerweg, de Adelaarsweg/Nijkerkerpad en de Gooimeerdijk-Oost;
- Nieuwe duikers in het verlengde van de bestaande duikers in de Priemtocht en de Rassenbeektocht;
- Inpassingmaatregelen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de weg in de directe omgeving, op het traject Gooimeerdijk-Oost tot en met de Nijkerkerweg.

Waar staan we

Het voorontwerp en alle onderzoeken zijn opgeleverd en het ontwerpbestemmingplan lag tot 5 december 2018 ter inzage. Om de voortgang te borgen is het bestek van de duikers en voorbelasting naar voren gehaald zodat het zettingsproces van de grond kan starten.



Parallel worden de werkzaamheden voor ontwerp en bestek voor zowel de wegverharding als het groen uitgevoerd. Planning is dat deze werkzaamheden in het 2e kwartaal 2019 worden afgerond.

Financiën

Budget	Raming
€ 12.203.000,-	€ 11.110.000,- (VO Raming)

Toprisico's

Toprisico's	Beheermaatregelen
Er wordt bezwaar aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Zeewolde 2016.	a) Actief informeren en betrekken omwonenden.
De Gooiseweg fase 3 bevindt zich in het voormalige stroomgebied van de Oereem. Omdat de grondopbouw in het stroomgebied een andere samenstelling heeft dan de omliggende bodem, kan dit leiden tot zettingsverschillen en oneffenheden in het wegdek.	a) Geotechnisch onderzoek b) Het grondwerk wordt vooruitlopend op de wegverharding en het groen op de markt gebracht, zodat er meer tijd is om de grond te laten zetten.
Er is een nieuwe bewoner woonachtig in het pand waarvoor een ontheffing hogere grenswaarde is aangevraagd. Hij kan bezwaar aantekenen tegen deze aanvraag voor een hogere geluidsbelasting op zijn gevel.	a) Nieuwe bewoner is geïnformeerd over het project, impact op de woning en het vervolgtraject.
Er worden tijdens de uitvoering onvoorzien bodemvondsten aangetroffen (bijv. archeologie of niet gesprongen explosieven).	a) Onderzoeken of sprake is van een verdacht gebied. b) Wettelijke protocollen voor aanpak bij bodemvondsten.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Externe Communicatie

De belanghebbenden en de omwonenden worden frequent geïnformeerd over het project. Hierbij worden de planning en procedures besproken.

De projectsite ten behoeve van de publiekscommunicatie staat op www.flevoland.nl.

COLOFON

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon: 0320 – 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

December 2018
eDocs 2330580
