

*Onderwerp*

Mededeling PS bij voorgangsrapportage Regioprojecten Infrastructuur (peildatum november 2018)

*Registratienummer*  
2349617

*Datum*

12 december 2018

*Afdeling/Bureau*  
INFRA

*Kern mededeling:*

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de regioprojecten aan Provinciale Staten.

*Openbaarheid*

**Openbaar**

*Mededeling:*

Hierbij treft u de voortgangsrapportage peildatum november 2018 aan van de regioprojecten infrastructuur. In deze rapportage leest u de status van de verschillende projecten per regio.

*Portefeuillehouder*

**Reus, J. de**

*Bijlagen*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Bestuurlijke voortgangsrapportage regioprojecten	2324662	Ja

**Ter kennisname aan PS en burgerleden**

*Ter inzage in de leeskamer*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot



## VOORTGANGSRAPPORTAGE

NOVEMBER 2018

### Regioprojecten Infrastructuur Flevoland





## INHOUD

<b>Samenvatting</b>	<b>5</b>
<b>Projecten Regio Noord</b>	<b>6</b>
Overzichtskaart 2018	6
Projecten 2018	7
Waar staan we	8
Toprisico	8
Doorkijk 2019 - 2023	9
Projecten 2019 - 2023	10
<b>Projecten Regio Oost</b>	<b>11</b>
Overzichtskaart 2018	11
Projecten 2018	12
Waar staan we	12
Toprisico	12
Doorkijk 2019 - 2023	13
Projecten 2019 - 2023	14
<b>Projecten Regio Zuid</b>	<b>15</b>
Overzichtskaart 2018	15
Projecten 2018	16
Waar staan we	17
Toprisico	17
Doorkijk 2019 - 2023	18
Projecten 2019 - 2023	19
<b>Besluitvorming en rol Provinciale Staten</b>	<b>20</b>
<b>Externe Communicatie</b>	<b>20</b>



## SAMENVATTING


Deze tweede voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de projecten voor reguliere onderhoud van wegen en vaarwegen. Het jaarprogramma dat in 2018 in de drie Flevolandse regio's uitgevoerd wordt, is per regio door een kaart inzichtelijk gemaakt. In de tabellen staat de voortgang beschreven van de projecten, die conform de opgestelde projectplannen verloopt. De projecten die afwijken in planning en de toprisico's zijn nader toegelicht. In geen van de gevallen leidt uitstel tot problemen op het vlak van verkeersveiligheid of doorstroming.

De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen (MBVI 2018). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastructuur op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de infrastructurele projecten (niet-jaarlijks onderhoud) die we in de regio opleveren.

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan de doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van de provinciale vaarwegen.

# PROJECTEN REGIO NOORD

## Overzichtskaart 2018

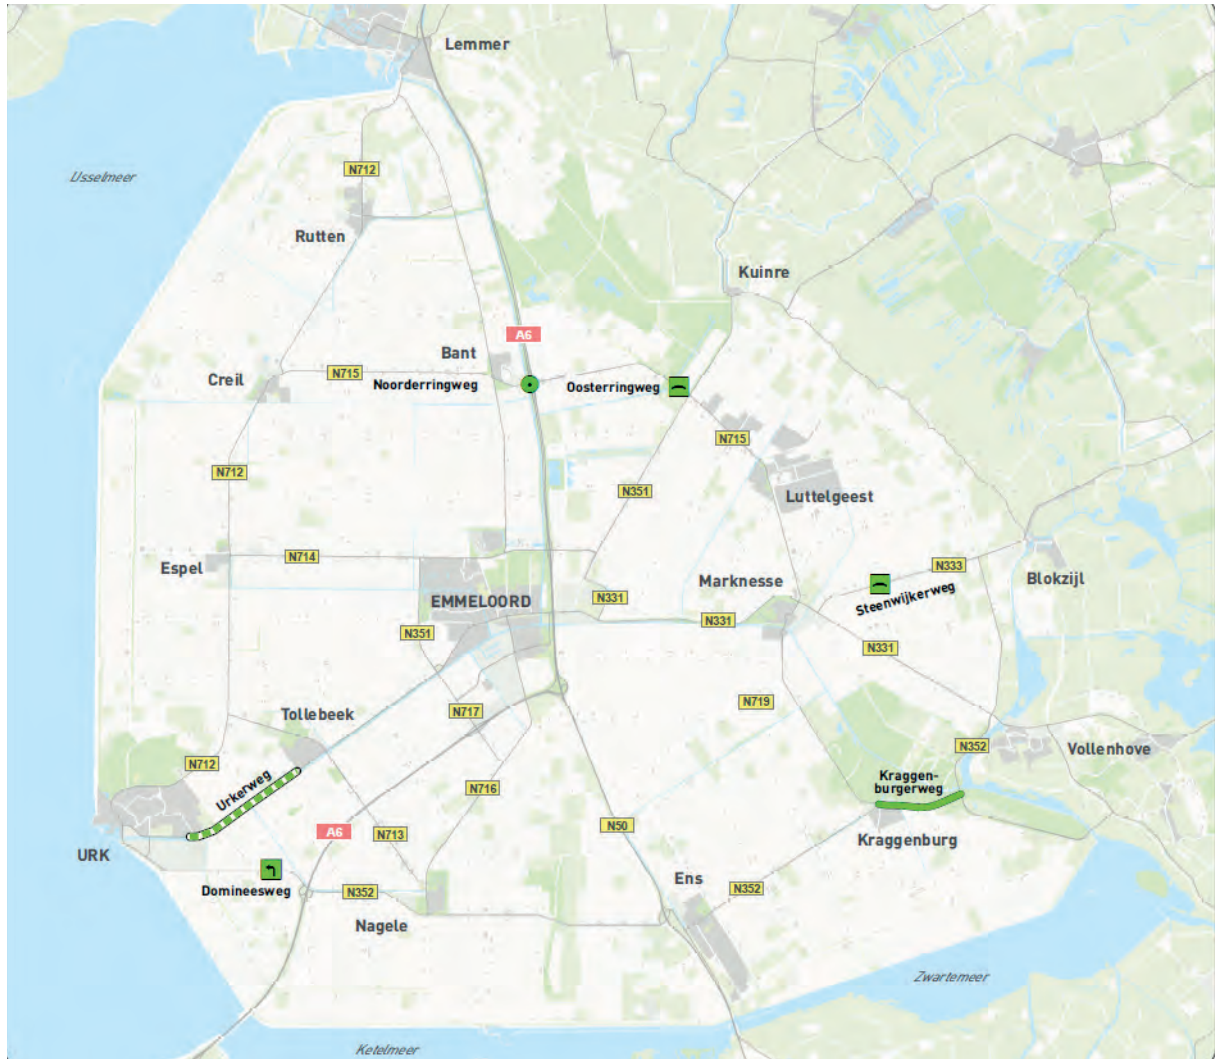

**PROJECTEN REGIO NOORD**

- | Soort werkzaamheden |                       |
|---------------------|-----------------------|
|                     | Onderhoud rijbaan     |
|                     | Onderhoud fietspad    |
|                     | Werkzaamheden rotonde |
|                     | Werkzaamheden plateau |
|                     | Aanleg linksafvak     |



## Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne	Realiseren nieuw linksafvak ter hoogte van Windinformatiecentrum 11 beaufort.
Aansluiting afrit A6 - Oosterringweg	De aanleg van een rotonde bij de op- en afrit van de A6 bij Bant, inclusief het onderhoud aan het brugdek.
Fietspad Urkerweg	Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf bebouwde kom Urk tot Tollebeek.
Rijbaan Kraggenburgerweg	Reconstructie Kraggenburgerweg vanaf rotonde Kraggenburgerweg tot Voorstersluis.
Rijbaan Repelweg	Reconstructie Repelweg vanaf Voorstersluis tot rotonde Vollenhoverweg.
Rijbaan Zuidwesterringweg	Reconstructie Zuidwesterringweg vanaf Staartweg tot A6.
Fietspad Domineesweg	Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf bebouwde kom Urk tot A6.
Rijbaan Noorderringweg	Reconstructie van de Noorderringweg tussen de Graaf Florislaan (bebouwde kom Creil) tot en met de rotonde bij Bant



## Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne	2018	ja
Aansluiting afrit A6 - Oosterringweg	2018	ja
Fietspad Urkerweg	2018	ja
Rijbaan Kraggenburgerweg	2018	ja
Rijbaan Repelweg	2019	nee (zie toelichting)
Rijbaan Zuidwesterringweg	2019	nee (zie toelichting)
Fietspad Domineesweg	2019	nee (zie toelichting)
Rijbaan Noorderringweg	2019	nee (zie toelichting)

### Zuidwesterringweg en Repelweg

Gebleken is dat er nadere afweging nodig is, omdat de bomen langs de weg de gewenste wegverbreding belemmeren volgens de reguliere ontwerpprincipes. Hierdoor moet naar een alternatieve verbredingswijze worden gezocht.

### Fietspad Domineesweg

Doordat er een juridische procedure loopt inzake beheerstroken met bewoners aan de Domineesweg die de voortuin hebben doorgetrokken tot aan het fietspad is de aanleg van het betonnen fietspad uitgesteld tot na afronding van de procedure.

### Noorderringweg

Traditionele wegverbreding bij de Noorderringweg is moeilijk inpasbaar in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen in de aangrenzende wegbermen. In het najaar van 2017 is een proef met een nieuwe funderingstechniek uitgevoerd. De uitkomst van deze proef heeft geleid tot verdergaand onderzoek in de zomer van 2018. In Q4 2018 is het resultaat van dit onderzoek bekend. Dan wordt besloten of de verbreding in 2019 kan worden uitgevoerd en op welke wijze.

## Toprisico

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Er is onvoldoende informatie over de kwaliteit van de bestaande funderingen.	Verdergaande onderzoeken uitvoeren zodat een goed beeld ontstaat van de gehele fundering.

Doorkijk 2019 - 2023



PROJECTEN REGIO NOORD

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werkzaamheden rotonde
	Werkzaamheden verkeersregelinstanties
	Werkzaamheden bushaltes
	Geluidscherm
	Werkzaamheden bij (fiets)brug
	Werkzaamheden bij sluis
	Aanleg faunavoorzieningen
	Vervanging beplanting
	Werkzaamheden oever / beschoeiing
	Vervanging remmingswerk
	Aanleg trailerhelling

Jaar van uitvoering	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023




## Projecten 2019 - 2023

Naam project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
Rijbaan Repelweg	planuitwerkingsfase	2019
Rijbaan Zuidwesterringweg	planuitwerkingsfase	2019
Rijbaan Noorderringweg	planuitwerkingsfase	2019
Rotonde Muntweg/Kuinderweg	planuitwerkingsfase	2019
Fietspad Muntweg	planuitwerkingsfase	2019
Bomen Gemaalweg	planuitwerkingsfase	2019
Urkervaart (repareren betonnen oeverbeschoeiingen)	planuitwerkingsfase	2019
Natuurvriendelijke oevers Zwolsevaart (Emmeloord - Marknesse)	planuitwerkingsfase	2019/2020
Fietspad Domineesweg	definitiefase	2020
Lemstervaart (vervangen remmingswerk bij Oosterringweg)	definitiefase	2020
Leemringweg	definitiefase	2020
Rijbaan Espelerringweg	planuitwerkingsfase	2020
Fietspad Nagelerweg, Zuiderringweg, Kamperweg en Gemaalweg	initiatieffase	2020
Vervangen fietsbrug Marknesserweg	initiatieffase	2021
Rijbaan Oosterringweg	verkenningsfase	2021
Fietspad Oosterringweg	verkenningsfase	2021
Rotonde Oosterringweg	verkenningsfase	2021
Brug Hannie Schaftweg	initiatieffase	2021
Marknesse geluidscherm	verkenningsfase	2021
Rotonde Kuinderweg/Kuinderweg en rotonde Kuinderweg/Marknesserweg	initiatieffase	2021
Rotonde Ecopark/Marknesserweg en rotonde Kuinderweg/de Munt	initiatieffase	2021
Bomen Kuinderweg	initiatieffase	2022
Rijbaan Zuiderringweg	initiatieffase	2022
Rijbaan Urkerweg	initiatieffase	2022
Vervanging bomen Wrakkenweg	initiatieffase	2022
Vervanging bomen Gemaalweg	initiatieffase	2022
Lemstervaart oeverbeschoeiing	initiatieffase	2022
Rijbaan Kuinderweg	initiatieffase	2023
Rijbaan Baan	initiatieffase	2023
Rijbaan Hannie Schaftweg	initiatieffase	2023
Urkervaart Oeverbeschoeiing	initiatieffase	2023

# PROJECTEN REGIO OOST

## Overzichtskaart 2018

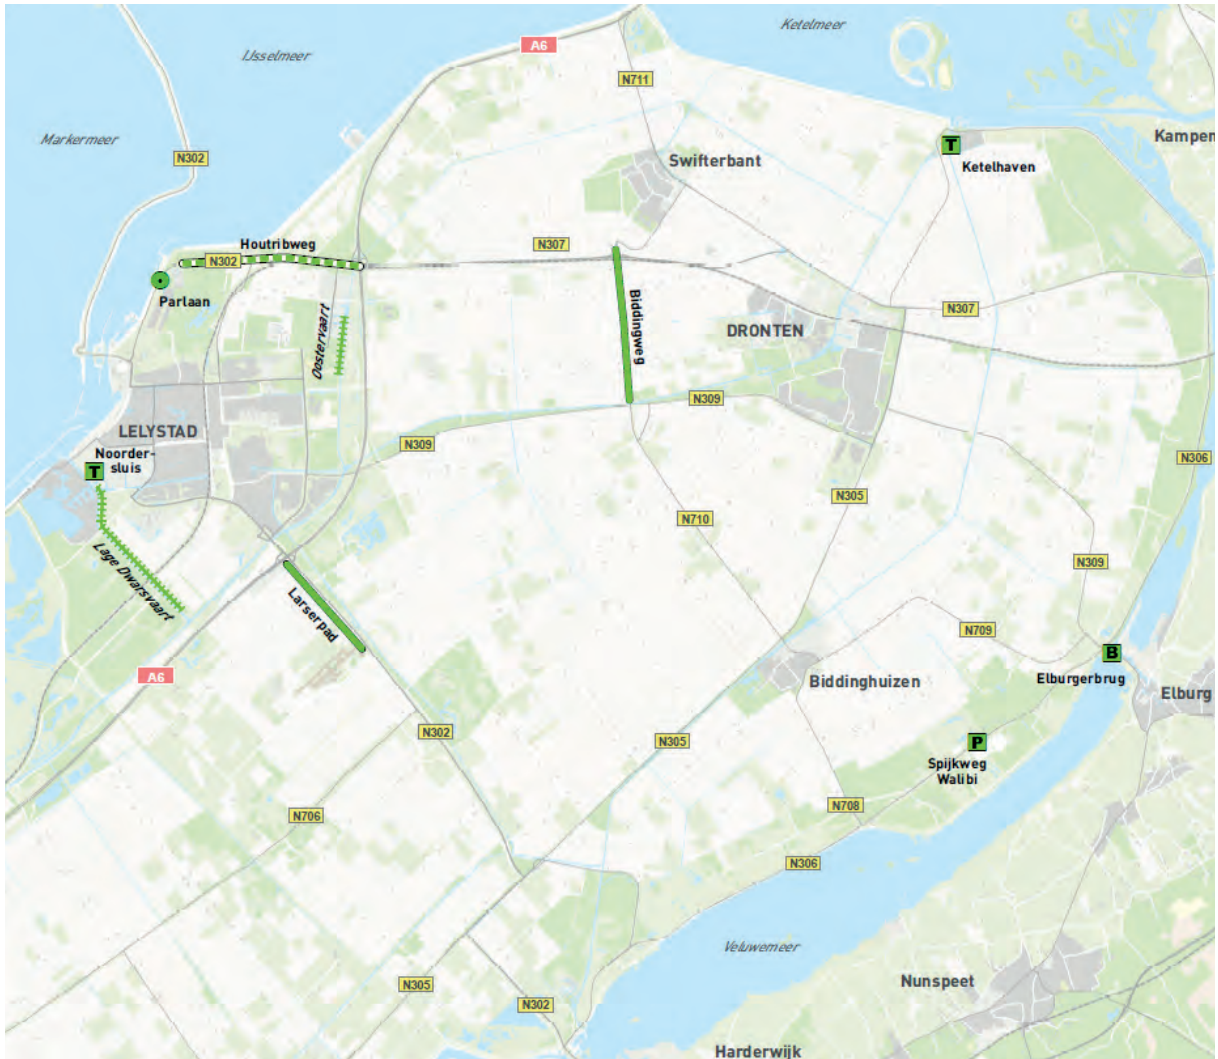

**PROJECTEN REGIO OOST**

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werzaamheden rotonde
	Ontsluiting parkeerplaats
	Werzaamheden bij brug
	Werzaamheden oeverbeschoeiing
	Aanleg trailerhelling



## Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
Biddingweg	Onderhoud hoofdrijbaan van de Biddingweg te Dronten van hm 3,0 tot hm 6,6.
Larserpad	Onderhoud en reconstructie parallelrijbaan van het Larserpad te Lelystad van de kruising Larserpad - Eendenweg tot de brug over de Lage Vaart.
Oostervaart	Groot onderhoud beschoeiingen van de beide oevers van de Lage Vaart te Lelystad van de aansluiting op de Lage Vaart tot de Steenstraat
Lage Dwarsvaart	Verspreid over de gehele Lage Dwarsvaart te Lelystad, op een aantal plaatsen werkzaamheden aan beschoeiingen op beide oevers.
Houtribdijk fietspad IJsselmeerdijk en VRI	Onderhoud fietspad tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk in combinatie met realisatie geregelde ontsluiting van Flevokust op de Houtribweg.

## Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
Biddingweg	2018	ja
Larserpad	2018	ja
Oostervaart	2019	nee (zie toelichting)
Lage Dwarsvaart	2019	nee (zie toelichting)
Houtribdijk	2018	ja

### Oostervaart

Een optimalisatieslag van de oeverbeschoeiing is mogelijk gebleken. Een voorbeeld van optimalisatie is het aanbrengen van blokkenmatten waardoor wild makkelijker uit het water kan klimmen. Om een zo optimaal mogelijke inrichting te geven aan de Flevolandse oevers, is meer voorbereidingstijd nodig.

### Lage Dwarsvaart

Idem als Oostervaart.

## Toprisico

Toprisico's	Beheersmaatregelen
In de regio Oostelijk Flevoland vinden regelmatig grootschalige evenementen plaats als Lowlands en Opwekking. Daarnaast bevindt zich hier Walibi dat druk wordt bezocht. Een terugkerend risico is daarom de planning van de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot bezoek recreatieparken en evenementen in regio Oostelijk Flevoland.	In nauw overleg met stakeholders wegafsluitingen plannen voor de opening van het recreatiesizoen en/of plannen tussen de grote evenementen door.

Doorkijk 2019 - 2023



PROJECTEN REGIO OOST

Soort werkzaamheden	
	Oudemoud rijbaan
	Werkzaamheden rotonde
	Werkzaamheden kruising
	Oudemoud fietspad
	Aanhag taunvoorzieningen
	Werkzaamheden oever / beschoeiing
	Werkzaamheden brug
	Aanhag tramreiling
Jaar van uitvoering	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023



## Projecten 2019 - 2023

Naam Project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
Biddingringweg	planuitwerkingsfase	2019
Hanzeweg	planuitwerkingsfase	2019
fp Dronterweg	planuitwerkingsfase	2019
Ontsluiting Flevokust	planuitwerkingsfase	2019
Lisdoddeweg	planuitwerkingsfase	2022
Oldebroekerweg	planuitwerkingsfase	2019
Larserweg	planuitwerkingsfase	2019
Lage Vaart	definitiefase	2020
Swiferringweg	definitiefase	2020
Harderdijk	definitiefase	2020
Dronterweg	definitiefase	2020
Overijsselseweg rotondes	definitiefase	2020
Lage Vaart	definitiefase	2020
Rotonde Dronerringweg	definitiefase	2020
Harderbosweg	definitiefase	2020
Markerwaarddijk aanleg loopbrug	definitiefase	2021
Bremerbergweg	initiatieffase	2022
Lage Vaart	initiatieffase	2021
Lage Vaart	initiatieffase	2022
Swifterweg	initiatieffase	2022
Kamperhoekweg rotonde	initiatieffase	2022
Spijkweg fietsbrug	initiatieffase	2023

# PROJECTEN REGIO ZUID

## Overzichtskaart 2018



### PROJECTEN REGIO ZUID

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Vervanging beplanting





## Projecten 2018

Naam Project	Korte omschrijving
Bomen Nijkerkerweg	Kap en aanplant van bomen langs de Nijkerkerweg tussen de Flediteweg en de Gooiseweg en het vervangen van dode bomen tussen de Flediteweg en Slingerweg
Fietspad Spiekweg	Aanleg van een fietspad tussen de Horsterweg en het Nulderpad met CO2 neutrale beton
Schollevaarweg-Spiekweg	Reconstructie van de rijbaan tussen de brug over de Hoge Vaart en de Roerdompweg
Vogelweg Almere	Reconstructie van de rijbaan tussen de A27 en Waterlandseweg en onderhoud aan het kunstwerk over de Hoge Vaart
Aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27	De aanleg van een rotonde bij de afrit A6 op de Buitenring en de aanleg van een middengeleider bij de op- en afrit A27 op de Vogelweg.
Trailerhellingen	De aanleg van vijf trailerhellingen

## Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-mirt
Bomen Nijkerkerweg	2018	ja
Fietspad Spiekweg	2018	ja
Schollevaarweg-Spiekweg	2018	ja
Vogelweg, Almere	2019	nee (zie toelichting)
Aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27	2019	nee (zie toelichting)
Trailerhellingen	2019	nee (toelichting)

### Vogelweg, Almere

Op verzoek van de gemeente Almere wordt het wegprofiel aangepast om de woonwijken beter te ontsluiten. In overleg met Almere worden twee rotondes aangelegd, waar in eerste instantie een oversteek voor langzaam verkeer met middengeleider en opstelplaats was voorzien. Hiervoor is meer voorbereidingstijd noodzakelijk. Gelijktijdig wordt de overdracht van dit wegvak van de provincie Flevoland aan de gemeente Almere uitgewerkt.

### Aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27

#### *Aansluiting A6 Afrit 8 Almere Buiten Oost*

Omdat Rijkswaterstaat een versnelling van de verbetering van de A6 heeft doorgevoerd, sluit hun planning niet meer aan op het omliggende wegennetwerk. Beide planningen zijn in overeenstemming gebracht. Hierdoor zal de nieuwe aansluiting van de A6 op Afrit 8 Almere Buiten Oost in juli 2019 gerealiseerd zijn.

#### *Aansluiting Vogelweg / A27*

Na overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat er verschillende afsluitingen plaats vinden van de Waterlandseweg voor het project SAA. Deze afsluitingen leiden tot een slechte bereikbaarheid van Almere Hout (Oosterwold, Nobelhorst, Vogelhorst). Om de overlast voor Almere Hout te beperken en een goede bereikbaarheid mogelijk te maken, wordt de weg in de zomer 2019 maar één keer afgesloten voor integrale uitvoering van alle werkzaamheden.

### Trailerhellingen

De aanleg van vijf trailerhellingen schuift één jaar door, naar 2019. Dit komt omdat het onderzoek naar de vijf optimale locaties voor de trailerhellingen langer heeft geduurd.

## Toprisico

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infrastructurele werkzaamheden rondom Almere	Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Doorkijk 2019 - 2023



PROJECTEN REGIO ZUID

Soort werkzaamheden	
	Onderhoud rijbaan
	Onderhoud fietspad
	Werkzaamheden rotonde
	Werkzaamheden VRI
	Vervanging beplanting
	Werkzaamheden oever/beschoeiing
	Aanleg trailerhelling
Jaar van uitvoering	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023



## Projecten 2019 - 2023

Naam Project	Waar staan we	Geplande periode uitvoering
Rijbaan Slingerweg	planuitwerkingsfase	2019
Aansluiting Buitenring-A6 en Vogelweg-A27	planuitwerkingsfase	2019
Trailerhellingen	planuitwerkingsfase	2019
Populieren Buitenring	planuitwerkingsfase	2019
Rijbaan Spiekweg	planuitwerkingsfase	2019
Vogelweg, Almere	planuitwerkingsfase	2019
Vogelweg, Lelystad	planuitwerkingsfase	2019
Oevers Hoge Vaart	planuitwerkingsfase	2019
Aansluiting verbindingsboog Tussenring-Buitenring	definitiefase	2019
Oevers Hoge Vaart	definitiefase	2020
VRI 1017 en 1061	definitiefase	2020
VRI 1043, 27, 28 en 40	definitiefase	2020
Fietspad Oostvaardersdijk	definitiefase	2020
Rotonde NBC	definitiefase	2020
Rijbaan Eemmeerdiijk	initiatieffase	2021
Bomen Hogering	initiatieffase	2021
Rijbaan Tussenring	initiatieffase	2021
Oevers Hoge en Lage Vaart	initiatieffase	2021
Bomen Tussenring	initiatieffase	2022
Rijbaan Oostvaardersdijk	initiatieffase	2022
Kruising Nijkerkerweg-Spiekweg	initiatieffase	2022
Oevers Hoge Vaart	initiatieffase	2022/2023
Rijbaan Gooiseweg	initiatieffase	2022
Kruispunt Hogering/Buitenring	initiatieffase	2022
Rijbaan en fietspad Gooimeerdijk-Oost	initiatieffase	2023
Rotonde Buitenring/Stripheldenweg	initiatieffase	2023
Rijbaan Futenweg	initiatieffase	2023

## BESLUITVORMING EN ROL PROVINCIALE STATEN

- Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.

In het coalitieakkoord is afgesproken een sobere en doelmatige uitvoering na te streven.

## EXTERNE COMMUNICATIE

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met externen toegepast:

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg;
- Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins, aankondiging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken;
- Social media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, voortgang van werkzaamheden, calamiteiten e.d.



## COLOFON

**Dit is een uitgave van:**

Afdeling Infrastructuur  
Provincie Flevoland  
Visarendreef 1  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

**Contact:**

Telefoon 0320 - 26 55 66  
E-mail: [info@flevoland.nl](mailto:info@flevoland.nl)  
[www.flevoland.nl](http://www.flevoland.nl)

November 2018  
eDocs #2324662
