

*Onderwerp*

20113-12-05 2019-06\_Mededeling PS bij voortgangsrapportage Project 'N305 Gooiseweg fase 3' (peildatum juni 2019)

*Kern mededeling:*

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.

*Mededeling:*

Hierbij treft u de voortgangsrapportage peildatum juni 2019 aan van het project 'N305 Gooiseweg fase 3'. In deze rapportage leest u hoe het project ervoor staat.

*Bijlagen*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
2019-06 Bestuurlijke Voortgangsrapportage project N305 Gooiseweg fase 3	2412460	Ja

*Registratienummer*

2431519

*Datum*

26 juni 2019

*Afdeling/Bureau*

INFRA

*Openbaarheid*

Openbaar

*Portefeuillehouder*

Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en burgerleden

## Voortgangsrapportage


### N305 Goiseweg Fase 3



## Het project N305 Goiseweg fase 3

Het project ligt tussen de A27 en de Nijkerkerweg. Deze weg is zowel voor Almere, Zeewolde als Lelystad Airport een belangrijke verbindingsweg. Tevens is de weg een alternatieve route voor verkeer bij incidenten op de A28, A6 en A27.

### Overzichtsk kaart

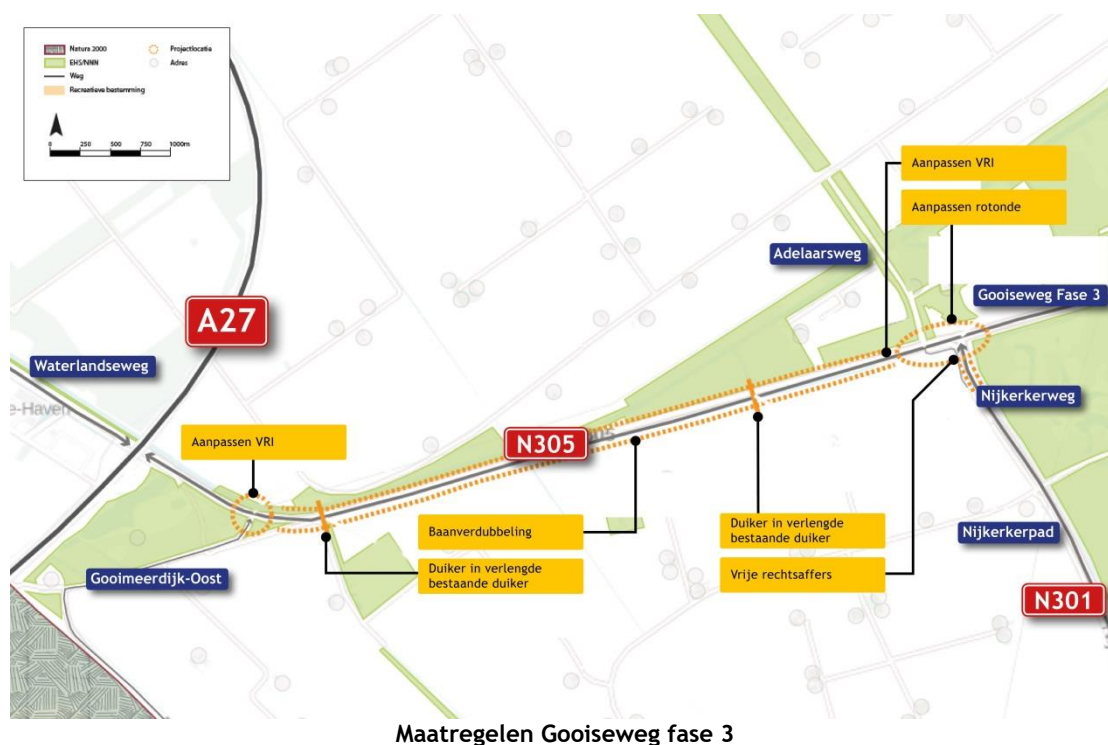

## Aanleiding

In haar huidige vorm loopt de N305 Goiseweg, op het traject Nijkerkerweg - Gooimeerdijk-Oost, in de periode 2020-2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Door de weg te verdubbelen verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en wordt het *carré* van 2x2 autowegen en autosnelwegen rondom Lelystad Airport gesloten.

## Projectkenmerken


Het project omvat het:

- verdubbelen van de huidige weg van 1 x 2 rijstroken naar 2 x 2 rijstroken met een tussenberm over een traject van ca. 6 km. De nieuwe rijbaan wordt ten Noorden van de huidige rijbaan gerealiseerd;
- aanpassen van de kruispunten van de N305 met de Nijkerkerweg, de Adelaarsweg/Nijkerkerpad en de Gooimeerdijk-Oost;
- aanleggen van nieuwe duikers in het verlengde van de bestaande duikers in de Priemtocht en de Rassenbeektocht;
- treffen van inpassingsmaatregelen ten behoeve van het landschappelijk inpassen van de weg in de directe omgeving.

## Waar staan we

De voorbelasting is aangebracht en tot en met augustus is de aannemer bezig met de overige voorbereidende werkzaamheden, inclusief de uitvoering van twee nieuwe duikers.

Het bestemmingplan is gewijzigd en op 24 april 2019 onherroepelijk geworden.



De aanbesteding voor de groenwerkzaamheden loopt en de aanbesteding voor de civiele werkzaamheden start het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2019. De werkzaamheden voor groen zullen parallel aan de andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

## Financiën

Budget	Raming
€ 13.843.000,=	€ 12.808.000,=

De raming past binnen het beschikbare krediet en besluit is genomen om tot uitvoering over te gaan.

## Toprisico's

Toprisico's	Beheermaatregelen
Door het tegelijkertijd in uitvoering hebben van meerdere werkzaamheden ontstaat verkeershinder voor weggebruikers.	Het werk is in Melvin (planningssysteem voor afstemmen wegwerkzaamheden overheden) ingevoerd.
De Gooiseweg fase 3 bevindt zich in het voormalige stroomgebied van de Oereem. Omdat de grondopbouw in het stroomgebied een andere samenstelling kan hebben dan de omliggende bodem, kan dit leiden tot zettingsverschillen en oneffenheden in het wegdek.	De zetting van de grond wordt gemonitord. Indien hieruit blijkt dat de zetting afwijkt van de verwachtingen kunnen de volgende maatregelen worden getroffen: a. extra overhoogte aanbrengen b. periode voorbelasting verlengen, als planning dat toestaat

## Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

## Externe Communicatie

De direct omwonenden zijn individueel bezocht en de weggebruikers zijn tijdens 2 ochtenden onder het genot van een gratis kop koffie geïnformeerd over de werkzaamheden.



Daarnaast blijft het team de belanghebbenden, weggebruikers en de omwonenden frequent informeren.

De projectsite ten behoeve van de publiekscommunicatie staat op [www.flevoland.nl](http://www.flevoland.nl).

## Colofon

**Dit is een uitgave van:**

Afdeling Infrastructuur

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1

Postbus 55

8200 AB Lelystad

**Contact:**

Telefoon 0320 - 265 265

E-mail: [info@flevoland.nl](mailto:info@flevoland.nl)

[www.flevoland.nl](http://www.flevoland.nl)

juni 2019

eDocs 2412460
