



Onderwerp

2e voortgangsrapportage regioprojecten 2021

Kern mededeling:

Het collega van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regelmaat over de voortgang van de infrastructurele projecten.

Mededeling:

Bijgaande voortgangsrapportage geeft u de voortgang van de regioprojecten peildatum november 2021.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aange- ven)
2* voortgangsrapportage regioprojecten 2021	2843464	Ja

Registratienummer

2879405

Datum

14 december 2021

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



PROVINCIE FLEVOLAND

2e Voortgangsrapportage 2021

Regioprojecten



November 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Samenvatting	3
Projecten Regio Noord	4
Overzichtskaart 2021	4
Projecten 2021	4
Doorkijk 2022 – 2025	6
Projecten Regio Oost	7
Overzichtskaart 2021	7
Projecten 2021	7
Doorkijk 2022 – 2025	10
Projecten Regio Zuid	11
Overzichtskaart 2021	11
Projecten 2020	11
Doorkijk 2022 – 2025	13
Besluitvorming en rol Provinciale Staten	14
Externe communicatie	14
Colofon	14

Samenvatting

Dit is de voortgangsrapportage van de regioprojecten voor het jaarprogramma 2021. Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de projecten voor groot onderhoud aan onze wegen en vaarwegen. Het gaat hier om reguliere projecten zoals de vervanging van wegen en fietspaden, kleinere reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook verkeerslichten, beplanting en aanleg van walbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers e.d. Daarnaast is er nog een aantal grote infrastructurele projecten waarvoor u apart voortgangsrapportages ontvangt.

Inmiddels zitten we al ruim anderhalf jaar in een moeilijke periode als gevolg de Corona pandemie. Zoals wij u eerder hebben bericht is ons uitgangspunt - in lijn met de oproep van Bouwend Nederland - om onze werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Onze opdrachtnemers zijn met inachtneming van de RIVM-richtlijnen volop aan het werk om de geplande werkzaamheden uit te voeren.

In april dit jaar hebben we een 1e rapportage over de voortgang van de projecten voor het regulier onderhoud van wegen en vaarwegen aan u voorgelegd. Nu, in het najaar, leggen we de 2e voortgangsrapportage aan u voor. Met 36 geprogrammeerde projecten is 2021 een uitzonderlijk druk uitvoeringsjaar (2020; 27 projecten, 2019; 29 projecten).

Geconstateerd wordt dat de uitvoering van een aantal projecten (deels) wordt doorgeschoven naar 2022. Dit om uiteenlopende redenen als de beschikbaarheid van materialen, overlastbeperking in de uitvoering, nader onderzoek (droogteschade), scopewijzigingen, discussie met 'omgeving' over verkeersveiligheid, gewenste uitvoering e.d..

In algemene zin kan opgemerkt worden dat we bij de realisering van onze projecten in toenemende mate te maken hebben met een 'mondige omgeving'. Uiteenlopende wensen en kansen die gedurende de voorbereiding worden ingebracht vragen steeds meer aandacht. Uiteindelijk komt dit het draagvlak en kwaliteit van de gekozen oplossingen ten goede maar het legt ook een behoorlijk beslag op onze capaciteit en planning. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten en vraagt om een intensivering en heroriëntatie van de inzet en bemensing van onze projectteams.

Projecten Regio Noord

Overzichtskaart 2021



Projecten 2021

Naam project	Korte omschrijving
Fietspaden Gemaalweg, Kamperweg en Nagelerweg.	Reconstructie van verhardingen van asfalt en beton op (gedeelte van) fietspaden.
Bomen Espelerringweg.	Vervangen populieren.
Bomen Gemaalweg.	Aanplant bomen.
Rijbaan Espelerweg.	Reconstructie vanaf de Hannie Schaftweg tot de Banterweg incl. vervangen openbare verlichting.
Brug Hannie Schaftweg over Urkerweg en Urkervaart.	Onderhoudswerkzaamheden beton, leuning en geleiderail.
Fietsbrug Steenwijkerweg/Uiterdijkenweg.	Vervangen bovenbouw fietsbrug.
Rotonde Vollenhoverweg – Repelweg.	Reconstructie rotonde.
Rotonde Vollenhoverweg-Steenwijkerweg.	Reconstructie rotonde.
Natuurvriendelijke oever Zwolse Vaart.	Aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Fietspaden Gemaalweg, Kamperweg en Gemaalweg.	2021	Ja
Bomen Espelerringweg.	2021/2022	Deels, 2021 kap beplanting, eerste kwartaal 2022 nieuwe aanplant.
Bomen Gemaalweg.	2021	Ja
Rijbaan Espelerweg.	2021	Ja
Brug Hannie Schaftweg over Urkerweg en Urkervaart.	2021	Ja
Fietsbrug Steenwijkerweg/Uiterdijkenweg.	2021	Ja
Rotonde Vollenhoverweg-Repelweg.	2021	Ja
Rotonde Vollenhoverweg-Steenwijkerweg.	2021	Ja
Natuurvriendelijke oever Zwolse Vaart.	2021	Ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Krapte in de berm zorgt bij wegverbreding voor complexiteit met kabels / leidingen en bomen.	Andere constructieve oplossingen toepassen.
Door het plannen van diverse rijbaanprojecten in het voorjaar i.v.m. oogstperiode zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het omleiden van het verkeer.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.

Doorkijk 2022 – 2025



Projecten Regio Oost

Overzichtskaart 2021



Projecten 2021

Naam project	Korte omschrijving
Rotonde Dronterweg – Swifterringweg.	Aanleg rotonde.
Rotonde Dronterringweg - De Noord.	Onderhoud verharding.
Rijbaan Swifterringweg.	Onderhoud verharding rijbaan en fietspad.
Rotondes Houtribweg.	Onderhoud verharding en bewegwijzering 3 rotondes bij A6.
Rotonde Dronterringweg- Rivierendreef.	Onderhoud verharding, fietsoversteek, bewegwijzering.
Bomen Dronterweg.	Vervangen populieren.
Rijbaan Larserpad.	Onderhoud verharding.
Rotonde Biddingringweg – Dronterweg.	Aanleg rotonde, openbare verlichting rotonde, bewegwijzering rotonde en beplanting rotonde.
Rijbaan Biddingringweg.	Rijbaan rechts vervangen deklaag door GRA.
Rijbaan Dronterweg.	Onderhoud verharding.
Rotondes Biddingweg.	2 rotondes onderhoud verharding, combimasten en geleiderail.
Fietsbrug Spijkweg.	Vervangen bovenbouw fietsbrug (bij Walibi).
Fietspad Hanzeweg fietspad.	Weghalen oude fietspad.

Naam project	Korte omschrijving
Beplanting Oldebroekerweg / Bremerbergweg.	Revitalisering beplanting.
Rijbaan Larserweg.	Verkeersveiligheid: aanbrengen graskanttegels.
Trailerhelling Gelderse Diep.	Aanleg nieuwe Trailerhelling.
Beschoeiing Oostervaart.	Vervangen beschoeiing op diverse locaties.

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Rotonde Dronterweg – Swiferringweg.	2021	Ja
Rotonde Dronterringweg - De Noord.	2021	Ja
Rijbaan Swiferringweg.	2022	Nee, juridische bezwaren (die naderhand weer zijn ingetrokken) gedurende de aanbestedingsprocedure hebben geleid tot vertraging waardoor de uitvoeringsperiode gelijktijdig is komen te liggen met de werkzaamheden voor Windplan-Blauw en de oogsttijd van omliggende boeren. Om overlast te beperken is de uitvoering uitgesteld naar de eerste helft van 2022.
Rotondes Houtribweg.	2021	Ja
Rotonde Dronterringweg- De Rivierendreef.	2021	Ja
Bomen Dronterweg.	2021/2022	Deels, 2021 kap beplanting, eerste kwartaal 2022 nieuwe aanplant.
Rijbaan Larserpad.	2021	Ja
Rotonde Biddingringweg – Dronterweg. Rijbaan Biddingringweg. Rijbaan Dronterweg.	2022	Nee, na een intensief voortraject met de gemeente Dronten is ervoor gekozen extra tijdelijke maatregelen te treffen om tijdens de uitvoering de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Deze intensieve afstemming, samen met onverwacht noodzakelijk aanvullend onderzoek in het kader flora en fauna (rugstreeppad, vliegroue vleermuizen en marter), heeft geleid tot vertraging waardoor de uitvoering wordt doorgeschoven naar de eerste helft van 2022.
Rotondes Biddingweg.	2021	Ja
Fietsbrug Spijkweg.	2021/2022	Ja, de geprogrammeerde aanpassing aan de fietsbrug Spijkweg is gereed. Tijdens de uitvoering bleek dat de landhoofden van de fietsbrug in dermate slechte staat verkeren dat ook deze moeten worden opgeknapt. Het gaat hier dus om uitvoering van extra werkzaamheden (scope-uitbreiding) die in het eerste kwartaal van 2022 worden opgepakt.
Fietspad Hanzeweg fietspad tussen Ketelweg en Hogevaart.	2021	Ja

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Beplanting Oldebroekerweg / Bremerbergweg.	2022	Deels, 2021 kap beplanting, eerste kwartaal 2022 nieuwe aanplant.
Rijbaan Larserweg.	2021	Ja
Trailerhelling Gelderse Diep.	2021	Ja
Vervangen beschoeiing Oostervaart.	2021	Ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Door de grote hoeveelheid projecten die gelijktijdig in de uitvoering komen zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het omleiden van het verkeer.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.

Doorkijk 2022 – 2025



Projecten Regio Zuid

Overzichtskaart 2021



Projecten 2021

Naam project	Korte omschrijving
Verkeerslichten Gooimeerdijk Oost.	Vervangen Voedingskabel.
Geluidsscherm Buitenring.	Plaatsen geluidsscherm.
Rijbaan Tussenring.	Rijbaan verharding: geluidsreducerend asfalt en bewegwijzering.
Bewegwijzering Ringen Almere.	Onderhoud bewegwijzering.
Rijbaan Gooiseweg; hm 27.6 - hm32.4.	Verharding rijbaan en bermverharding
Rijbaan Gooiseweg; hm 21.3 - hm 22.1.	Verharding rijbaan en bermverharding
Bewegwijzering rotonde Buitenring – Stripheldenweg.	Onderhoud bewegwijzering.
Bewegwijzering Hogering / Buitenring.	Onderhoud bewegwijzering.
Bomen Gooiseweg en Roerdompweg.	Vervangen esdoorns en kappen 50% bomen Roerdompweg.
Oevers Hoge Vaart.	Vervangen van de oeverbeschoeiing tussen de Zuiderluis en de A27.


Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Verkeerslichten Gooimeerdijk Oost.	2022	Nee, door de langere behandeltermijn van de stroomaansluiting bij het nutsbedrijf wordt de uitvoering uitgesteld tot 2022.
Geluidscherm Buitenring.	2022	Deels, door een langer vergunningstraject (welstand) en levertijden van materialen wordt later gestart met de uitvoering. De uitvoeringswerkzaamheden beginnen in 2021 en lopen door tot en met het eerste kwartaal van 2022.
Rijbaan Tussenring	2021	Ja
Bewegwijzering Ringen Almere	2021	Ja
Rijbaan Gooiseweg, hm 27.6. - hm 32.4	2021	Ja
Rijbaan Gooiseweg, hm 21.3 - hm 22.1.	2023	Nee, in verband met een onderzoek naar droogteschade aan de verharding is de uitvoering uitgesteld tot 2023.
Bewegwijzering rotonde Buitenring – Stripheldenweg.	2021	Ja
Bewegwijzering Hogering / Buitenring.	2021	Ja
Bomen Gooiseweg en Roerdompweg.	2021/2022	Deels, 2021 kap beplanting, eerste kwartaal 2022 nieuwe aanplant.
Oevers Hoge Vaart.	2021	Ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infrastructurele werkzaamheden rondom Almere.	Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Doorkijk 2022 – 2025

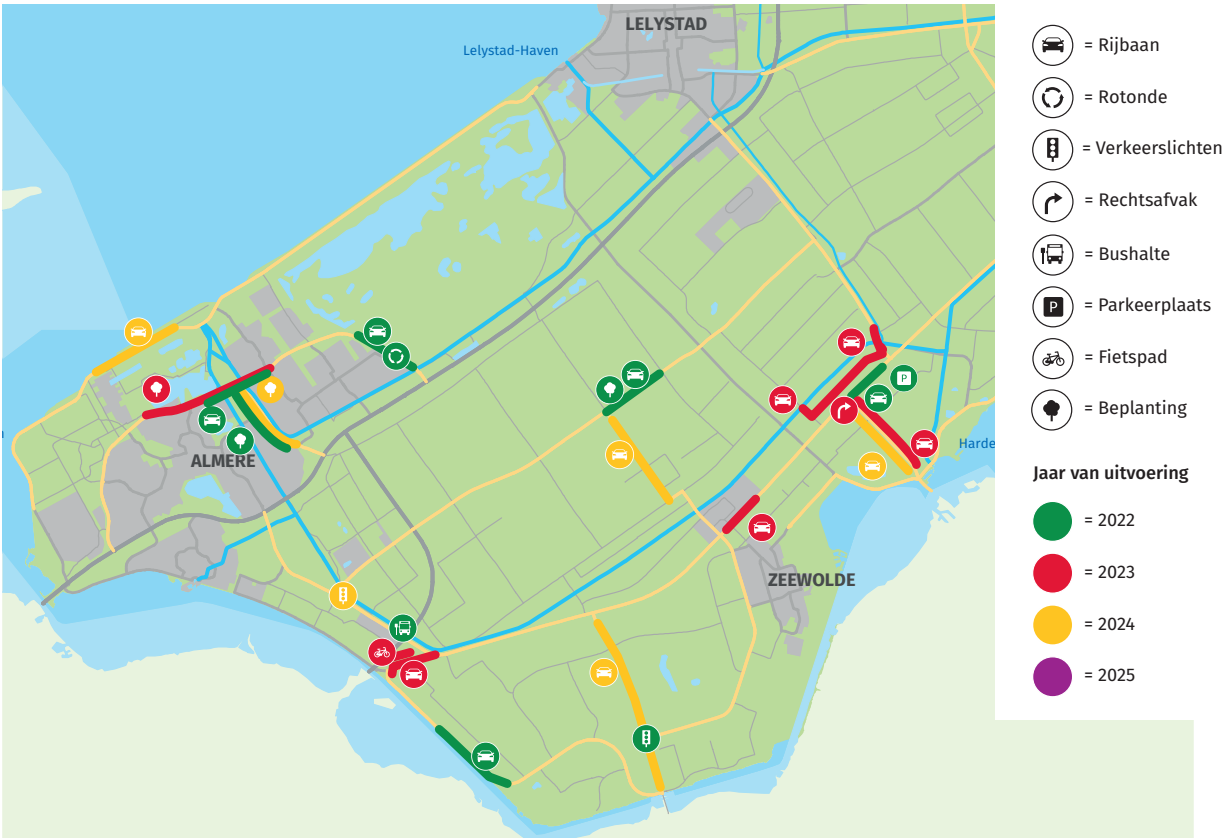

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT).

Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met externen toegepast:

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, Nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;
- Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van infobulletins en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt middels spandoeken en bouwboarden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, de provinciale website, de website Flevowegen.nl en de sociale mediakanalen. Het doel van deze communicatie is het zo goed mogelijk informeren en zodoende de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

T 0320 – 265 265
E info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl

November 2021

eDocs 2843464
