



Onderwerp

Mededeling 1e voortgangsrapportage regioprojecten 2020

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regelmaat over de voortgang van de infrastructurele projecten.

Mededeling:

Bijgaande voortgangsrapportage geeft u de voortgang van de eerste maanden van 2020 van de regioprojecten.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
1e voortgangsrapportage regioprojecten 2020	2572232	Ja

Registratienummer

2595501

Datum

29 april 2020

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



PROVINCIE FLEVOLAND

1e Voortgangsrapportage 2020

Regioprojecten

april 2020



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Projecten Regio Noord	4
Overzichtskaart 2020	4
Projecten 2020	4
Doorkijk 2021 – 2024	6
Projecten Regio Oost	7
Overzichtskaart 2020	7
Projecten 2020	7
Doorkijk 2021 – 2024	9
Projecten Regio Zuid	10
Overzichtskaart 2020	10
Projecten 2020	10
Doorkijk 2021 – 2024	12
Besluitvorming en rol Provinciale Staten	13
Externe communicatie	13
Colofon	13

Samenvatting

Wij beseffen ons terdege dat deze voortgangsrapportage u bereikt in een uiterst onzekere tijd als gevolg van de Coronacrisis. Ons uitgangspunt is - in lijn met de oproep van Bouwend Nederland - om lopende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Op dit moment zijn onze opdrachtnemers dan ook volop aan het werk om de geplande werkzaamheden uit te voeren. U zult begrijpen dat omstandigheden kunnen ontstaan die tot vertraging zouden kunnen leiden. Op dit moment is dat niet het geval en kan worden vastgehouden aan de planning. Het spreekt voor zich dat alle nodige maatregelen worden getroffen zodat er veilig kan worden gewerkt.

Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de projecten voor groot onderhoud aan onze wegen en vaarwegen. Het gaat hier om reguliere projecten zoals de vervanging van asfalt op wegen, de vernieuwing van fietspaden, kleinere reconstructies zoals de aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook verkeerslichten, beplanting en aanleg van walbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers e.d.

Het jaarprogramma 2020 is per regio inzichtelijk gemaakt door middel van een kaart. In de tabellen onder de kaart staat een omschrijving van de projecten en de voortgang. Geconstateerd wordt dat vrijwel alle projecten voor 2020 conform planning lopen. Voor 2 projecten wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2021. Dit als gevolg van een wijziging in de scope van een project en een samenvoeging met een ander project. Het doorschuiven van de 2 projecten staat geheel los van de Coronacrisis. Enkele toprisico's zijn nader toegelicht. De doorkijk 2021-2024 laat zien dat ook voor de komende jaren de uitvoering van een fors aantal projecten staat geprogrammeerd.

Projecten Regio Noord

Overzichtskaart 2020



Projecten 2020

Naam project	Korte omschrijving
Rijbaan Leemringweg	Reconstructie Leemringweg tussen rotonde Kraggenburg en bebouwde kom Marknesse
Rijbaan Espelerringweg	Reconstructie Espelerringweg tussen de Staartweg en de bebouwde kom Espel
Fietspaden Kamperweg, Nagelerweg, Gemaalweg	Reconstructie van verhardingen van asfalt en beton op (gedeelte van) fietspaden langs de Kamperweg, Nagelerweg en Gemaalweg
Beplanting Gemaalweg	Planten bomen in kader van boomvervanging
Rijbaan en rotondes Kuinderweg	Reconstructie Kuinderweg inclusief aansluitende rotondes tussen de Marknesserweg en de Dukaat.
Natuurvriendelijke oever Zwolsevaart	Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart
Fietspad Zuiderringweg	Reconstructie van asfaltverharding naar beton tussen Hertenweg en Neushoornweg
Remmingwerken Lemstervaart	Reconstructie remmingwerken in de Lemstervaart bij de brug ter hoogte van Bant
Trailerhellingen	Aanleg van 2 trailerhellingen
Vervangen beschoeiing Urkervaart	Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen


Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Rijbaan Leemringweg	2020	ja
Rijbaan Espelerringweg	2020	ja
Fietspaden Kamperweg, Nagelerweg, Gemaalweg.	2020	Nee, de uitvoering van de fietspaden Kamperweg, Nagelerweg en Gemaalweg zijn vanwege doorgevoerde scopewijzigingen vertraagd. Deze fietspaden worden wel in 2020 aanbesteed maar de uitvoering vindt begin 2021 plaats.
Beplanting Gemaalweg	2020	ja
Rijbaan en rotondes Kuinderweg	2020	ja
Natuurvriendelijke oever Zwolsevaart	2020	ja
Fietspad Zuiderringweg	2020	Nee, vanuit efficiency en overlastbeperking wordt het fietspad gekoppeld aan de uitvoering van de rijbaan Zuiderringweg die in 2022 staat gepland.
Remmingwerken Lemstervaart	2020	ja
Trailerhellingen	2020	ja
Vervangen beschoeiing Urkervaart	2020/2021	ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Krapte in de berm zorgt bij wegverbreding voor complexiteit met kabels / leidingen en bomen.	Andere constructieve oplossingen toepassen.
Door de grote hoeveelheid projecten die gelijktijdig in de uitvoering komen zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het goed omleiden van het verkeer.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.

Doorkijk 2021 – 2024

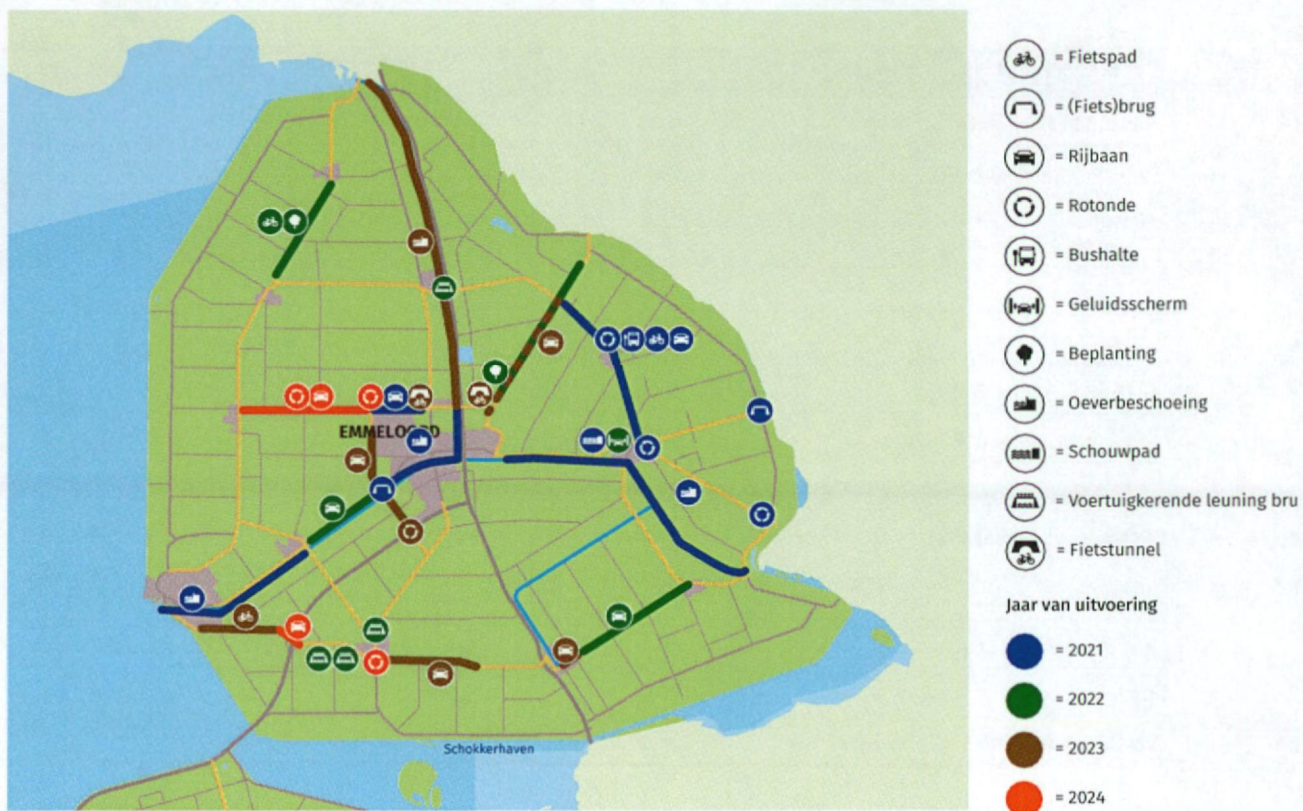

Projecten Regio Oost

Overzichtskaart 2020



Projecten 2020

Naam project	Korte omschrijving
Fietspad Biddingringweg	Fietspad Biddingringweg tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg. Vervanging van de huidige betonverharding door nieuw beton
Rijbaan Harderdijk	Onderhoud van hectometer 23,8 tot aan de Bremerbergweg
Rijbaan Hanzeweg	Onderhoud vanaf de Larserweg tot aan de Swiferringweg en aanleg van een rotonde op de kruising Dronterweg-Swiferringweg
Faunavoorziening Harderbosweg	Aanleg beplanting bij gemaal Lovink voor veilige oversteek otters
Verkeerslichten Hanzeweg	Vervangen verkeersregelautomaat
Rotoronde Houtribweg (Parlaan - Overstag)	Onderhoud aan de rotonde Houtribweg /Parlaan - Overstag
Vervangen populieren Biddingringweg	Planten bomen langs de Biddingringweg
Vervangen beschoeiing Lage Dwarsvaart	Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen
Vervangen beschoeiing Oostervaart	Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

Trailerhellingen	De aanleg van twee trailerhellingen
Vervangen beschoeiing Lage Vaart	Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Fietspad Biddingringweg	2020	ja
Rijbaan Harderdijk	2020	ja
Rijbaan Dronterweg	2020	ja
Faunavoorziening Harderbosweg	2020	ja
Verkeerslichten Hanzeweg	2020	ja
Rotonde Houtribweg (Parlaan – Overstag)	2020	Is reeds afgerond in 2019.
Vervangen populieren Biddingringweg	2020	ja
Vervangen beschoeiing Lage Dwarsvaart	2020	ja
Vervangen beschoeiing Oostervaart	2020	ja
Trailerhellingen	2020	ja
Vervangen beschoeiing Lage Vaart	2020/2021	ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Door de grote hoeveelheid projecten die gelijktijdig in de uitvoering komen zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het goed omleiden van het verkeer.	Goede afstemming van de uitvoeringsperiodes.

Doorkijk 2021 – 2024



Projecten Regio Zuid

Overzichtskaart 2020



Projecten 2020

Naam project	Korte omschrijving
Verkeerslichten diverse locaties	Vervangen van 6 verkeersregelaarsautomaten
Beplanting Hogering	Vervangen van beplanting langs de Hogering
Aanleg rotonde Buitenring	Aanleg van een rotonde ter plaatse van de aansluiting van het Natuurbelevingscentrum op de Buitenring
Fietspad Oostvaardersdijk / Spiekweg	Op diverse locaties herstellen van het bestaande fietspad
Oevers Hoge Vaart	Vervangen van de oeverbeschoeiing langs de Hoge Vaart tussen de Zuiderluis en de A27
Oevers Lage Vaart	Vervangen van de oeverbeschoeiing langs de Lage Vaart

Waar staan we

Naam project	Gereed	Conform MBVI / P-Mirt
Verkeerslichten diverse locaties	2020	ja
Beplanting Hogering	2020	ja

Aanleg rotonde Buitenring	2020	ja
Fietspad Oostvaardersdijk / Spiekweg	2020	ja
Oevers Hoge Vaart	2020	ja
Oevers Lage Vaart	2020.2021	ja

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Planning uitvoering projecten in relatie tot grote infra-structurele werkzaamheden rondom Almere.	Tijden en in nauw overleg met de omgeving (o.a. gemeente Almere) afspraken maken over de uitvoeringsperiode van projecten.

Doorkijk 2021 – 2024



Besluitvorming en rol Provinciale Staten

- Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT).

Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met externen toegepast:

- Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, Nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;
- Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;
- Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van infobulletins en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt middels spandoeken en bouwboarden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, de provinciale website, de website Flevowegen.nl en de sociale mediakanalen. Het doel van deze communicatie is het zo goed mogelijk informeren en zodoende de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

T 0320 – 265 265
E info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl

april 2020

eDocs 2572232
