



Onderwerp

Voortgangsrapportage Ontsluitingsweg Urk

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten regelmatig over de voortgang van de grote infrastructurele projecten.

Mededeling:

De bijgaande rapportage geeft inzicht in de voortgang van de realisatie van het project Ontsluitingsweg Urk.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Voortgangsrapportage Ontsluitingsweg Urk	3028946	ja

Registratienummer

3071665

Datum

1 februari 2023

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



PROVINCIE FLEVOLAND

Ontsluitingsweg Urk

Voortgangsrapportage



December 2022

Inleiding

De toenemende drukte op de Domineesweg zorgt voor problemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. Zonder aanvullende maatregelen worden steeds grotere problemen verwacht op de Domineesweg en de bereikbaarheid van Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder. Daarnaast vinden diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats zoals de Maritieme servicehaven, het bedrijventerrein 'Port of Urk' en de nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk. Deze ruimtelijke ontwikkelingen samen met de autonome ontwikkeling van Urk zorgen voor een sterke toename van verkeer op de Domineesweg en binnen Urk leidt tot problemen ten aanzien van doorstroming en verkeersveiligheid.

De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg draagt bij aan de volgende doelstellingen:

- Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Domineesweg zonder daarbij andere wegen te overbelasten en ook zonder ongeoorloofde overlast te veroorzaken voor de omgeving;
- Het beperken van de verkeersintensiteit op de Domineesweg tot onder de 12.000 motorvoertuigen per etmaal, zonder daarbij andere wegen te overbelasten en ook zonder overlast te veroorzaken op de omgeving;
- Een goede gespreide ontsluiting van Urk en de Zuidwesthoek van de Noordoostpolder naar de A6.

Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursvariant tussen de Staartweg en de Domineesweg die begin 2021 is vastgesteld door Provinciale Staten. Het project bevindt zich in de planvoorbereidingsfase.

Kenmerken

- Aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Domineesweg en de Staartweg, parallel langs de Nagelervaart
- De ontsluitingsweg Urk wordt een provinciale weg met een toegestane maximale snelheid van 80 km/u.
- Aanleg van een aantal kruispunten op de ontsluitingsweg.
- De bouw van een brug over de Urkervaart.
- Aanpassingen aan onderliggend wegennet als gevolg van de Ontsluitingsweg.

Over de vormgeving van de weg moeten nog keuzes gemaakt worden.


Overzichtskaart



In de planvoorbereidingsfase worden vraagstukken, zoals benoemd in de getekende bestuursovereenkomst, nader onderzocht. Dit betreft onder andere:

- Een vaste brug of beweegbare brug;
- Een nieuwe rechtstreekse verbinding van de Zeeheldenwijk naar de ontsluitingsweg Urk;
- De aansluiting van de Karel Doormanweg op de nieuwe ontsluitingsweg Urk.

Waar staan we

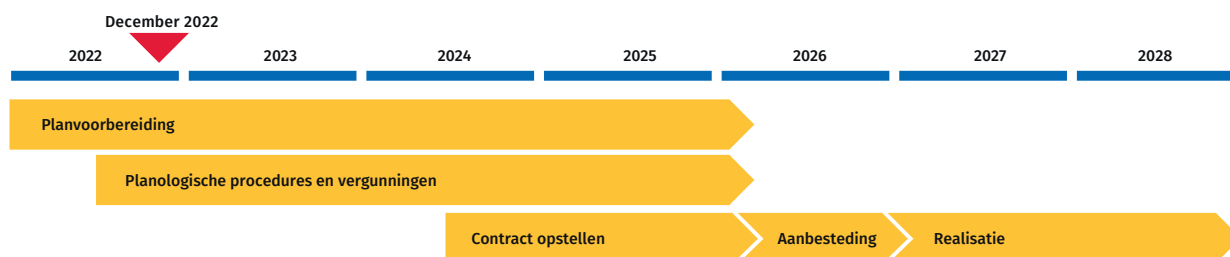

De planvoorbereiding wordt gezamenlijk doorlopen door de provincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst.

De belangrijkste mijlpalen in de huidige planvoorbereidingsfase, waarvan participatie een integraal onderdeel uitmaakt:

juli 2023	Besluit uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
3e kwartaal 2023	Publicatie kennisgeving participatie, uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
4e kwartaal 2023 t/m 2e kwartaal 2024	Uitwerken M.e.r.- voorkeursalternatief
Juli 2024	Besluit M.e.r. - voorkeursalternatief
2e helft 2024	Uitwerken ontwerp-projectbesluit en M.e.r.
Februari t/m april 2025	Publicatie ontwerp-projectbesluit en M.e.r.
Maart 2026	Definitief Projectbesluit

Financiën

Het taakstellende investeringsbudget bedraagt € 31 miljoen (exclusief BTW) conform de ondertekende bestuursovereenkomst d.d. 6 april 2022. Hiervan is €2.242.887,- bestemd voor de planvoorbereiding.

Budget conform bestuursovereenkomst	Raming verkenning
€ 23,25 mln. provincie Flevoland	23,25 mln.
€ 5,5 mln. gemeente Urk	5,5 mln.
€ 2,25 mln. gemeenten Urk en Noordoostpolder	2,25 mln.

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Aanvullende wensen, eisen en gebiedsontwikkelingen zorgen voor vertraging in de planontwikkeling	Wijzigingen vroegtijdig signaleren en alloceren
De benodigde gronden voor de aanleg van de Ontsluitingsweg Urk zijn niet beschikbaar bij de aanbesteding uitvoering	Het opstellen van een strategisch grondverwervingsplan, het Rijksvastgoedbedrijf vroegtijdig betrekken bij het project en tijdig een Rentmeester inschakelen
Er is geen duidelijke regelgeving rondom stikstof, waardoor niet duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden	Vroegtijdig stikstofberekeningen laten uitvoeren

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Provinciale Staten en de gemeenteraden van Urk en de Noordoostpolder worden betrokken bij de fases van het projectbesluit en de besluitvorming en worden zij twee keer per jaar op de hoogte gebracht van de voortgang.

Externe Communicatie

Tijdens de verkenning is het participatieproces opgestart, in de geest van de nieuwe Omgevingswet. In de huidige planvoorbereidingsfase wordt de participatie verbreed en doorgezet:

- Via de publicatie kennisgeving participatie, uitgangspuntennotitie en notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) wordt de omgeving gevraagd om te reageren op de kennisgeving, die gedurende zes weken ter inzage ligt
- Voor de uitwerking van het voorontwerp en uiteindelijk het ontwerp-projectbesluit en de m.e.r. wordt input opgehaald bij stakeholders (samenwerkingspartners, belanghebbenden).
- Publicatie ontwerp-projectbesluit en de m.e.r. waarop inwoners kunnen reageren. Het publiceren van deze documenten en het duidelijk communiceren van de reactietermijnen is een belangrijk onderdeel in het participatieproces. Na vaststellen van het ontwerp-projectbesluit wordt toegewerkt naar het definitief projectbesluit. Hiertoe worden alle reacties op het ontwerp-projectbesluit verwerkt.



Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 265 265

E-mail: info@flevoland.nl

www.flevoland.nl

November 2022

eDocs #3028946
