



Onderwerp

Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.

Mededeling:

Bijgaande rapportage geeft inzicht in de voortgang van de realisatie van het project Verbreding Hogering Almere.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere - juni 2018	2247904	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

2249829

Datum

4 juni 2018

Auteur

H. van Heerde

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**



VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2018


Verbreiding Hogering Almere



INLEIDING

Het project Verbreiding Hogering Almere is een van de maatregelen uit het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere. In dat convenant hebben de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland afspraken gemaakt over projecten die worden uitgevoerd om de infrastructuur in en rond Almere toekomstbestendig te maken en passend bij de groei en ambitie van Almere. Daarmee past de verbreiding van de Hogering in het bredere afsprakenkader tussen Rijk en regio over de gewenste groei van Almere, waarvoor de RAAM-brief van het kabinet in 2009 als vertrekpunt geldt.


Bij de uitvoering van het project wordt meteen aangesloten op de nieuwe verbinding van de A6 met de Hogering die het Rijk heeft gerealiseerd als onderdeel van het programma Schiphol – Amsterdam – Almere. De verbreiding van de Hogering moet toekomst vast zijn en gebaseerd op de groei van Almere; dat wil zeggen dat de wegcapaciteit voor in ieder geval de komende 15 jaar voldoende moet zijn om de groei van Almere te faciliteren.

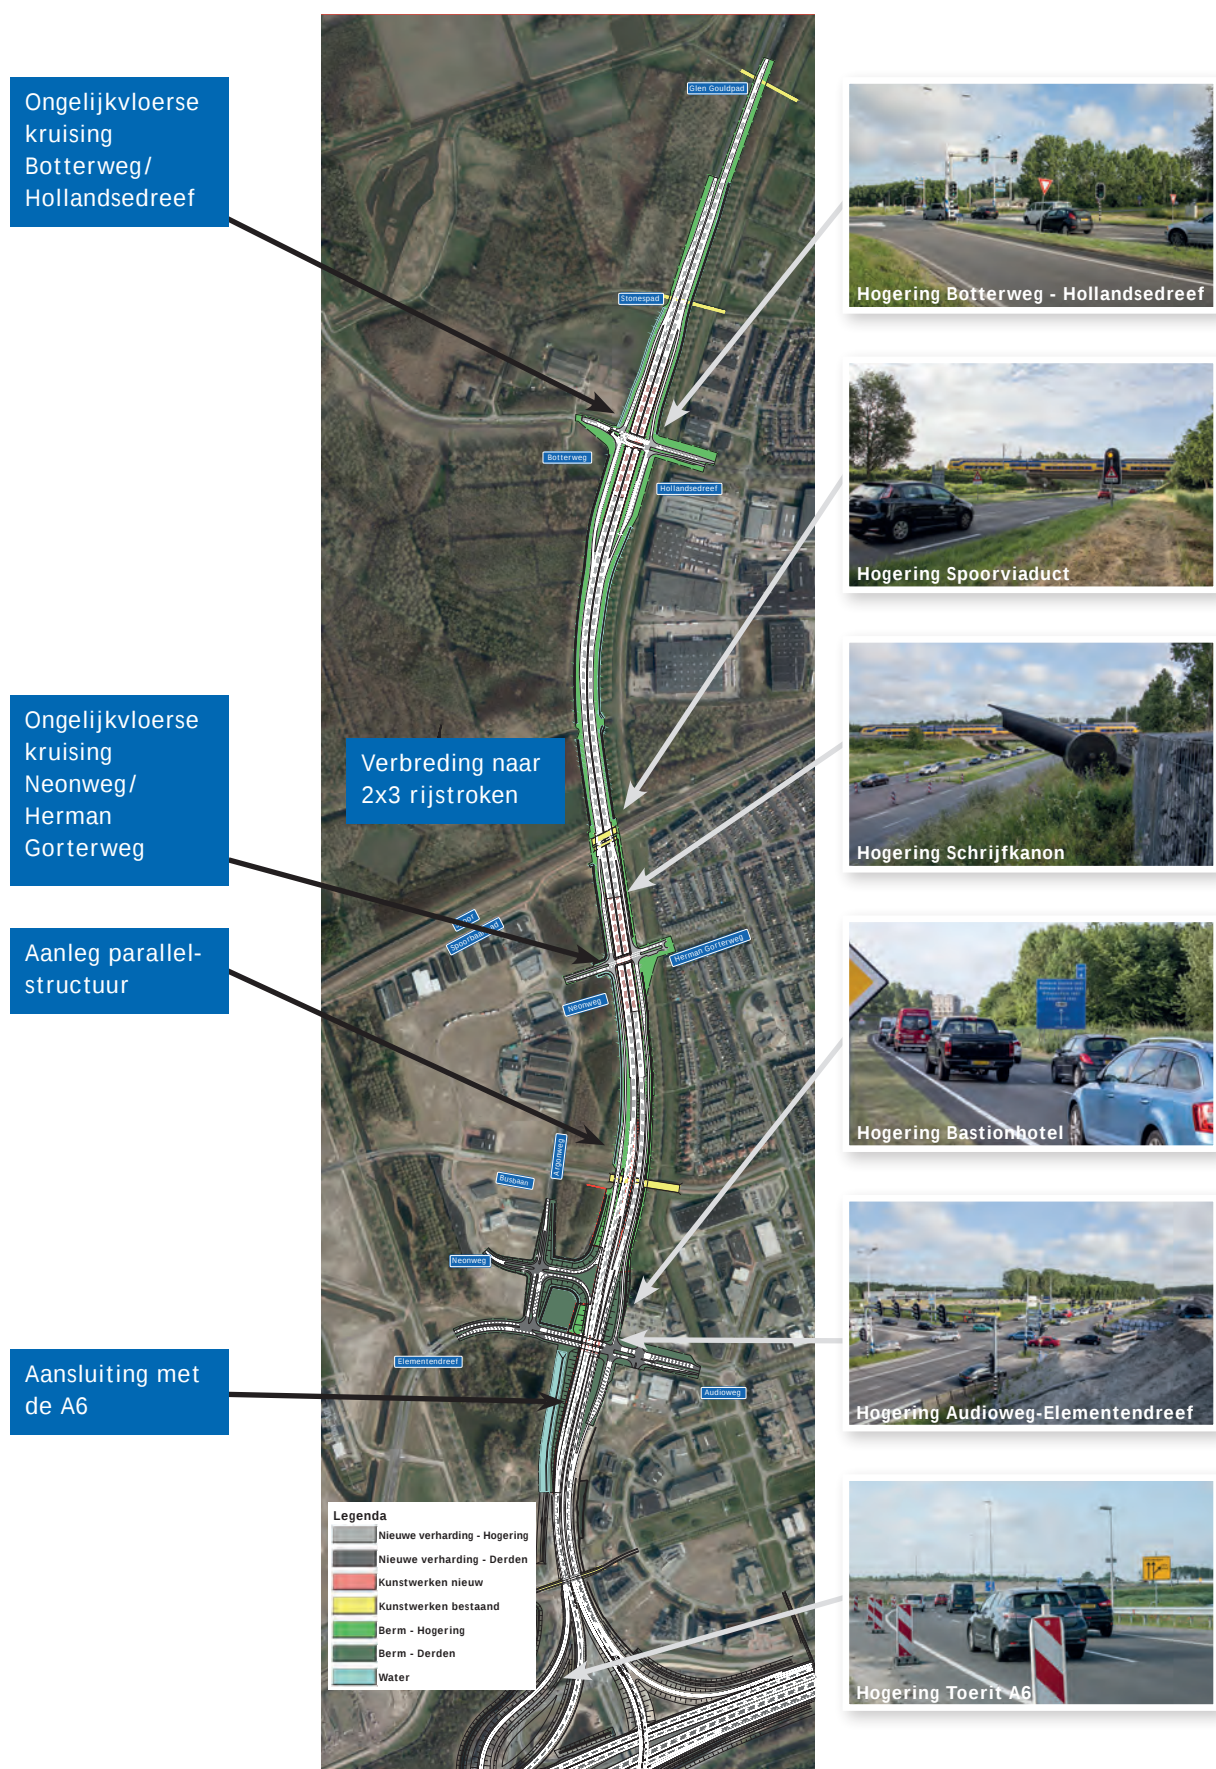

Kenmerken

- Vanaf de aansluiting A6 t/m kruising Hollandsedreef verbreding naar 2 x 3 rijstroken
- Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Herman Gorterweg & Neonweg
- Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Botterweg & Hollandsedreef
- Aanleg van een parallelstructuur voor de ontsluiting Herman Gorterweg/Neonweg en Elementendreef/Audioweg

Waar staan we



Het project Verbreiding Hogering Almere wordt momenteel aanbesteed. In augustus is naar verwachting bekend welke aannemer het werk in de periode 2018-2022 gaat uitvoeren. De feitelijke werkzaamheden gaan volgens de huidige planning in het voorjaar 2019 van start. De openstelling van de Hogering is voorzien in 2022.

Momenteel ligt het bestemmingsplan Hoofdwegen Almere ter inzage, waarin de verbreding van de Hogering Almere planologisch mogelijk wordt gemaakt. Indien geen beroep en bezwaar wordt aangetekend tegen het bestemmingsplan, dan kunnen de werkzaamheden conform planning worden uitgevoerd.

Als afronding van de aansluiting van de A6 op de Hogering, is Rijkswaterstaat momenteel bezig met de herinrichting van de kruising Hogering/Elementendreef en het opleveren van een geluidsscherm bij de kruising Hogering/Herman Gorterweg. Deze afrondende werkzaamheden zijn uiterlijk in augustus van 2018 gereed.

Verder is de gemeente Almere bezig met de voorbereiding van het ombouwen van de Botterweg. Deze weg wordt in 2019 vervangen door de Godendreef door te trekken en rechtstreeks te laten aansluiten op de Hogering.

Financiën

Budget	Raming
€ 54,2 miljoen (prijspeil 2017)	€ 52,7 miljoen (raming definitief ontwerp)
In het PMIRT is het projectbudget vastgesteld op € 54,2, dit wordt jaarlijks geïndexeerd. De raming is geactualiseerd en probabilistisch doorgerekend voor het Definitief Ontwerp dat is opgesteld voor de aanbesteding. Deze raming komt uit op een bedrag van € 52,7 miljoen. Eind augustus van dit jaar is naar verwachting de aanbesteding afgerond. Dan is bekend voor welk bedrag het werk gegund wordt aan een aannemer.	

Toprisico's

Toprisico's	Beheersmaatregelen
Veranderende markt (marktwerking)	- Toetsing op de raming - Aanvullend budget aanvragen - Nieuwe aanbesteding doen
De klanteisen zijn niet of niet juist verwerkt in de vraagspecificatie	- Klanteisenspecificatie integraal beoordelen - Stakeholders vragen om klanteisen te accorderen - Referentieontwerp laten opstellen t.b.v. aanbesteding
Bestemmingsplan niet tijdig gereed	- Belanghebbende bewoners proactief informeren over hogere grenswaarde geluid - Gemeente Almere faciliteren bij inspraakprocedure - Actuele stakeholdersanalyse
Onvoldoende actuele gegevens huidige situatie	- Referentieontwerp intern toetsen - Eisen zo veel mogelijk baseren op bestaande (provinciale) richtlijnen - Interne afstemming over werkproces
Relatie met Almere komt onder druk te staan	- Liaison bij gemeente Almere - Voortgang project actief delen met stuurgroep Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA) - Heldere afspraken over rolverdeling en risicoverdeling tussen partners SBA

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Voortgang bewaken.

Externe Communicatie

Tijdens de terinzagelegging van 31 mei tot en met 11 juli 2018 van het bestemmingsplan Hoofdwegen Almere (waarvan de Hogering onderdeel is) wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners waar ook de plannen voor de verbreiding van de Hogering worden toegelicht. In het najaar van 2018, nadat de aanbesteding is afgerond, zal in samenspraak met de aannemer die de verbreiding van de Hogering gaat uitvoeren, een uitgebreide informatiecampaagne van start gaan over de hinder die bewoners, weggebruikers en bedrijven gaan ondervinden van de uitvoeringswerkzaamheden in de periode 2019-2022. Stakeholders en belanghebbenden zullen tijdens de uitvoering van het project worden geïnformeerd over de voortgang, door inzet van communicatiemiddelen als een digitale nieuwsbrief, website, social media en publieksevenementen (Dag van de Bouw). Voor communicatie over verkeershinder gedurende de uitvoering worden de reguliere kanalen van de provincie Flevoland gebruikt. In het najaar wordt samen met de aannemer een concrete communicatie-uitwerking opgesteld waarin ook wordt geïdentificeerd of voor bepaalde doelgroepen specifieke communicatie-inzet nodig is. Sowieso zal onderscheid worden gemaakt in de communicatie met bewoners en bedrijven in Almere Poort en bewoners en bedrijven in Almere-Stad, omdat de impact van de werkzaamheden aan de Hogering voor beide stadsdelen behoorlijk van elkaar verschilt.

COLOFON

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 – 26 52 65
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Juni 2018
eDocs #2247904
