



Onderwerp
Voortgangsrapportage Passage Dronten.

Kern mededeling:
Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote Infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.

Mededeling:
Hierbij treft u van de Passage Dronten de tweede voortgangsrapportage aan. De voortgangsrapportage is bedoeld om Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de grote projecten van de afdeling Infrastructuur.

Bijlagen		
Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
16135 Voortgangsrapportage passage Dronten	1978284	ja

Ter inzage in de leeskamer		
Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Registratienummer
1978263
Datum
13 oktober 2016
Auteur
ing. M.C.J. Klaver
Afdeling/Bureau
INFRA

Openbaarheid
Passief openbaar

Portefeuillehouder
Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



VOORTGANGSRAPPORTAGE

OKTOBER 2016

N307 Passage Dronten



INLEIDING

De realisatie van de “N307 Passage Dronten” maakt deel uit van de ambitie van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om te komen tot de aanleg van de N23 van Alkmaar tot Zwolle. In 2013 hebben de gemeente Dronten en de provincie Flevoland een convenant gesloten om de realisatie van de Passage Dronten te versnellen.

Door de aanleg van de Passage Dronten kan het doorgaand verkeer tussen de rotonde Overijsselseweg/ Dronterringweg en de rotonde Hanzeweg/Dronterringweg gebruik maken van een 100 kilometer autoweg, terwijl de bestaande Dronterringweg op dat tracé gaat functioneren als ontsluitingsweg voor de noord-zijde van de kern Dronten.

Overzichtskaart




Kenmerken

Kenmerken N307 “Passage Dronten”

- Vanaf de rotonde Overijsselseweg tot aan de rotonde Hanzeweg nieuwe autoweg (100 km/u) met 1x2 rijstroken voor doorgaand verkeer;
- Bestaande Dronterringweg blijft gehandhaafd als 80 kilometer weg voor de ontsluiting van Dronten;
- Landbouwverkeer wordt afgewikkeld via Dronterringweg, zodoende gescheiden van doorgaand verkeer;
- Ongelijkvloerse kruisingen met de Rendierweg en de Colijnweg, het verkeer van beide zijwegen gaat onder de Passage Dronten door;
- Een vaste brug over de Lage Vaart;

Waar staan we

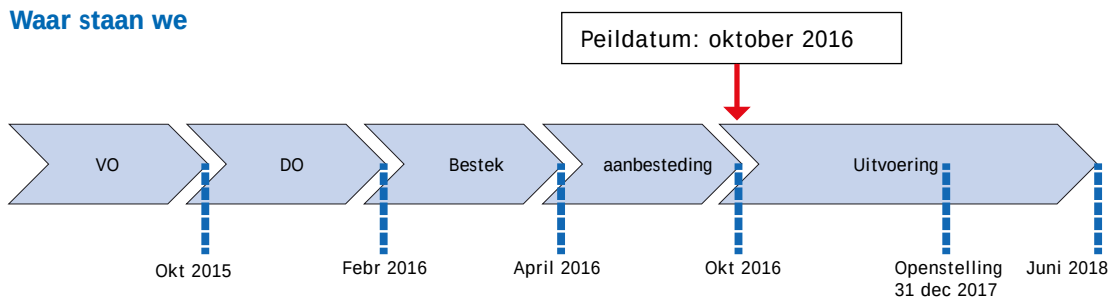

In 2015 is de planning van het project Passage Dronten aangepast. Oorspronkelijk zou de nieuwe weg eind 2016 gereed komen, dit is aangepast naar eind 2017 voor de openstelling en voor de gehele oplevering juni 2018.

De aanbestedingsprocedure is gestart en zal in de 1e helft van november met de definitieve gunning afgerond zijn.



Financiën

Krediet	Raming na aanbesteding
€ 10.200.000,= PMIRT	€ 12.970.000,=
Door een lagere inschrijving van de aannemer is het benodigde krediet met € 330.000,= afgenomen. Het ontstane tekort van nu nog € 2.770.000,= zal binnen het pMIRT programma opgevangen worden.	

Toprisico

Toprisico	Beheersmaatregelen
Geotechnische gesteldheid ondergrond waardoor restzettingseis niet wordt gehaald binnen gestelde termijn.	Monitoring door marktpartij. Periodieke rapportage naar opdrachtgever.
Verlegging kabels en leidingen zijn niet op tijd gereed of passen niet qua planning in die van de opdrachtnemer.	Nutsbeheerders aan afspraken bij het verzoek tot verlegging houden. Na opdracht afstemmingsoverleg met nutsbedrijven initiëren.
Planning wordt niet gerealiseerd door de opdrachtnemer.	Door de provincie scherp sturen op de uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer en daarbij snel inspringen op wijzigingen.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

- Voortgang bewaken via voortgangsrapportages

Externe communicatie

- Met stakeholders als gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland is regelmatig overleg.
- Na aanbesteding is een brede informatiebijeenkomst voor de inwoners van Dronten voorzien, waarin de uitvoeringswerkzaamheden centraal zullen staan.
- Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld met als doel de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.



Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Oktober 2016
