



Onderwerp

IFA - halfjaarrapportage 2014

Doel van deze mededeling:

Deze mededeling heeft als doel Provinciale Staten te informeren over het vastgestelde halfjaarverslag 2014 Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA).

Toezegging/motie/amendement:

Naar aanleiding van opinieronde 2 d.d. 15 mei 2013 agendapunt "Verslagen IFA" (zie betreffende besluitenlijst met e-docs nummer 1495259), is aan Provinciale Staten de toezegging gedaan de agendering van de IFA-(half)jaarverslagen voor de Commissie Bestuur & Samenleving (oordeelsvormend) voor te leggen aan het presidium.

Inleiding:

Provinciale Staten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaar- en een jaar-rapportages. Naast de jaar- en halfjaarrapportages wordt PS tweemaal per jaar geïnformeerd op programmaniveau middels de P&C-cyclus (perspectief- en zomernota).

De voorliggende rapportage betreft de IFA-halfjaarrapportage 2014.

Mededeling:

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2014 aan. Gedeputeerde Staten hebben deze halfjaarrapportage op 23 september 2014 conform vastgesteld (besluit met e-docs nummer 1636193). Deze halfjaarrapportage is ook besproken door het College van de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de Gemeenteraad.

In de voorliggende halfjaarrapportage wordt aandacht besteed aan de voortgang van de diverse projecten en projectideeën. De financiële voortgang en de voortgang op programmaniveau wordt niet beschreven in de voorliggende halfjaarrapportage maar zal in de jaarrapportage 2014 worden beschreven.

Het vervolg

In het voorjaar van 2015 zal de IFA-jaarrapportage 2014 worden opgesteld.

Ter inzage in de leeskamer

n.v.t.

Verdere informatie

IFA-halfjaarrapportage 2014 (e-docs nummer 1634790)

Registratienummer

1636187

Datum

23 september 2014

Auteur

S.R. Dijkstra

Afdeling/Bureau

CP-IFA

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Verbeek, L.


Ter kennisname aan PS en
burgerleden



HALFJAARRAPPORTAGE 2014

OKTOBER 2014

Investeringsprogramma Flevoland - Almere

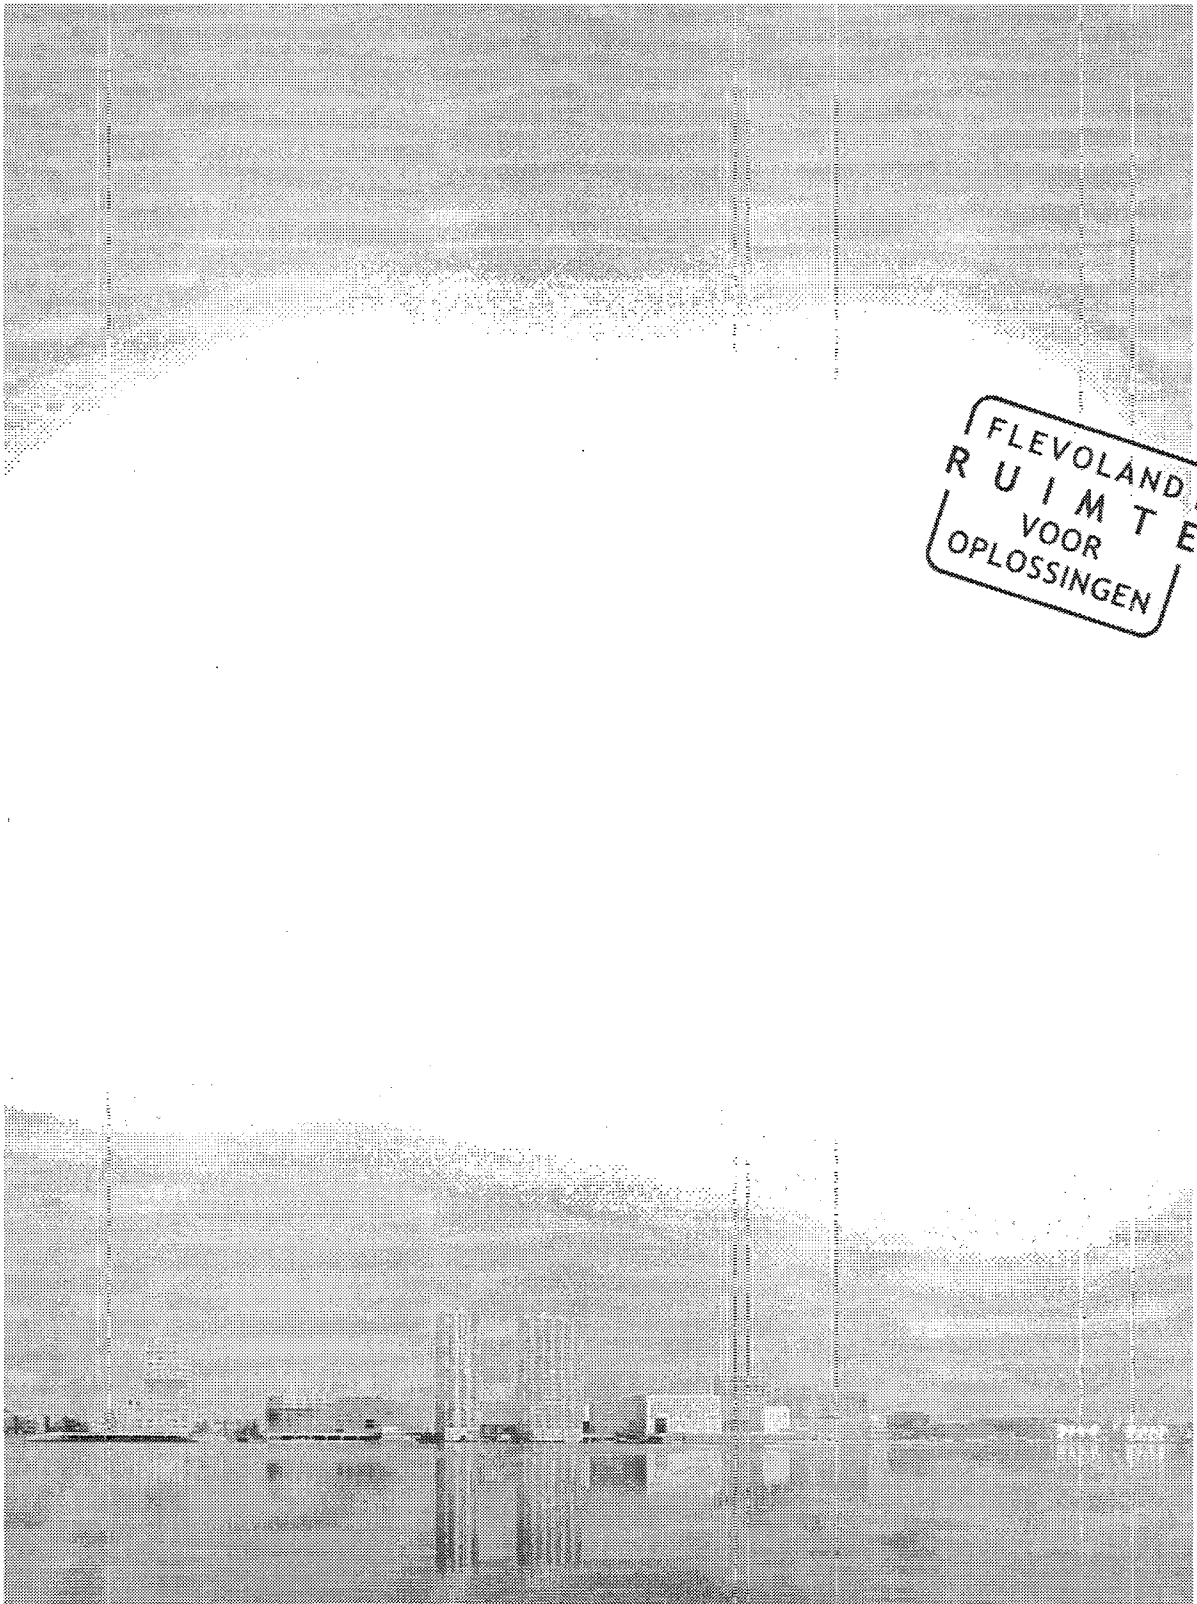

FLEVOLAND
R U I M T E
V O O R
O P L O S S I N G E N

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

1.1 Aanleiding	3
1.2 Doel	3
1.3 Samenvatting	3

2. Het IFA-programma

2.1 De IFA-tranches	4
2.2 IFA1	4
2.3 IFA2	5
2.4 IFA3 - Almere 2.0	5
2.5 Cluster Floriade	6

3. Voortgang projecten

3.1 IFA1-projecten	7
3.1.1 CAH	7
3.1.2 INTI	8
3.1.3 Windesheim	9
3.1.4 Onderdoorgang A6	10
3.2 IFA2-projecten	11
3.2.1 Boshart Almeerderhout	11
3.2.2 Bidbook Floriade	12
3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0	12
3.2.4 Zorgcentrum Reedewaard	12
3.3 Projectinitiatieven en projectideeën	13
3.3.1 Almere Kenniscentrum Talent	14
3.3.2 Hectare Cultuur	14
3.3.3 Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere	14

BIJLAGEN

Bijlage A Subsidieverleningsproces IFA



1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Gedeputeerde Staten (GS) hebben Provinciale Staten (PS) de toezegging gedaan twee maal per jaar te rapporteren over de stand van zaken van de voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Via de reguliere P&C-cyclus wordt PS op programmaniveau geïnformeerd. Daarnaast wordt PS twee keer per jaar door middel van een halfjaar- en een jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de halfjaarrapportage 2014. Deze halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van het IFA-programma tot medio 2014 op projectniveau.

De laatste keer dat PS is geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma is op 22 april 2014 geweest (mededeling met e-docs nummer 1589078) met de jaarrapportage 2013. In het voorjaar van 2015 zal de jaarrapportage 2014 worden opgesteld. Deze jaarrapportage zal uitgebreider zijn dan de voorliggende halfjaarrapportage en bevat naast (financiële) voortgang op projectniveau ook informatie over de (financiële) voortgang op programmaniveau en de realisatie van de IFA-doelstellingen.

1.2 Doel

Met deze rapportage informeren de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Almere (B&W) en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (GS) de gemeenteraad en PS over de voortgang van IFA.

1.3 Samenvatting

IFA1

De eerste tranche van het IFA-programma (IFA1) is in de eerste helft van 2014 definitief afgerekend met de gemeente Almere. Een aantal projecten die rechtstreeks door de Provincie is beschikt, is nog in uitvoering.

IFA2

Uit de tweede tranche van IFA (IFA2) zijn de volgende bedragen beschikt:

Omschrijving	€
Diverse projecten	14.767.000
Procesgeld	350.000
Floriade 2022 (geoormerkt)	10.000.000
Totaal	25.117.000

Per 1 juli 2014 is dus ruim € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten en procesgeld uit IFA2, wat neerkomt op circa 76% van de € 33 miljoen dat tot en met 2015 voor IFA2 is geprogrammeerd. Tot en met 2015 resteert derhalve nog een budget van circa € 7,9 miljoen (€ 33 - € 25,1).

In de eerste helft van 2014 zijn 2 subsidieaanvragen gehonoreerd, te weten Reedewaard en Onderdoorgang A6. De onderdoorgang A6 zal worden gefinancierd met middelen uit IFA1. Het totaal van IFA2-projecten komt daarmee op 4:

- Boshart Almeerderhout
- Bidbook Floriade (afgerond)
- Jan van Es Instituut 2.0
- Reedewaard

Er zijn 2 projectideeën in de fase van uitwerking tot een subsidieaanvraag:

- Almere Kenniscentrum Talent
- Hectare Cultuur

Tot slot is 1 projectinitiatief uitgewerkt tot een projectidee, welke in het najaar van 2014 aan PS zal worden voorgelegd:

- Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere

IFA3

De middelen die geprogrammeerd staan voor de derde tranche van het IFA-programma (IFA3) zullen, samen met de € 10 miljoen welke binnen IFA2 is geoormerkt voor de Floriade 2022, overgaan naar het programma Almere 2.0. De middelen zullen worden gestort in het Fonds Verstedelijking Almere, waarvan de gemeente Almere de beheerder wordt.

2. HET IFA-PROGRAMMA

2.1 De IFA-tranches

Het totale IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een budget van € 100 miljoen. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 miljoen af geraamd. Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 miljoen, dat over drie tranches is verdeeld:

- € 35 miljoen voor de periode 2006 - 2010 (IFA1)
- € 33 miljoen voor de periode 2011 - 2015 (IFA2)
- € 21 miljoen voor de periode 2016 - 2020 (IFA3)

De eerste tranche van IFA (IFA1) is inmiddels afgerond, maar een paar projecten lopen nog door in de periode van de tweede tranche. Het gaat hier om de projecten CAH en INTI en (het fonds) Hogeschool Windesheim, alsmede Onderdoorgang A6. De voortgang van deze projecten wordt in hoofdstuk 3 beschreven.

De IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten zijn in de eerste helft van 2014 formeel afgesloten met een definitieve vaststelling.

Voor de tweede tranche van IFA (IFA2) zijn twee programmalijnen vastgesteld:

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
2. Versterking voorzieningestructuur

De andere drie programmalijnen uit het IFA convenant, te weten 'Versterking economische structuur', 'Kwaliteitsslag Groen-Blauwe stad' en 'Infrastructurele Knelpunten', zijn niet opengesteld binnen IFA2.

Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen kunnen worden ingediend:

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterking aanbod Sport
4. Versterking aanbod Leisure
5. Versterking aanbod Zorg

Het programmamanagement en de uitvoering van het IFA-programma is belegd bij de provincie, respectievelijk bij de afdeling Concernprogramma's en de afdeling Programma Management Europa. Bijlage A geeft naast een schematische weergave van het proces van subsidieverlening ook een beknopt uittreksel van het vastgestelde IFA2-programma, inclusief de inhoudelijke beoordelingscriteria.

2.2 IFA1

Het budget dat voor IFA1 is geprogrammeerd bedraagt € 35 miljoen. Van dit budget is € 125.000 besteed aan proceskosten. Voor IFA1-projecten is dus circa € 34,9 miljoen beschikbaar.

Begin 2014 heeft de provincie IFA1 definitief afgerekend met de gemeente Almere (GS-nota d.d. 13 mei 2014 met e-docs nummer 1608565). De laatste betaling, zijnde € 1.731.215, is inmiddels aan de gemeente Almere gedaan, waarmee een mijlpaal is bereikt in de afronding van IFA1.

Binnen IFA1 zijn de volgende projecten definitief vastgesteld.

<i>IFA1 projecten (afgerond)</i>	<i>vastgesteld (€)</i>
Almere Kennisstad/Innovatiefonds	4.721.685
Almere Kennisstad/Exser	1.393.836
Almere Kennisstad/Alan Turing Institute	1.837.369
World Trade Center Almere Association	2.807.028
Almere Health City	2.950.156
INTI (eerste beschikking)	2.343.453
Oostkavels	2.965.363
Groen Blauw ¹⁾	700.000
Totaal	19.718.890

¹⁾ Uitvoering en betaling via de gemeente Zeewolde

In de "rapportage eerste fase IFA 2006 - 2011" zijn de bovenstaande IFA1-projecten op inhoud beschreven (e-docs nummer 1458005).

Daarnaast zijn de IFA-projecten lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen-leven van de CAH Vilentum (CAH) en de tweede beschikking aan International New Town Institute (INTI) niet beschikt via de gemeente Almere, maar rechtstreeks beschikt door de provincie. Voor het project Windesheim is € 11 miljoen aan IFA1-middelen (en € 9,117 miljoen aan IFA2-middelen) gestort in een fonds dat door de gemeente Almere wordt beheerd (verantwoording over de voortgang van het fonds is opgenomen in de jaarrekening van gemeente Almere, toelichting op de balans). Voor het project Onderdoorgang A6 zullen nadere afspraken worden gemaakt binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere fase 1A.

<i>IFA1 projecten (lopend)</i>	<i>beschikt (€)</i>	<i>betaald (€)</i>
CAH	500.000	346.976
INTI	1.000.000	986.736
Windesheim	11.000.000	11.000.000
Onderdoorgang A6	2.500.000	0
Totaal	15.000.000	12.333.712

De voortgang van deze projecten staat beschreven in paragraaf 3.1.

De resterende IFA1-middelen van circa € 0,2 miljoen (34,9 -/- 19,7 -/- 15 = 0,2) blijven conform vigerend beleid beschikbaar binnen de IFA-reserve.

2.3 IFA2

Van het budget dat voor IFA2 is geprogrammeerd (€ 33 miljoen), is circa € 15,1 miljoen beschikt (inclusief € 350.000 beschikte proceskosten). Van dit bedrag is bijna € 12 miljoen betaald. Verder is een budget van € 10 miljoen geormerkt voor projecten voor de Floriade 2022. Tot en met 2015 resteert derhalve nog een budget van circa € 7,9 miljoen (€ 33 - € 15,1 - € 10).

<i>IFA2 projecten</i>	<i>beschikt (€)</i>	<i>betaald (€)</i>
Windesheim	9.117.000	9.117.000
Boshart Almeerderhout	2.500.000	479.279
Bidbook Floriade (afgerond)	300.000	251.757
Jan van Es Instituut 2.0	600.000	540.000
Reedewaard ¹⁾	2.250.000	1.530.000
Subtotaal	14.767.000	11.918.036
Proceskosten	350.000	1.639
Subtotaal incl. projectkosten	15.117.000	11.919.675
Geormerkt voor Floriade 2022	10.000.000	0
Totaal	25.117.000	11.919.675

¹⁾ De bijdrage voor het project Reedewaard bestaat uit een subsidie van € 300.000 en een achtergestelde lening van € 1.950.000, welke is geormerkt binnen de reserve IFA (conform GS-nota met e-docs nummer 1603605). Overeenkomstig het besluit zullen de binnen de programmaperiode ontvangen rente en aflossing (naar verwachting resp. € 550.000 en € 500.000) weer opnieuw beschikbaar komen voor het IFA-programma. Over de inzet van de rente en aflossing die na afloop van het programma worden ontvangen (naar verwachting resp. € 400.000 en € 1,45 miljoen) zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

2.4 IFA3 - Almere 2.0

Het budget dat voor IFA3 is geprogrammeerd bedraagt € 21 miljoen. Op 28 mei 2014 (PS-voorstel met e-docs nummer 1572473) heeft PS ingestemd met het programma Almere 2.0 en de provinciale bijdrage voor dit programma te bekostigen met IFA-middelen, te weten:

<i>Herkomst middelen</i>	<i>€</i>
Restant middelen IFA1	p.m.
Geormerkt voor Floriade 2022	10.000.000
Geprogrammeerde middelen voor IFA3	21.000.000
Totaal	31.000.000

De middelen zullen, samen met de middelen van de gemeente Almere en het Rijk, gestort worden in het Fonds Verstedelijking Almere, welke door de gemeente Almere zal worden beheerd. Voor de periode na 2020 zullen nadere afspraken worden gemaakt op basis van de ontwikkelingen in het provinciefonds. Afsproken is dat

jaarlijks vóór 1 augustus een jaarprogramma en een meerjarenprogramma wordt opgesteld. Vaststelling vindt plaats door het bestuurlijk Overleg Almere 2.0 na instemming van PS en de Raad. De benodigde middelen zullen jaarlijks in het Fonds Verstedelijking Almere worden gestort, op basis van het vastgestelde jaarprogramma.


Bovenstaande betekent dat het IFA-programma na uitvoering van IFA2 zal eindigen. De laatste IFA2-projecten kunnen nog in 2015 worden beschikt. De afronding en vervolgens de definitieve vaststelling van de projecten zal in 2017/2018 plaatsvinden. In 2014 zal een laatste tussentijdse evaluatie van het IFA-programma worden uitgevoerd. Hierover zal in het IFA-jaarverslag 2014 worden gerapporteerd.

2.5 Cluster Floriade

In 2012 is het organiseren van de Floriade in 2022 toegewezen aan de gemeente Almere. Voor het opstellen van het bidbook is door de provincie een bijdrage van ruim € 250.000 geleverd uit IFA2-middelen. Dit project is inmiddels afgerond, zoals ook staat beschreven in paragraaf 3.2.2.

Daarnaast heeft PS op 16 januari 2013 ingestemd met het oormerken van € 10 miljoen aan IFA2-middelen voor projecten voor de Floriade 2022. PS heeft ingestemd met de volgende redeneerlijnen:

- De provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheerschap;
- De provincie faciliteert een kennis- en innovatieplatform dat innovaties tot stand brengt en in 'proeftuin Flevoland' uittest en valoriseert;
- Overeenkomstig de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 werken de provincie en de gemeente Almere een gezamenlijk economisch programma 'Floriade Werkt!' uit langs vier thema's (Feeding, Greening, Energizing en Healthyng the City).

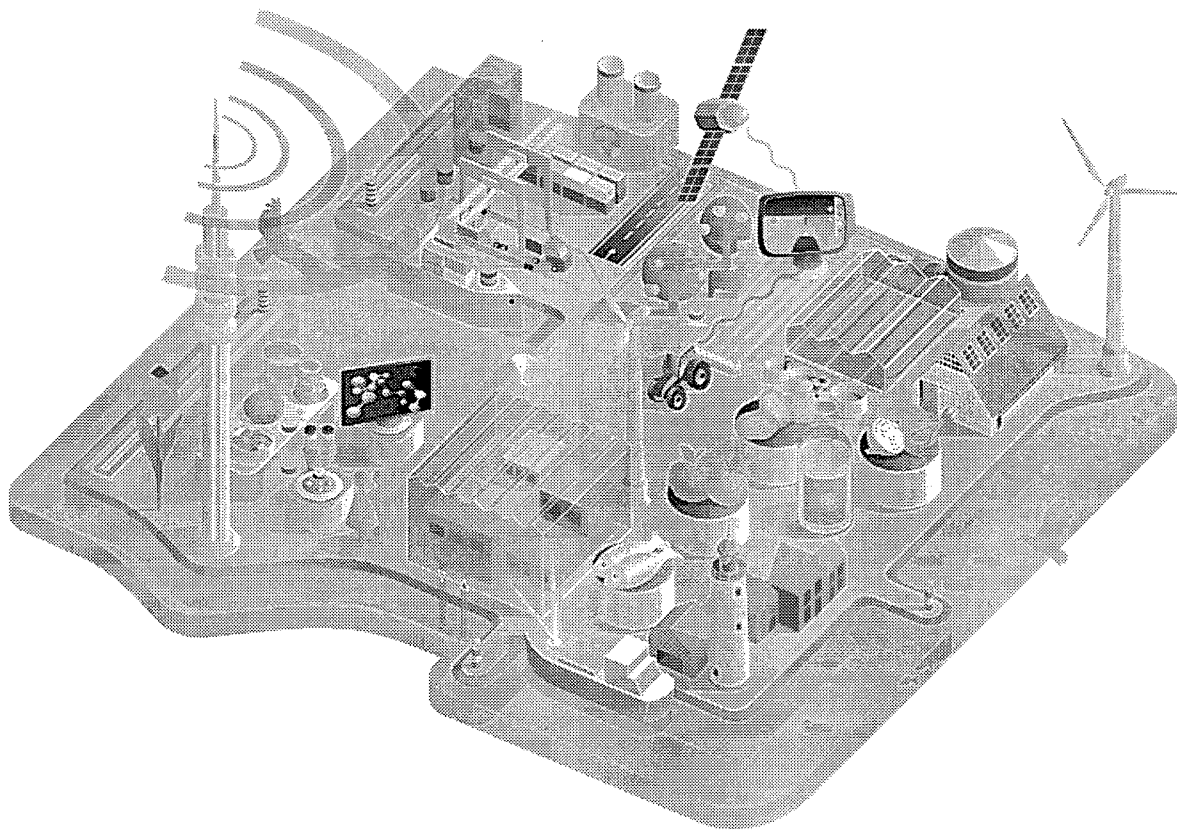

3. VOORTGANG PROJECTEN

3.1 IFA1-projecten

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 heeft de provincie alle IFA1-projecten die beschikt waren via de gemeente Almere, begin 2014 definitief afgerekend met de gemeente Almere.

Nog lopende IFA1-projecten zijn:

- CAH
- INTI (2^e beschikking)
- Windesheim
- Onderdoorgang A6

3.1.1 CAH

Inhoud

Met behulp van een IFA-bijdrage is de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) in Almere in 2011 gestart met het lectoraat "Natuurlijk en Gezond Samen-Leven". In samenwerking met andere hogescholen en universiteiten wordt onderzoek gedaan in het zogenaamde groene kennisdomein. Het lectoraat heeft als onderzoeksoopdracht het ontwikkelen en valoriseren van kennis betreffende de relatie tussen de gezondheid van de mens en de leefomgeving (natuur, dieren, planten).

Heeft het project in haar eerste jaren vooral in het teken gestaan van de opstart van het lectoraat, in 2013 is er vooral sprake geweest van intensiveren en uitbouwen van het in die eerste jaren verworven netwerk. Doel daarbij is steeds met partners tot samenwerking te komen die tot kennisontwikkeling en kennisvalorisatie leidt. Hiermee wordt innovatie in het bedrijfsleven of bij instellingen (bijvoorbeeld in de zorg) gestimuleerd en studenten werken aan concrete praktijkcases, waardoor het hoger onderwijs wordt versterkt. De groei van CAH en het feit dat er in 2013 voor het eerst ook 4e jaar studenten zijn die kunnen participeren in externe opdrachten, dragen daaraan zeker bij. Voorbeelden van gerealiseerde activiteiten met studenten voor partners in de afgelopen periode zijn:

- Het realiseren van een schoolmoestuin voor basisonderwijs Dronten, uitdragen van verworven kennis hierover naar Almere;
- Het ontwikkelen van een vernieuwde, gezonde buitenruimte voor zorgcomplex De Toonladder te Almere.
- Ontwerp van een belevingstuin voor dementerende ouderen voor Woonzorg Flevoland.
- Onderzoek naar leereffect van het in 2013 afgeronde NME-arrangement Groen en Gezond.
- Ontwikkelen van een concept voor groene daken dat bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit in de stad.
- Stadsakker Stedenwijk, onderzoek naar leereffecten in NME-arrangement.

De projectkosten bedragen € 950.000, waarvan € 500.000 is gedekt door IFA-middelen.

Realisatie

Het lectoraat Natuurlijk Gezond Samen-Leven is dit voorjaar al weer zijn 4^e jaar in gegaan. Daar waar er in 2013 vooral sprake is geweest van intensiveren en uitbouwen van het in de eerste jaren verworven netwerk, is de keus gemaakt niet verder in nieuwe contacten te investeren. In de eerste helft van 2014 was de focus vooral gericht op het onderzoeken van kansen en mogelijkheden voor samenwerking met partners ná 2014, dus na afloop van de financieringsperiode in het kader van IFA. Het doel van het lectoraat blijft nog steeds kennisontwikkeling en kennisvalorisatie, waarmee innovatie in bedrijfsleven of instellingen (bijvoorbeeld in de zorg) wordt gestimuleerd en waarbij studenten werken aan concrete praktijkcases en het hoger onderwijs wordt versterkt. Dit heeft tot de volgende initiatieven geleid die ook ná 2014 worden voortgezet.

- Vormen van een netwerk van instellingen die gezamenlijk (in wisselende samenstelling) bijdragen aan het DuurzaamDoor programma van de Provincie Flevoland. In januari is een project gestart met Centrum Biologische Landbouw, WUR-PPO en IVN Flevoland, in najaar 2014 zal een project starten met Landschapsbeheer Flevoland, Natuur en Milieu Federatie Flevoland en IVN Flevoland.
- Samenwerking met Centre of Expertise Food van de Hogere Agrarische Scholen. Dit is een door het Ministerie van EZ gefinancierd stimuleringsprogramma voor publiek-private samenwerking en loopt van 2014-2017. Inmiddels zijn drie projecten, samen met het regionale bedrijfsleven en instellingen, gestart met een omvang van ca. € 350.000.
- Intensiveren van de betrokkenheid van het lectoraat bij opleidingen, met name bij de opleiding Voeding en Gezondheid. Deze opleiding is in september 2013 gestart met 12 studenten. Mede door een krachtige en duidelijke positionering en werving zal er per september 2014 sprake zijn van een verdriedubbeling, namelijk 37 studenten.

- Realiseren van een Minor Interactie Mens - Natuur voor studenten van de Almeerse (en Drontense) opleidingen. De lector heeft vanaf februari 2014 een substantieel deel van het onderwijs in deze minor verzorgd.
- Het lectoraat zal na 2014 verder gaan als lectoraat “Groene en Vitale Stad” als onderdeel van het Kenniscentrum Groene en vitale Stad van de CAH Vilentum. De website van het kenniscentrum is ingericht en het lectoraat heeft daarin een plek gekregen (www.kcgroen.nl).
- In juni 2014 is een symposium “Stadsvee” georganiseerd, waaruit duidelijk behoefte bleek voor netwerkvorming. Het lectoraat zal dit in najaar 2014 verder oppakken en samen met het Ministerie van EL&I, LTO, twee stadsboeren en met de lector “Pluimvee” initiatieven nemen voor een vervolg.
- Met de Stichting “Entente Florale” is een projectvoorstel ingediend bij het Ministerie van EL&I en betreft de vraag op welke wijze gemeenten aandacht besteden aan het groenbeleid in de gemeente.
- Met verschillende afdelingen en ambtenaren van de gemeente Almere is gesproken over de relatie tussen het lectoraat, de Floriade en het thema Growing Green Cities. Dit heeft nog niet tot heel concrete activiteiten geleid, maar de verwachting is dat dit na 2014 zeker tot een veel intensievere samenwerking zal leiden.
- Het project “Verkenning Stadslandbouw” verloopt voorspoedig. De eerste tussenresultaten zullen door de lector worden gepresenteerd op het “International Horticulture Congress” in Brisbane, Australië (augustus 2014). De resultaten zullen bijdragen aan innovatie van het onderwijs en voor CAH Vilentum wordt daarmee de arbeidsmarkt-relevantie van de opleidingen versterkt.

Naast bovengenoemde activiteiten is de lector in 2014 regelmatig gevraagd als spreker of als externe deskundige. Hij heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een Ronde Tafel Gesprek van staatssecretaris Dijkema van het Ministerie van EL&I in het kader van de Natuurvisie. In juni bracht de lector een bezoek aan de Wereldvoedselorganisatie van de VN (de FAO in Rome) en sprak onder andere over de mogelijkheden voor samenwerking met de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO, mevr. Gerda Verburg.

3.1.2 INTI

Inhoud

Het International New Town Institute (INTI) heeft als doel “de ontwikkeling van een zelfstandig wetenschappelijk kennisinstituut op het gebied van nieuwe steden wereldwijd”. Daarnaast wil INTI zich ontwikkelen als kenniscentrum op het gebied van stedelijke ontwikkeling. INTI voert daartoe onder andere onderzoeken uit, gaat internationale samenwerkingsverbanden aan, voert adviesopdrachten uit en ontwikkelt onderwijs op HBO en WO niveau in samenwerking met de Windesheim en CAH.

Het project is in 2011 van start gegaan en is in oktober 2012 positief geëvalueerd door een externe partij. Naar aanleiding van deze evaluatie is de subsidieovereenkomst voortgezet t/m 2015.

De maximale IFA-bijdrage bedraagt € 1 miljoen en de totale projectkosten bedragen € 2,9 miljoen. De IFA-bijdrage wordt de laatste jaren sterk afgebouwd en INTI zal zich steeds verder verzelfstandigen.

Realisatie

De programma's in China en India zijn zeer succesvol geweest en worden daarom voortgezet in 2014. In Afrika (Nairobi en Kaapstad) zijn in 2013 nieuwe programma's opgestart die in de eerste helft van 2014 in uitvoering zijn genomen. Er is intensief gewerkt aan projecten in Kaapstad (in samenwerking met het Nederlands consulaat, Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Department of Design), in Nairobi (in samenwerking met de Universiteiten van Amsterdam en Groningen en de Hogeschool van Breda) en in Shenzhen (in samenwerking met de Gemeente Almere en Windesheim).

Daarnaast is vooral ook gewerkt aan projecten die in Nederland plaatsvinden. Zo wordt voor de gemeente Almere een Masterclass “Wie maakt de stad groen” georganiseerd, rond het thema partnership (samenwerking tussen burgers en bestuur). Ook werkt INTI mee aan het Jaar van de Ruimte 2015, waarin Nederland wordt opgeroepen mee te denken over de ruimtelijke inrichting van het land, dat o.a. door het Planbureau voor de Leefomgeving is geïnitieerd. INTI initieert ‘De Vinexmensen’, één van de 3 communities die in het kader van het Jaar voor de Ruimte is opgericht. Belangrijk is ook het project Oog voor de Buurt in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester, een herwaardingsproject ten behoeve van de groeikernen Almere, Lelystad en Spijkenisse.

Naast de professionele en studenten uitwisselingen zijn (inter)nationale onderwijsprogramma's met betrekking tot New Towns georganiseerd in samenwerking met het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), Windesheim en TU Delft.

Met de Floriade organisatie wordt intensief samengewerkt op het vlak van de internationale duurzame netwerken: INTI participeert in de Denktank Floriade dat werkt aan de opbouw van de internationale netwerken.

Het Informatiecentrum Making Almere / Growing Green Cities is tegenwoordig gevestigd in de Schouwburg Almere.

In de overeenkomst is voor 2014 een verwachte omzet opgenomen van € 525.000. In de eerste helft van 2014 is reed voor € 456.199 toegezegd door derden voor de uitvoering van projecten. De verwachting is dat de begrote omzet voor 2014 gehaald zal worden.

3.1.3 Windesheim

Inhoud

De komst van Hogeschool Windesheim (Windesheim) in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en provincie Flevoland te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-bijdrage bedraagt € 20,117 miljoen waarvan € 11 miljoen is gefinancierd uit IFA1 en € 9,117 miljoen uit IFA2. De IFA-middelen (en overige middelen) zijn in een fonds gestort, dat door de gemeente Almere wordt beheerd.

<i>Middelen</i>	€
IFA1	9.117.000
IFA2	11.000.000
Rijk	37.000.000
Gemeente Almere	12.000.000
Gemeente Lelystad	3.000.000
<i>Totaal</i>	<i>72.117.000</i>

Van de bijdrage van het Rijk is € 10 miljoen rechtstreeks aan Windesheim betaald. In het fonds is op 31 december 2013 nog € 28.925.921 beschikbaar (exclusief Eigen Vermogen van € 7,3 miljoen bij Windesheim zelf). De stand van het fonds per eind 2014 volgens de begroting 2014 is € 22.189.629 (exclusief eigen vermogen van € 7,3 miljoen).

Realisatie

Voor het studiejaar 2013/2014 hadden zich 743 studenten ingeschreven voor één van de 20 hbo-opleidingen (waarvan 18 voltijds) en de studentenpopulatie kwam daarmee uit op 1627, waarvan ongeveer 2/3 uit Almere komt.

Het aantal aanmeldingen voor het studiejaar 2014/2015 bedraagt 979 studenten. Bedacht moet worden dat dit aanmeldingscijfers zijn en geen inschrijvingen. De Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs is per 2014 ingegaan, met als doel minder studie-uitval en minder switchen tussen studies (en dus sneller afstuderen). Dit houdt in dat de studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck en het recht op toelating tot een andere studie binnen de hogeschool. De definitieve aantallen inschrijvingen zullen per 1 oktober 2014 bekend zijn en er wordt rekening gehouden met afwijkingen. Hierover zal in het IFA-jaarverslag 2014 worden gerapporteerd.

Drie opleidingen kennen opvallend veel nieuwe aanmeldingen, te weten Informatica (Information Engineering), Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Leraar Basisonderwijs (Pabo). Vooral de groei van het aantal Pabo-studenten is opvallend, gezien de huidige arbeidsmarkt voor docenten. De opleiding Information Engineering is ook specifiek Flevolands.


Ten opzichte van vorig jaar zullen in het nieuwe studiejaar geen nieuwe voltijdsopleidingen worden aangeboden, maar wel worden voor de opleidingen logopedie, verpleegkunde en bouwkunde een zogenaamde Blended Learning variant ontwikkeld, een nieuw onderwijsconcept waarbij naast reguliere lessen ook onderwijs op afstand wordt gegeven. Hiermee geeft Windesheim onderwijs op maat en is de studie beter te combineren met een bijbaan. Ook het comakership (250 studenten) is uniek bij Windesheim. Het is een specifieke opdracht voor een student op hbo-niveau. Deze opdracht komt uit de praktijk, van en voor een organisatie. Studenten gaan aan de slag voor externe opdrachtgevers en leveren in enkele maanden op hbo-niveau diensten en producten op. Via comakerships worden de studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Het aantal lectoraten is uitgebreid tot vier. Nieuwe lectoren zijn geworven voor “robotica”, “leiderschap in onderwijs en opvoeding” en voor “nieuwe arbeidsverhoudingen”. Daarmee heeft elk cluster van opleidingen

van Windesheim Flevoland een directe verbinding met tenminste één lectoraat, naast uiteraard de verbinding met andere lectoraten in de kenniscentra van Windesheim.

In 2014 bouwt Windesheim voort op de koers die vorig jaar is ingezet richt zich opnieuw op het versterken van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, vergroting van de contractactiviteiten en versterking van de internationale positie van Windesheim. Dit alles in lijn met de ambities en doelstellingen die zijn afgeleid van het prestatieakkoord tussen Windesheim en de staatssecretaris van OCW.

Positief is dat de doorgevoerde maatregelen geleid hebben tot een aanzienlijke verbetering van de zogenaamde NSE score (NSE= nationale studenten enquête). De algemene tevredenheid bij Windesheim Flevoland is dit jaar gestegen naar 73%, drie van de vier studenten zijn (heel) tevreden over hun studie bij deze hogeschool. Voor een relatief jonge school een heel goede prestatie.

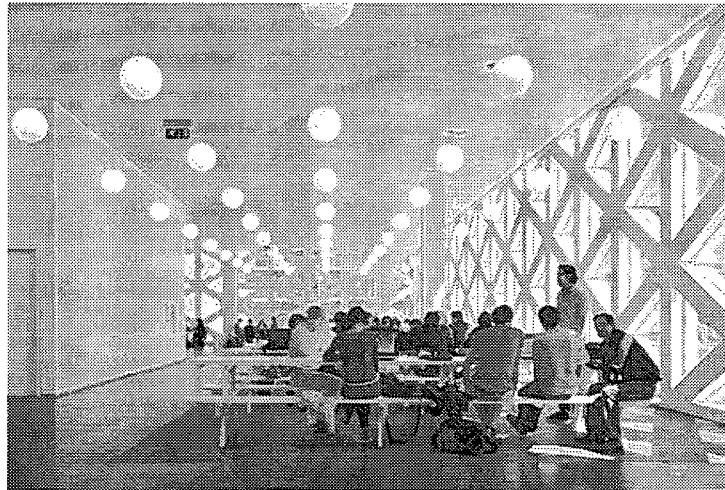

3.1.4 Onderdoorgang A6

Inhoud

De “Onderdoorgang A6” neemt een wat bijzondere plaats in. Het project past niet binnen de kaders van IFA2, maar wel binnen het IFA-convenant. Het project zal dan ook niet met IFA2-middelen worden gefinancierd, maar met middelen die in IFA1 niet zijn besteed.

Het project draagt bij aan:

- Versterking vestigingsklimaat van de provincie Flevoland;
- Verbetering van de bereikbaarheid via OV tussen Almere Stad en Almere Hout;
- Verbetering voor recreatief fietsen;
- Medegebruik als natuurpassage.

De verbreding van de A6 is evident van bovenregionale betekenis. Voldoende onderdoorgangen zijn randvoorwaardelijk in een dicht-stedelijk gebied. De verbreding van de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland attractiever als vestigingsplaats om te ondernemen en te wonen.

De totale investering zal circa € 7,6 miljoen bedragen, waarvan 1/3 gefinancierd met IFA-middelen. De overige financiering zal ingevuld worden door het Rijk en de gemeente Almere.

Stand van zaken

Begin 2014 heeft PS ingestemd met het projectidee Onderdoorgang A6. Bij de uitwerking van het projectidee naar projectaanvraag bleken er onduidelijkheden te bestaan over indexering, BTW-compensatie en projectrisico's (waar ligt het projectrisico).

Op 13 juni 2014 heeft GS ingestemd met een bijdrage uit IFA-middelen van maximaal € 2,1 miljoen en een bedrag van € 400.000 ter reserveren voor indexering. Op basis van de gemaakte afspraken vindt betaling plaats bij afronding van het project (naar verwachting in 2018).

Besloten is nadere afspraken te maken binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere Fase, waarbij de afspraken rondom de bijdrage van de verschillende partners en de uitvoering van het project worden geregeld. De verwachting is dat afspraken in de tweede helft van 2014 zullen worden geaccordeerd door de betrokken partijen.

3.2 IFA2-projecten

Tot en met medio 2014 zijn 5 projecten gehonoreerd in het kader van IFA2:

Project	Programmaliijn	Maatregel
Windesheim	1: Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek	1: Onderwijs
Boshart Almeerderhout	2: Versterking voorzieningenstructuur	4: Leisure
Bidbook Floriade	2: Versterking voorzieningenstructuur	4: Leisure
Jan van Es Instituut 2.0	2: Versterking voorzieningenstructuur	5: Zorg
Reedewaard	2: Versterking voorzieningenstructuur	5: Zorg

In maatregel 2 (Kunst en Cultuur) en 3 (Sport) zijn nog geen projecten gehonoreerd, maar voor beide maatregelen geldt dat er inmiddels wel projectideeën zijn die de goedkeuring van PS hebben gekregen (besluit d.d. 29 januari 2014). Deze projectideeën zijn in de eerste helft van 2014 nog niet uitgewerkt tot een subsidieaanvraag, maar de verwachting is dat dit in de tweede helft van 2014 zal gebeuren. De voortgang van deze beide projectideeën wordt beschreven in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2.

De voortgang van Windesheim is reeds in de vorige paragraaf beschreven. De voortgang van de overige projecten wordt in de onderstaande paragrafen beschreven.

3.2.1 Boshart Almeerderhout

Inhoud

Het doel van het project Boshart Almeerderhout (Boshart) is het verder ontwikkelen van het stadsbos tot een bovenregionale toeristisch-recreatieve voorziening. De activiteiten binnen het project richten zich op:

- Het versterken van de evenementenfunctie van het stadslandgoed De Kemphaan;
- Toevoegen van voorzieningen (zoals de aanleg van een speel- en wandelbos, een vierseizoenenroute en de centrale tuin);
- Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningen zoals horeca, een manege en een multifunctioneel gebouw;
- Opwaarderen van de centrale entree en verbeteren bereikbaarheid.

De totale projectkosten bedragen € 5,1 miljoen en er is een IFA-bijdrage toegekend van € 2,5 miljoen. Naast IFA-middelen is het project als volgt gefinancierd:

Middelen	€
Gemeente Almere	1.355.000
Staatsbosbeheer	1.100.000
Stichting Stad & Natuur	145.000
Totaal	€ 2.600.000

Realisatie

Toeristisch-recreatieve versterking:

- Versterking evenementenfunctie: het evenemententerrein is gereed, met uitzondering van een paar kleine aanpassingen;
- De bouw van het "Buitencentrum Almeerderhout" van Staatsbosbeheer is van start gegaan en de bouw verloopt voorspoedig. In mei is feestelijk stil gestaan bij het bereiken van het hoogste punt;
- De eerste fase van het speel- en wandelbos is gereed en de tweede fase is in voorbereiding. De start van de tweede fase staat gepland voor het vierde kwartaal van 2014;
- De visuele toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van Stichting AAP (apenopvang en quarantainegebouw) is met IFA-middelen verbeterd. Het project is geheel afgerond en ook het rondje AAP is nagenoeg gereed, op wat kleine aanpassingen na;
- De uitvoering van de vierseizoenenroute is van start gegaan. De verwachting is dat deze route gereed zal zijn in het eerste kwartaal van 2015;
- De planvorming van de centrale tuin is gestart.

Ontwikkellocaties:

- De acquisitie voor een ontwikkellocatie op Kemphaan en voor de manege zijn in volle gang. Eind 2014 zal hierover meer duidelijkheid bestaan.

Herkenbaarheid en bereikbaarheid:

- De aanpassing van het entreegebied is gereed;
- De selectie van de kunstenaar voor het ontwerp van een “landmark” is bijna afgerond;
- De aanpassing van de wegen is in voorbereiding en de uitvoering is gepland vanaf het laatste kwartaal 2014 (en heel 2015).

Marketing en communicatie:

- Er is een plan van aanpak “Toeristische Marketing en Promotie” in voorbereiding;
- De plannen en projecten van het Boshart Almeerderhout gepresenteerd op de Doe- en Kijkdag (tweede paasdag).

3.2.2 Bidbook Floriade

Het bidbook met als thema “Growing Green Cities” is in 2012 opgesteld. De inzet was succesvol: het organiseren van de Floriade 2022 is toegewezen aan de gemeente Almere. Het project is in 2013 definitief afgerekend waarbij de totale projectkosten zijn vastgesteld op € 576.986. De gerealiseerde projectkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot (begroot was € 685.995). Daarom is ook de IFA-bijdrage van € 251.757 lager vastgesteld dan was beschikt, zijnde € 300.000. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit project wordt verwezen naar de jaarrapportage 2012 (e-docs nummer 1486876).

3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0

Inhoud

Het Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0) ontwikkelt nieuwe concepten, methoden en instrumenten ten behoeve van de inrichting van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij richt het zich voornamelijk op de onderwerpen: populatiegerichte zorg, substitutie van zorg en aansluiting bij de behoefte van de patiënt/cliënt. Het JVEI 2.0 voert daartoe onderzoek uit, waaronder benchmarks.

Aan het project is een IFA-bijdrage toegekend van € 600.000. Met deze subsidie wordt beoogd het JVEI per 1 januari 2015 op eigen benen te laten staan.

Realisatie

Het JVEI 2.0 heeft de projecten zoals beschreven in het projectplan uitgevoerd en het project is als IFA-project afgerond. De eindafrekening met accountantsverklaring is ingediend bij de provincie en de verwachting is dat in de tweede helft van 2014 de laatste slotbetaling van € 60.000 zal worden gedaan.

Ten behoeve van het voortbestaan van het JVEI wordt gezocht naar een strategische partner om mee samen te werken. TNO Publiek en TNO bedrijven hebben uitgesproken dat zij de samensmelting van het JVEI 2.0 binnen de TNO-familie zeer toejuichen en ondersteunen. Momenteel wordt een onderneming- en businessplan geschreven om dit te realiseren. Hierover zal in de IFA-jaarrapportage 2014 worden gerapporteerd.

3.2.4 Reedewaard

Inhoud

Het project zorgcentrum “Reedewaard” valt binnen de programmalijn “Voorzieningenstructuur” en de maatregel “Versterken van aanbod zorg”.

Almere krijgt hiermee een regionale zorgvoorziening die er nu nog niet is, maar waar wel behoefte aan is.

Wonen en zorg zullen van elkaar worden gescheiden en hiermee wordt ingespeeld op de door het Rijk ingezette koers om zorg beter betaalbaar te houden.

Voorzieningen voor dementerende ouderen met een ZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in Flevoland, de wachtlijsten zijn langer dan 2 jaar en Flevoland is daarmee koploper van het land. Reedewaard biedt extra plaatsen zodat de druk op de wachtlijsten afneemt. Ook zal een verschuiving plaats vinden van het gebruik van zorg van buiten Flevoland naar zorg binnen Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevende ouderen in Flevoland kunnen blijven en dat ouders en grootouders op het “oude land” dicht bij kinderen in Flevoland kunnen komen wonen. Ook vanuit omringende gemeenten kunnen mensen er voor kiezen om in Reedewaard te gaan wonen.

Met het project zal ca. 40 fte directe werkgelegenheid worden gerealiseerd met name voor lager en middelbaar opgeleiden (receptie, verpleging, koks, schoonmakers etc.).

Daarnaast zal er ook sprake zijn van indirecte werkgelegenheid (lokale middenstand als leverancier) en er zullen stageplaatsen en onderzoeksmogelijkheden worden gerealiseerd voor ROC, HBO en WO. Er zijn reeds afspraken gemaakt met scholengemeenschap De Meergronden.

Realisatie

Aan het project is op 27 mei 2014 uit IFA-middelen een bijdrage toegekend van € 300.000 en een achtergestelde lening toegekend van € 1,95 miljoen (in 10 jaar terug te betalen) op een totale investering van € 5,5 miljoen. De Stichting Thuishaven (€ 3.150.000) en de gemeente Almere (€ 100.000) dragen in totaal € 3.250.000 bij. Van de lening is inmiddels € 1,5 miljoen overgemaakt door de provincie. Het restant zal in de tweede helft van 2014 worden overgemaakt.

Op 1 september jl. heeft de feestelijke start van de verbouwing in Almere Haven plaatsgevonden. De verwachting is dat de verbouwing in het voorjaar van 2015 zal zijn afgerond, waarna de eerste bewoners hun woningen kunnen betrekken.



3.3 Projectinitiatieven en projectideeën

Zoals in het stroomschema (Bijlage A) naar voren komt, bestaat het subsidieverleningsproces uit verschillende fases. De eerste fase is de initiatief fase en de tweede fase is de idee fase.

Op 29 januari 2014 zijn vier projectideeën voorgelegd aan PS en hebben alle projectideeën de toestemming gekregen om uitgewerkt te mogen worden tot een subsidieaanvraag. De subsidieaanvragen worden afgehandeld door het college van GS (zie ook Bijlage A) en de terugkoppeling naar PS geschiedt via de IFA-(half)jaarrapportages. Het betreft hier de projectideeën:

- Almere Kenniscentrum Talent
- Reedewaard
- Hectare Cultuur
- Onderdoorgang A6

Het projectidee Reedewaard is in de eerste helft van 2014 uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De subsidie is toegekend in de vorm van een achtergestelde lening. De stand van zaken van dit project is beschreven in paragraaf 3.2.4.

Het projectidee Onderdoorgang A6 is als subsidieaanvraag uitgewerkt in de vorm van een addendum op het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere fase 1A en de voortgang van dit project is beschreven in paragraaf 3.1.4.

De projectideeën Almere Kenniscentrum Talent en Hectare Cultuur zijn nog niet uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De voortgang van deze projectideeën worden in de onderstaande paragrafen beschreven. Naast bovengenoemde projectideeën is in de eerste helft van 2014 één projectinitiatief uitgewerkt tot een bestuurlijk gedragen projectidee. Het betreft hier het projectidee "Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere". De voortgang van dit projectidee wordt in paragraaf 3.3.3 van dit hoofdstuk beschreven.

3.3.1 Almere Kenniscentrum Talent (AKT)

Inhoud

Het AKT valt binnen de programmalijn “Voorzieningenstructuur” en de maatregel “Versterken van aanbod sport en leisure”.

Het AKT legt de verbinding tussen breedtesport en topsport. Binnen de sportpiramide zijn ‘talenten’ gesitueerd tussen de breedtesport (de basis) en de topsport (het topje). Voor beide groepen is in de samenleving veel aandacht, voor talentherkenning en -erkenning is dat een stuk minder. Het AKT maakt een goede verbinding tussen breedte- en topsport en positioneert het sporttalent.

Door dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies over de bewegingsvaardigheden en mogelijkheden van jonge sporters. Dit levert onder andere op:

- Vermindering van sportuitval;
- Verhoogde- en verduurzaamde sportparticipatie met positief maatschappelijke effecten als gezondheid, maatschappelijke vorming en sociale cohesie;
- ‘Op maat’ talentbegeleiding.

Door het project vindt kennisontwikkeling (én kennisvalorisatie) plaats m.b.t. sport, bewegen en talentontwikkeling. De kennis zal met onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld; Windesheim en de ROC-s worden gedeeld. De economische impact zal naast een lichte impact op werkgelegenheid vooral zichtbaar worden door positieve beïnvloeding van beeldvorming en gebiedspromotie. Het beeld van Almere als ‘stad van en voor Talent’ die herkend en erkend wordt, zal worden versterkt.

Het AKT is de eerste ‘omgeving’ in Nederland waar doelgericht naar beweegtalent gezocht zal worden en verder zal worden begeleid. Het unieke karakter van het AKT maakt dat een groot aantal partners waaronder de Rijksuniversiteit van Groningen, Hogeschool Arnhem - Nijmegen hun intentie tot deelname hebben uitgesproken. De totale investering zal ruim € 4 miljoen bedragen.

Stand van zaken

Er wordt er verder gewerkt aan het verbinden van partners (onderwijs en sport) en een gezonde exploitatie. De verwachting is dat in de tweede helft van 2014 meer duidelijkheid komt over de exploitatie en het indienen van een subsidieaanvraag. Hierover zal in de IFA-jaarrapportage 2014 worden gerapporteerd.

3.3.2 Hectare Cultuur

Inhoud

Het project Hectare Cultuur valt binnen de programmalijn “Voorzieningenstructuur” en de maatregel “Versterken van aanbod kunst & cultuur”.

Almere wil als 5de stad van Nederland plek hebben in de landelijke, culturele infrastructuur. Almere kenmerkt zich als jonge stad aan het geven van de eigen kleur aan haar stedelijke identiteit door:

- Met Hectare Cultuur te onderscheiden door op basis van wat de stad te bieden heeft invulling te geven aan podiumkunsten, educatie, beeldende kunst en architectuur
- Door de aandacht voor educatie te richten op talentontwikkeling tot aan kennisverdieping cultuurbreed aansluitend op wat Almere te bieden heeft
- Beeldende kunst en architectuur gebundeld aan te bieden aansluitend op de leefwereld van Almeerders.

De Hectare Cultuur draagt bij aan de versterking van de (economische en concurrentie) positie van Almere in (zuidelijk) Flevoland en de noordvleugel van de Randstad. Op dit moment vindt bijna 49% van de cultuurconsumptie van de Almeerse bevolking buiten Almere plaats. Doel van Hectare Cultuur is cultuur om de hoek te hebben. Door de randvoorwaarden voor spraakmakende activiteiten (w.o. exposities en evenementen) te realiseren, draagt Hectare Cultuur ook bij aan een belangrijke groei van bezoekers van buiten Almere. De totale investering zal ruim € 3 miljoen bedragen.

Stand van zaken

In de tweede helft van 2014 zal meer duidelijkheid komen over de uitwerking van het project en het indienen van een subsidieaanvraag.

3.3.3 Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere

Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere - De Innovatiefabriek (GWIA) is een fysiek en digitaal innovatiecentrum in Almere. Het centrum faciliteert regionale initiatieven gericht op directe waarde creatie

voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame samenwerkingsverbanden.

Dat gebeurt door onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. Het GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt fysieke research en innovatie faciliteiten. In het centrum wordt continue research en innovatie gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn.

De partners in het GWIA zijn Technology Centre Almere, Patiënt 1, het Gezondheid en Welzijn Innovatie Platform en TNO. Het GWIA werkt samen met Trimbos en de Universitaire Medische Centra (UMC).


Het GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete innovaties voor de zorg- en welzijnssector.

In de eerste helft van 2014 is het projectinitiatief uitgewerkt tot een bestuurlijk gedragen projectidee. In de tweede helft van 2014 zal het projectidee ter besluitvorming worden voorgelegd aan GS en PS. Bij een positief besluit van PS zal het projectidee verder worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag.¹⁾

De totale projectkosten bedragen € 11,8 miljoen en de gevraagde IFA-bijdrage bedraagt € 4,7 miljoen.

¹⁾ op 26 augustus heeft GS het projectidee vastgesteld. Het projectidee is geagendeerd op 8 oktober (beeldvormend) en 22 oktober (oordeelvormend) voor de statencommissie Bestuur & Samenleving

HET SUBSIDIEVERLENINGSproces
INVESTERINGSprogramma FLEVOLAND-ALMERE

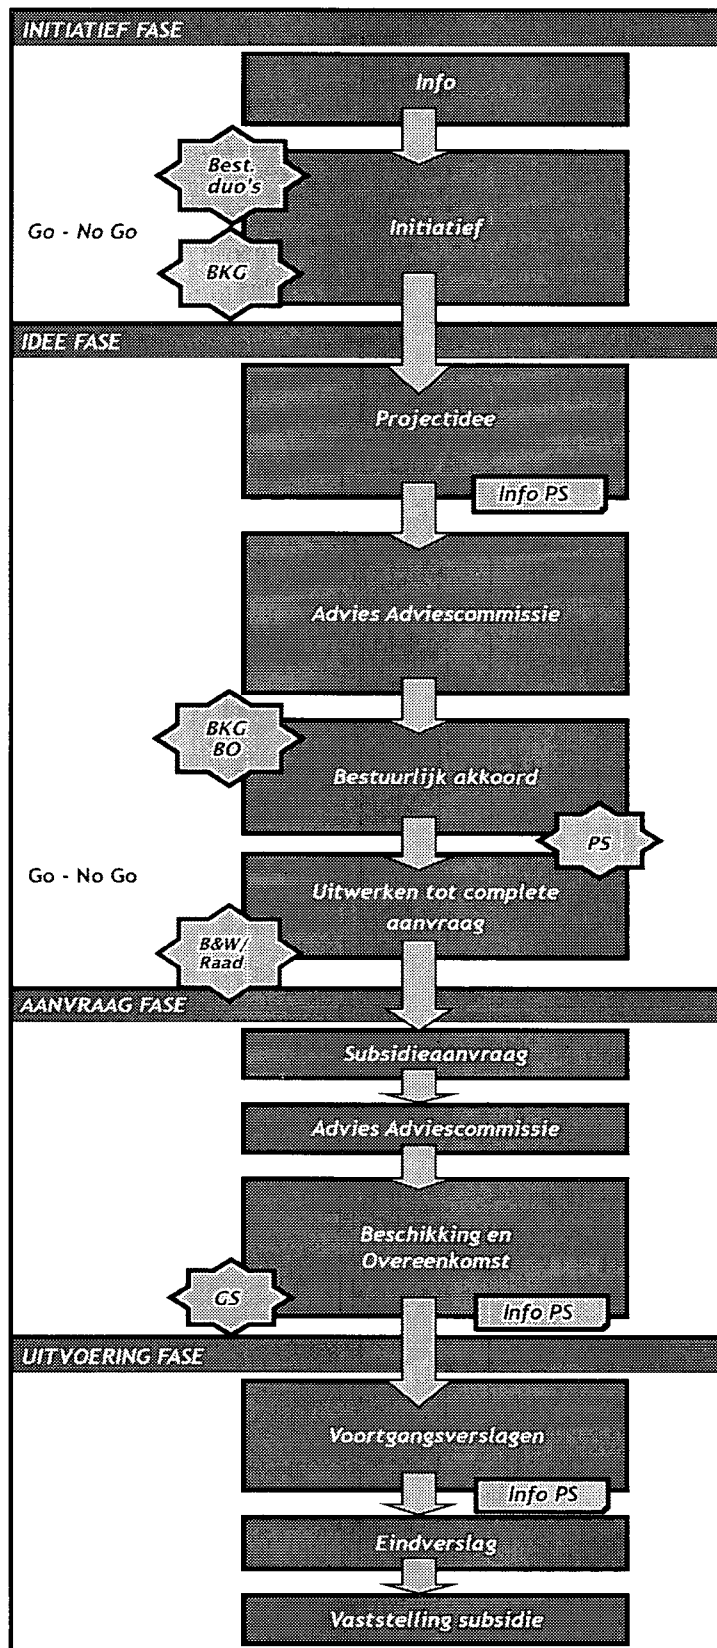



PROGRAMMALIJNEN

1. Versterking Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek
2. Versterking Voorzieningenstructuur

MAATREGELN

1. Versterken aanbod Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs
2. Versterken aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterken aanbod Sport
4. Versterken aanbod Leisure
5. Versterken aanbod Zorg

BEOOGDE RESULTATEN

- Verdere ontwikkeling tot een volledige en volwaardige stad binnen de Noordvleugel van de Randstad
- Realisering van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat
- Versterking van de economische positie binnen de Noordvleugel van de Randstad

TOETSINGSCRITEIA VOOR PROJECTEN

Algemeen inhoudelijk:

- Het project valt binnen de programmalijnen
- Topvoorziening met bovenlokale aantrekkingskracht en uitstraling
- Substantiële omvang: Minimale subsidiabele kosten bedragen € 2 miljoen
- Subsidie t.b.v. exploitatie en beheer uitgesloten
- Aantoonbaar additioneel t.o.v. de reguliere taken
- Goede onderbouwing financieel economische en maatschappelijke haalbaarheid
- Zonder bijdrage uit het IFA-2 is het project niet mogelijk

Kwalitatief inhoudelijk:

Voorkeur voor project:

- Dat direct een aantoonbare bijdrage levert aan de versterking van de positie van Almere in de Noordvleugel van de Randstad en de provincie als geheel
- Dat beide programmalijnen of andere beleidsprioriteiten versterkt
- Waarbij sprake is van samenwerking en/of coalitievorming met relevante partners
- Met een revolverend karakter

Specifiek inhoudelijk:

Voor maatregel 1 geldt:

- Een onderwijsinstelling draagt bij aan de vraag van het bedrijfsleven en sluit bij voorkeur aan op de clusters: ICT & Media, Health & Wellness, Logistics & Commerce, Duurzame gebiedsontwikkeling, Luchthaven Lelystad
- Samenwerking met een bestaande kennisinstelling bij wetenschappelijk onderwijs

