

Statencommissie Duurzaamheid 17 mei 2017

Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur en Vooruitblik Tussenevaluatie

Bespreekpunten

1. Voortgang programma Nieuwe Natuur en verwachtingen t.a.v. realisatieovereenkomsten.
2. Uitdagingen en dilemma's
3. Uitvoerbaarheid en programmavermogen
4. Vooruitblik tussenevaluatie/heroverweging einde 2017




Planning

- VORAP in Commissie 17 mei 2017
- Tussenevaluatie/VORAP in Commissie 20 december 2017 en januari 2018 in PS
- Doel: Eind 2019 (5 jaar na het toewijzingsbesluit) realisatie van alle projecten gestart.



Nieuwe natuur = experimenteren met nieuwe werkwijze

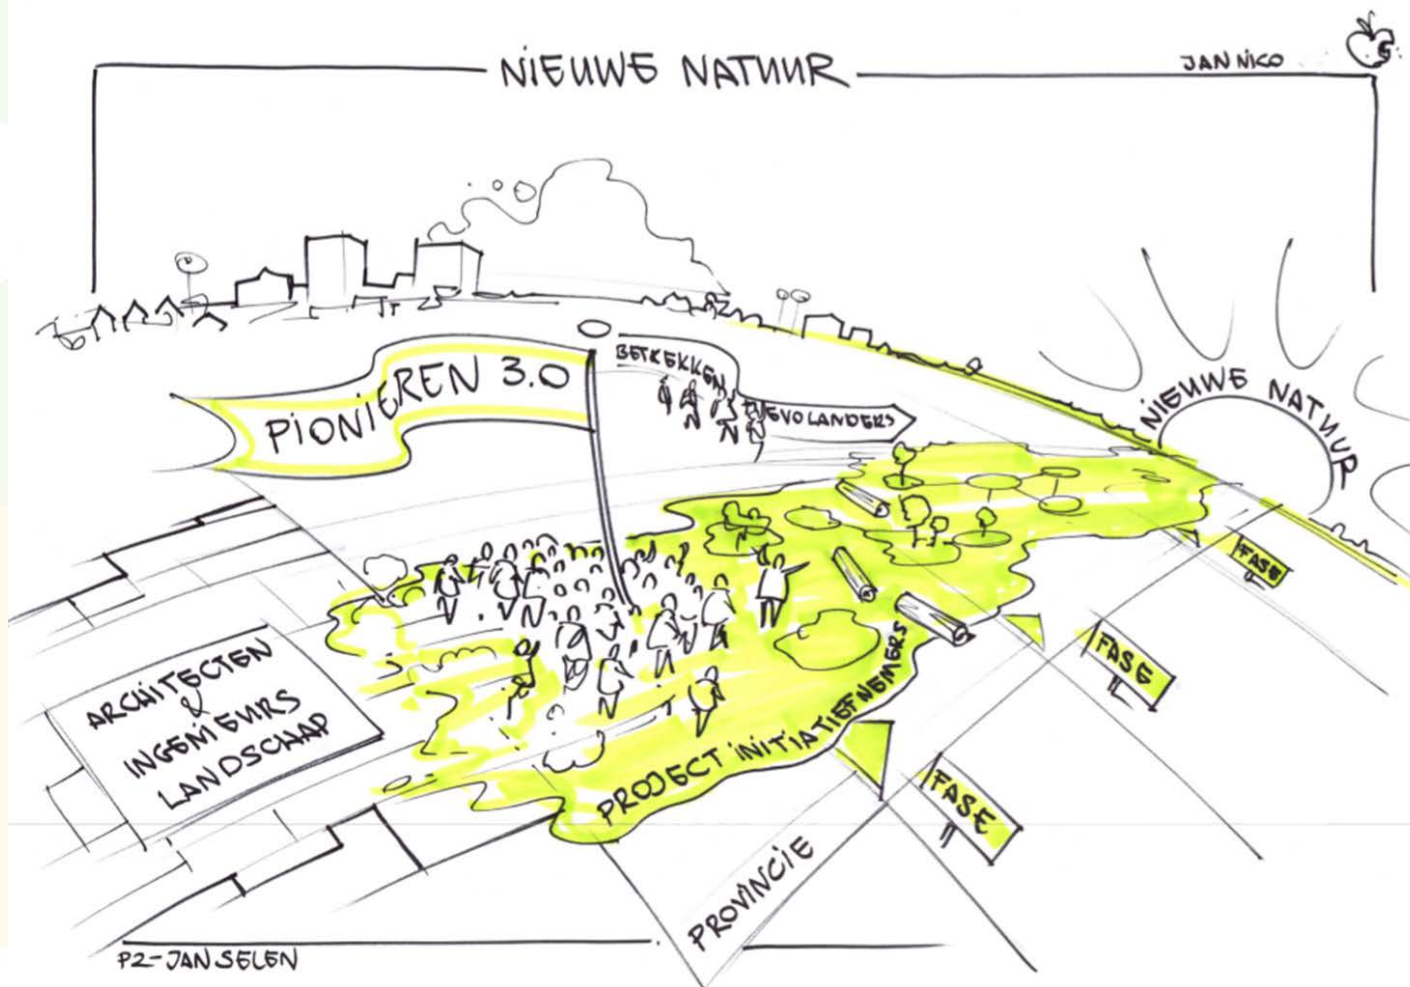


Grootste uitdagingen

- Open karakter van besluitvorming
- Wennen aan nieuwe rollen en verantwoordelijkheden
- Wegvallen DLG, provincie die van zich af organiseert
- Ontwikkelkracht/expertise/doorzettingsvermogen initiatiefnemers
- Afhankelijkheid projecten van publiek-publieke afstemming
- Daadwerkelijke Levensvatbaarheid projecten
- Nieuwe dilemma's: oprekken van de grenzen van Natuur
- Gaandeweg leren hoe met systeemverandering om te gaan
- Lessen: verwachtingen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden aan de voorkant duidelijker maken





Nieuwe Natuur = heralloceren gronden OVW

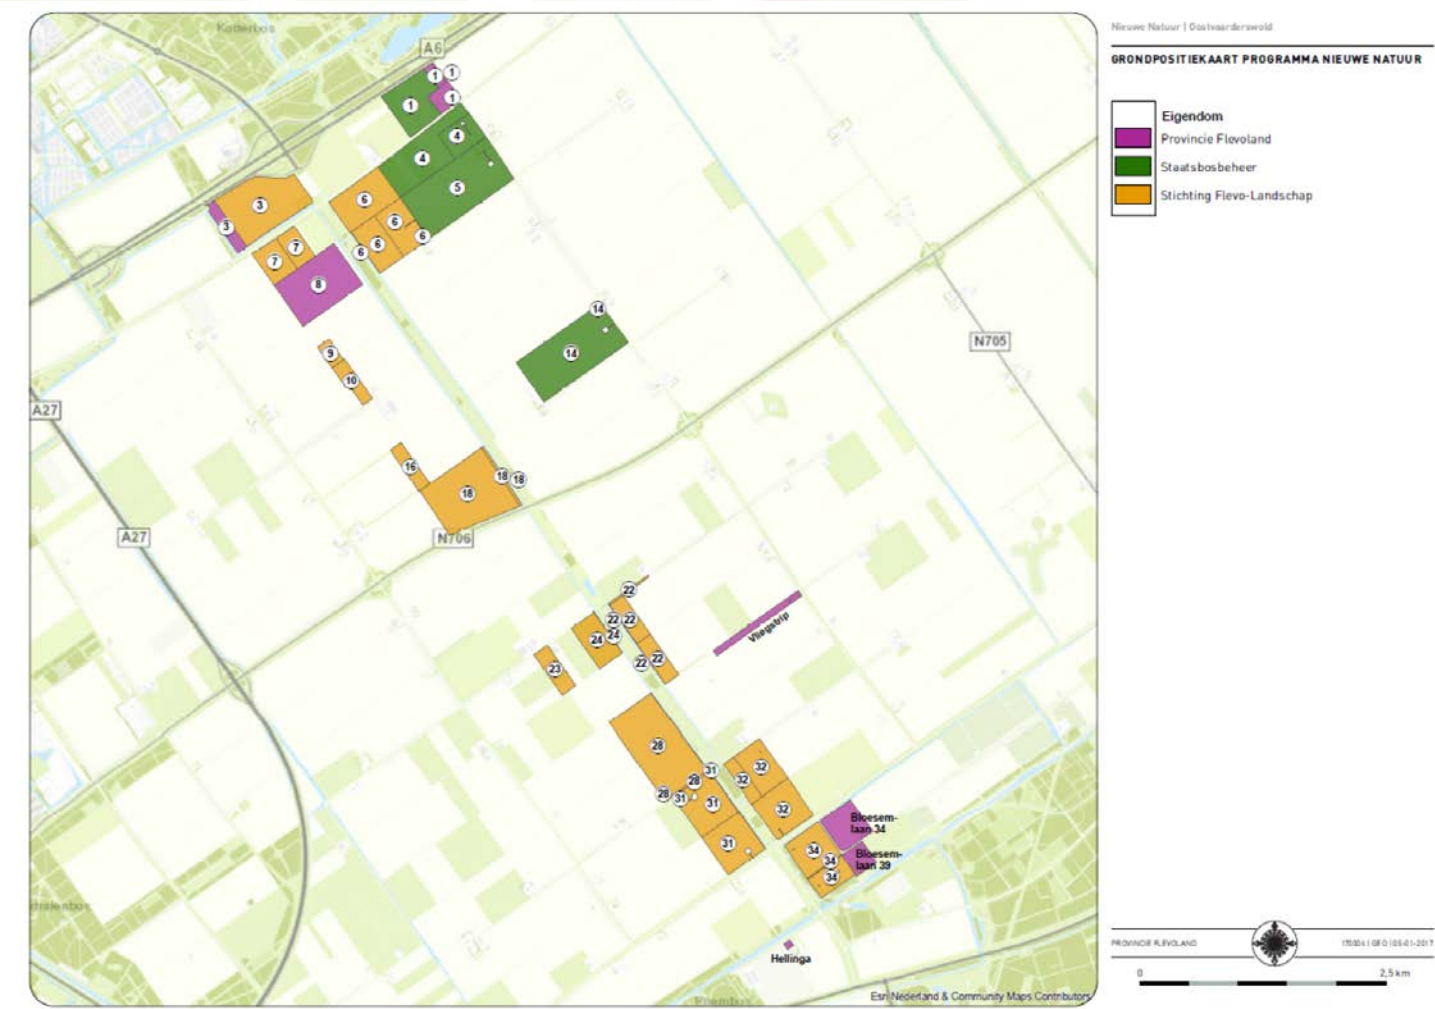


		2016	Beoordeling voortgang	2017
Kop Horsterwold	Intentie-overeenkomst	Realisatie-overeenkomst	++	In uitvoering
G38	Intentie-overeenkomst	Realisatie-overeenkomst	++	In uitvoering
Harderbroek Harderbos verbonden	Intentieovereenkomst	Realisatie-overeenkomst	++	Uitgevoerd
Swifterpark	Intentieovereenkomst	Realisatie-overeenkomst	++	Vorbereiding Uitvoering
Luierpark	Intentie-overeenkomst	Realisatie-overeenkomst	++	In uitvoering
M2 meter Natuur	Intentie-overeenkomst	Overeenkomst over pilot	++	Pilot gestart
Gouden Randen Pampush	Intentie-overeenkomst		+	2 ^e helft 2017
Urkerveld	Intentie-overeenkomst			2 ^e helft 2017
Oostvaardersplassen (3 projecten)	Intentie-overeenkomst		+	2 ^e helft 2017
Schokland	Intentie-overeenkomst		+	1 augustus 2017
Noorderwold	Intentie-overeenkomst		+	Medio 2017 (1 ^e fase) (vervolgfasen later)
Eemvallei-Zuid	Intentie-overeenkomst		+	1 juli 2017 (Middengebied later)
Voedselbossen Eemvallei	Intentie-overeenkomst		+	1 juli 2017
Speelwildernis	Intentie-overeenkomst		+/-	?
Pioniernatuur	Intentie-overeenkomst		+/-	?
NLR	Intentie-overeenkomst		+/-	?
Oostkant Dronten	Intentie-overeenkomst		+/-	Einde 2017
Kroonbos	Intentie-overeenkomst		-	Wordt niet gerealiseerd


Eemvallei/Noorderwold = meervoudig complex

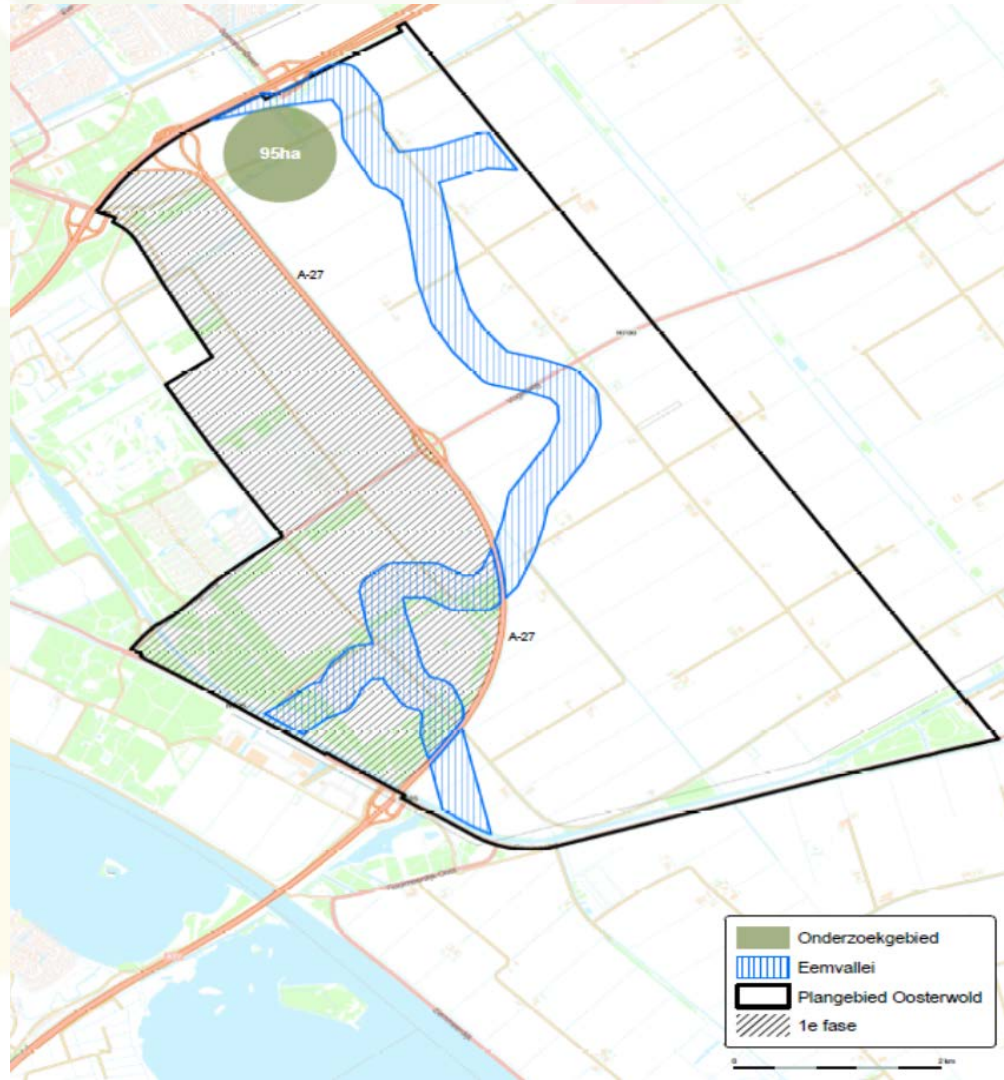

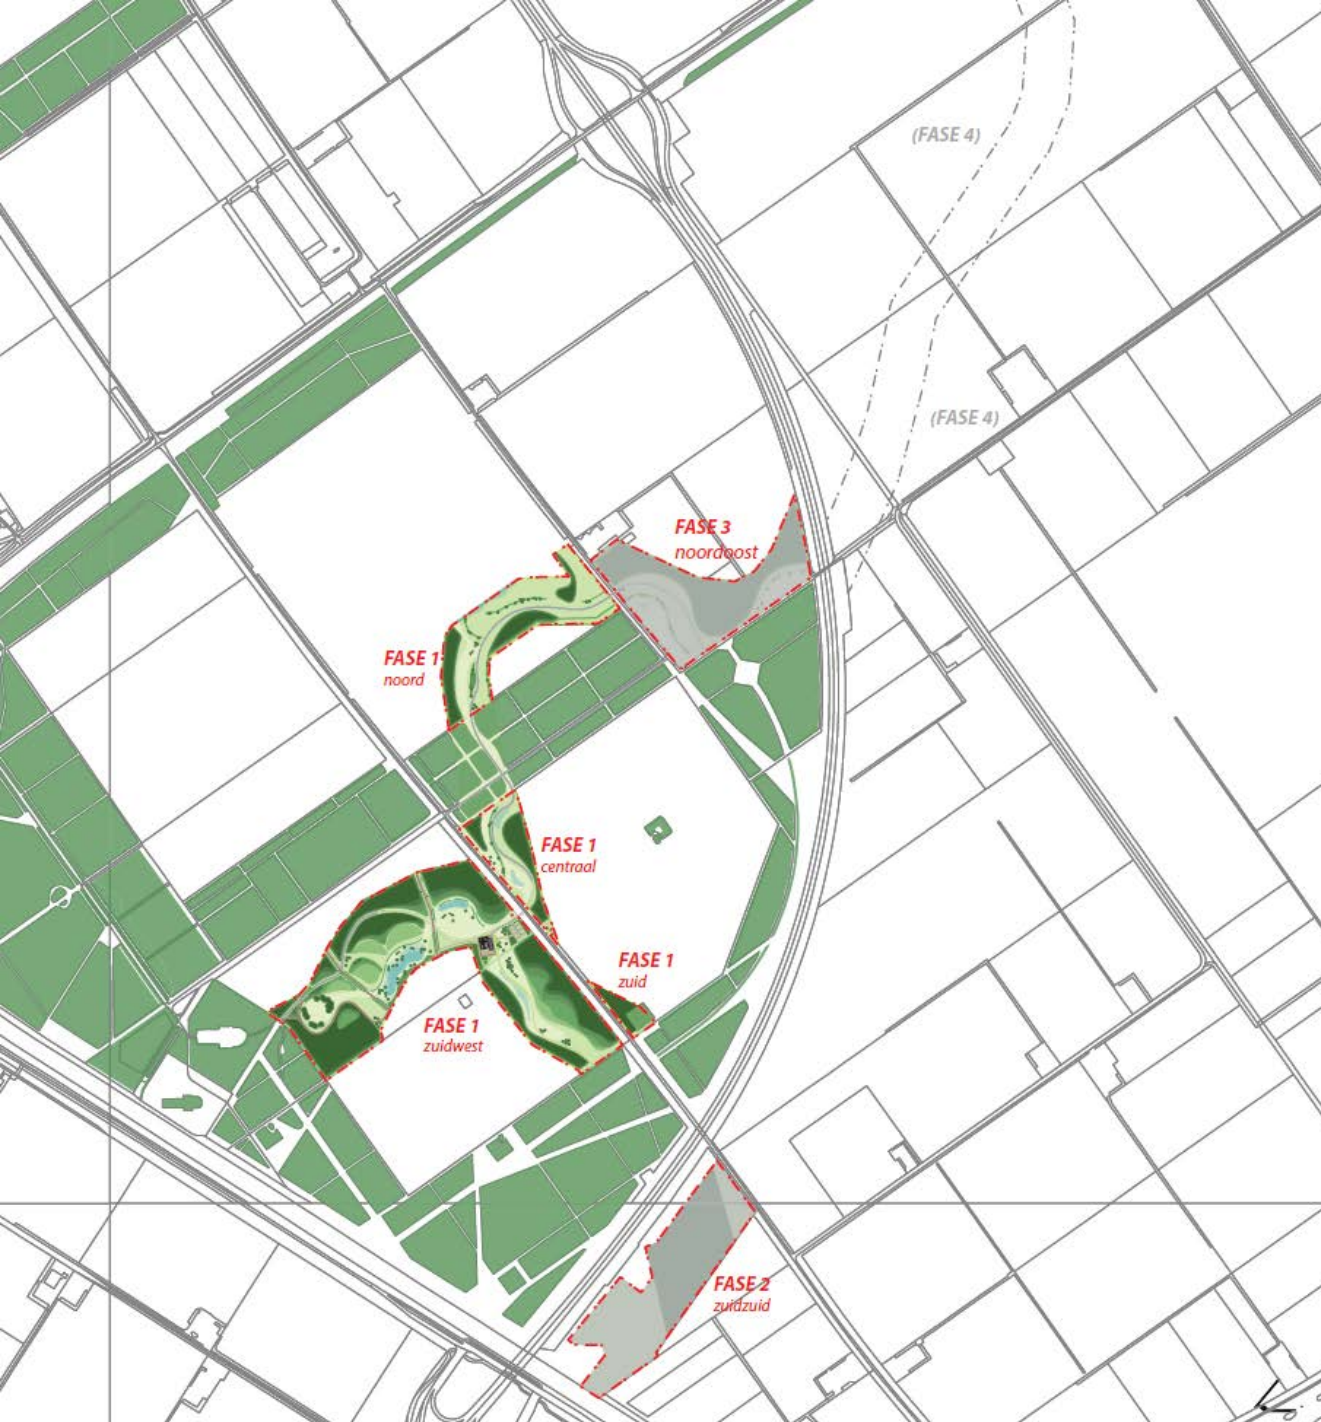



Sturen op Maatschappelijke energie= hoe doe je dat?



Verschillende rollen tegelijkertijd aan de orde

Reguleren

Regisseren

Stimuleren

Faciliteren

Loslaten

Dilemma's en leerpunten

- Sturen op maatschappelijke energie levert dilemma's op
- Ruimte laten aan maatschappelijk initiatief verenigen met verantwoording afleggen
- Hoe verschil, variëteit en maatwerk borgen
- Op welke grond komen we tot afwegingen: level playing field creëren. Tegelijkertijd maatwerk nodig.
- Transparant maken: Wat wel toestaan, wat niet en waarom
- Kortom: Uitdaging = dynamiek te verbinden met waarden van rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en verantwoording



Stand programmavermogen

- In realisatieovereenkomst vastgelegd: ca. € 20,9 mln.
- Nog beschikbaar € 88,3 mln. (€ 73,5 mln. in grond en € 14,8 mln. in geld).
- Waarvan €31,7 mln van de provincie (€16,9 mln in grond, € 14,8 mln in geld)
- Op basis van PS-besluit nog in totaal € 84,2 mln. Definitief aan projecten toe te kennen.
- De buffer bedraagt € 4,1 mln (4,7% van nog toe te kennen middelen).

Conclusies:

- Financieel toereikend: wat financieel is toegewezen is ook beschikbaar
- Daarnaast dynamiek in programmavermogen (door ontwikkeling grondprijzen). Effect op doelbereik.
- Voorlopige conclusie: programmavermogen toereikend om de nieuwe ha te realiseren. Er wordt nu getaxeed.
- Prognose gezien projectvoortgang: heroverwegingsruimte beperkt

Vooruitblik Tussenevaluatie/ Heroverweging per 1 november 2017

- Ijkpunt is 1 november
- Duidelijkheid over realisatieovereenkomsten/businesscases = financiële haalbaarheid
- Duidelijkheid over benodigd programmavermogen voor grond

In december behandeling in Cie Duurzaamheid over evt. resterende ruimte.

In welke gevallen heroverwegen?

1. projecten met r-ovk
2. projecten zonder r-ovk maar met verplichtingen/afspraken
3. projecten zonder r-ovk maar wel voldoende voortgang én reëel perspectief op start realisatie 2019
 - *Voldoende ontwikkelkracht*
 - *Voldoende draagvlak*
 - *(afspraken over) Grond op de juiste plek*
4. projecten zonder r-ovk met onvoldoende voortgang, en te weinig perspectief op start realisatie 2019

Voorstel: alleen in situatie 4. heroverwegen

Hoe om te gaan met evt. ruimte die binnen programma ontstaat?

1. Heralloceren binnen bestaande programma

Intensiveren/Extra impuls deels gehonoreerde projecten (met gedeeltelijke toewijzing of voor extra kwaliteit)

2. Reservebank

3. Anders?





	Score op meetlat 2014	Omvang	Huidige situatie
Airport Garden City	OMALA en SFL	20 ha	Oorspronkelijke voorstel zal moeten worden herijkt op actuele ontwikkelingen
Winst voor weidevogels en wintergasten - Zwarte Hoek - Ettenlandse veld	NM	41 ha	Inhoudelijk gemakkelijk te realiseren. Risico = gebrek aan draagvlak in omgeving.
Natuur en Bedrijf (familie Crijns)	Familie Crijns	58 ha	Niet meer realiseerbaar door inzet Tarpanweg voor Oostkant Dronten
Kuinderbos	SBB	30 ha	Lage score op meetlat. Gemakkelijk te realiseren

Vertrekpunten heroverweging

- Stand per 1 november 2017 is maatgevend
- Heroverwegingsruimte wordt bepaald door:
 - * projecten die definitief eindstreep niet kunnen halen
 - * ontwikkeling programmavermogen irt daadwerkelijk benodigde middelen voor de projecten
- Projecten die de eindstreep niet kunnen halen is naar verwachting beperkt.
- Eind 2017 nadere keuzes nodig hoe met eventuele ruimte om te gaan.
- Mogelijkheden reservebank = beperkt



PROVINCIE FLEVOLAND

Vragen?



Nieuwe
Natuur
