

**Onderwerp**

PS mededeling 7e voortgangsbericht Regioplan Windenergie

**Registratienummer**

2309431

**Datum**

10 oktober 2018

**Afdeling/Bureau**

RE

**Kern mededeling:**

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten bij motie verzocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang van de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met dit zevende voortgangsbericht (over het derde kwartaal van 2018) geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie.

**Openbaarheid****Openbaar****Portefeuillehouder****Fackeldey, J.A.****Ter kennisname aan PS en****burgerleden****Bijlagen**

| Naam bijlage:                                    | eDocs nummer: | Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven) |
|--|---------------|---|
| 7 <sup>e</sup> nieuwsbrief Regioplan Windenergie | 2309426       |   |
|  |               |   |
|  |               |   |

**Ter inzage in de leeskamer**

| Naam bijlage: | eDocs nummer: | Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven) |
|---------------|---------------|---|
|               |               | Tot   |



## VOORTGANGSBERICHT 7

3E KWARTAAL 2018

Voortgangsbericht uitwerking Regioplan  
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

In dit voortgangsbericht informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale beleid voor windenergie in zuidelijk en oostelijk Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de vervanging van de huidige generatie windmolens door nieuwere en efficiëntere turbines, waardoor het mogelijk is om meer dan twee keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld dat bewoners en ondernemers uit het gebied de mogelijkheid moeten krijgen om financieel in de ontwikkeling te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan economische structuurversterking en een vergroting van het lokale en regionale draagvlak.

In de zevende uitgave van dit voortgangsbericht informeren we u over de ontwikkelingen uit het 3e kwartaal van 2018. In eerdere versies van dit voortgangsbericht werd nog gesproken van een "nieuwsbrief". Omdat veel van de informatie vaak ook in separate mededelingen en/of voorstellen bij u terecht is gekomen, vinden wij het beter om te spreken van een voortgangsbericht. Dit neemt echter niet weg dat er ook nieuwe onderwerpen in het voortgangsbericht worden benoemd.

## 1. Uitvoering van de moties bij het Regioplan

### Motie 1. Vervolgtraject

Bij het vaststellen van het Regioplan op 13 juli 2016 is een motie aangenomen waarin PS hebben verzocht om regelmatig geïnformeerd te worden over de uitwerking van het regioplan. Met het voorliggende 7e voortgangsbericht wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

In dezelfde motie hebben PS verzocht om geen nieuwe projectgebieden buiten het plangebied van het Regioplan aan te wijzen zonder dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met PS. Naast de ontwikkeling van Jaap Rodenburg II (nu windpark Pampus) zijn er op dit moment geen voornemens om andere nieuwe projectgebieden aan te wijzen.

### Motie 2. Obstakelverlichting

In een tweede motie bij het regioplan heeft u verzocht om de hinder van obstakelverlichting zo veel mogelijk te beperken door in overleg te treden met het ministerie van I&M over de circulaire, zodat vastbrandende verlichting, demping, afscherming en maatwerkoplossingen mogelijk worden. Nu deze aanpassing heeft plaatsgevonden richten wij onze aandacht op de vertaling in de projecten. Om op de hoogte te blijven en mee te praten over de laatste ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot obstakelverlichting, is de provincie vertegenwoordigd in de landelijke projectgroep Obstakelverlichting. De recent uitgevoerde proeven bij windpark Krammer met het inschakelen van verlichting op basis van radar-naderingsdetectie hebben positieve resultaten opgeleverd.



Bij deze proeven wordt verlichting alleen ingeschakeld op het moment dat vliegtuigen binnen een bepaalde afstand van het park worden gedetecteerd. Beoogd wordt dat radar-naderingsdetectie opgenomen wordt in een actualisatie van het informatieblad 'Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland', welke naar verwachting eind van dit jaar in concept wordt opgesteld. Naast de onderzoeken naar radar-naderingsdetectie wordt ook onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden om de hinder van obstakelverlichting te reduceren, bijvoorbeeld door de toepassing van infraroodverlichting (niet zichtbaar licht) in combinatie met instrumenten voor piloten om infraroodlicht wél te kunnen zien. Door onze deelname aan de projectgroep Obstakelverlichting volgen wij de voortgang en resultaten van ontwikkelingen op de voet en kunnen we initiatiefnemers van de Flevolandse parken met deze kennis verder helpen.

## 2. Jaap Rodenburg II


De provincie is het bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. In de afgelopen maanden is de vergunningaanvraag beoordeeld, en hebben Gedeputeerde Staten besloten een ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming te verlenen aan initiatiefnemer voor de realisatie van windpark Jaap Rodenburg II. Het betreft de realisatie van tien turbines. Parallel met het besluit tot verlening van de ontwerpvergunning hebben Gedeputeerde Staten een ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming verleend aan de initiatiefnemer van het windpark. Een ieder kan zienswijzen op de ontwerp besluiten indienen van 27 september tot en met 8 november 2018. Provinciale Staten worden geïnformeerd wanneer de Wnb-vergunning is verleend.

## 3. Voortgang samenwerking en projecten in de vier projectgebieden

### Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)

#### *Rijksinpassingsplan vastgesteld - beroepsfase*

Tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming zijn 22 beroepschriften ingediend. De Raad van State heeft de beroepen behandeld tijdens een 3-tal zittingsdagen. Te weten 9 april, 4 en 5 juni 2018. Hoewel de uitspraak in september werd verwacht, is de uitspraak nogmaals met 6 weken verdaagd.

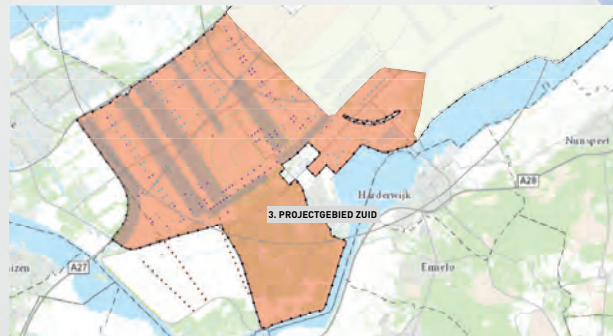

#### *Saneringsopgave*

In de commissie van 26 september 2018 is een voorstel aan Provinciale Staten besproken over de start van de onteigeningsprocedure op één locatie in het projectgebied. De besluitvorming is op 17 oktober 2018 beoogd. Ook na het nemen van het besluit zal het mogelijk blijven om tot minnelijke overeenstemming te komen.

#### *Gedooptlichtprocedure*

De initiatiefnemer heeft voor een 4-tal locaties, waarop nieuwe windmolens gebouwd worden, niet de beschikking over de benodigde gronden. Daarnaast was er een 4-tal locaties waar de initiatiefnemer niet met alle rechthebbenden overeenstemming had bereikt over de realisatie van een windmolen danwel de zogenoemde overdraai over gronden. Daarom is zij medio 2017 een gedooptlichtprocedure op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht gestart. Eind september van dit jaar heeft de minister de gedooptbesluiten afgegeven (in totaal 8 beschikkingen). Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door de belanghebbenden.




### *Saneringsfonds*

Op 21 juni 2017 heeft u besloten een saneringsfonds te beheren voor windpark Zeewolde dat gevoed wordt met de middelen vanuit het Rijk. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke wijze de gelden het beste beheerd kunnen worden. Hierover is de provincie in gesprek met de betrokken departementen en initiatiefnemer. Het ziet er naar uit dat eea zal worden vastgelegd in een specifieke doeluitkering en een privaatrechtelijke uitvoeringsovereenkomst met het windpark.

### **Windplan Blauw (Projectgebied Noord)**

#### *Rijksinpassingsplan wordt definitief vastgesteld*

Het ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Blauw heeft ter inzage gelegen van 22 juni tot en met 8 augustus. In die periode zijn 46 unieke zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn inmiddels beantwoord en de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd in het RIP. De belangrijkste aanpassingen betreffen de verplaatsing van turbines uit het Swifterbos en de aanpassing van het rustgebied voor de fuut.

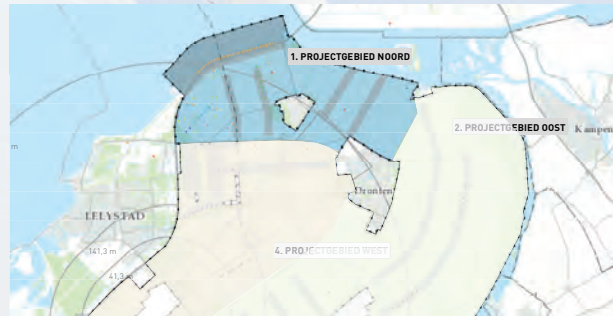

In de afgelopen weken zijn tevens de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor luchtvaart en radar verleend en heeft de initiatiefnemer met alle turbine-eigenaren afspraken gemaakt over de te saneren turbines. Hierdoor zal de inzet van het onteigeningsinstrument voor Windplan Blauw niet meer nodig zijn.

Er zijn geen belemmeringen meer om het Rijksinpassingsplan vast te kunnen stellen. De ministers van EZK en BZK gaan daarom het plan ondertekenen in de eerste helft van oktober. Na ondertekening is er een planologisch kader vastgesteld dat ruimte biedt voor de bouw van 61 nieuwe windturbines en een netto bijdrage van ca. 250 MW.

#### *Vergunning Wet Natuurbescherming*

De provincie is bevoegd gezag voor de vergunning Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten hebben deze vergunning verleend. Het besluit wordt, in het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR-procedure), samen met het Rijksinpassingsplan en andere vergunningen gepubliceerd door het Rijk.

#### *Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland*

Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerp Rijksinpassingsplan en de ontwerp vergunningen heeft ook het ontwerp besluit van de Gedeputeerde Staten over de aanpassing van de verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 ter inzage gelegen. De aanpassing voorziet in de optimalisatie van twee plaatsingszones ten behoeve van het windpark. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerp besluit, die geen aanleiding gaf het besluit aan te passen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de plaatsingszones aan te passen conform het ontwerp besluit.

### **Windplan Groen (Projectgebied Oost)**

In projectgebied Groen hebben de initiatiefnemers en het merendeel van de bestaande turbine-eigenaren elkaar gevonden in Windkoepel Groen.

#### *Voorkeursalternatief*

De initiatiefnemers van Windplan Groen (Windkoepel Groen) hebben in samenspraak met de betrokken overheden een voorkeursalternatief (hierna: VKA) ontwikkeld voor de invulling van het projectgebied "Oost" uit het Regioplan.





Het betreft een plan voor de realisatie van 109/110 nieuwe windmolens ter vervanging van de 98 bestaande windmolens in het gebied.

Op 19 september hebben Provinciale Staten kennis genomen van het VKA en ingestemd met de afwijkingen van het beleid die hiervoor nodig waren. Naar aanleiding van de behandeling in de Staten is een mededeling met een aanvullende toelichting op de windmolen-aantallen verzonden (edocs # 2315466) en wordt een moment georganiseerd om technische vragen over de sanity check te bespreken.

#### *Pré-toets luchtvaart*

Op dit moment vindt intensief overleg plaats met de betrokken luchtvaartinstanties. In een pré-toets wordt beoordeeld in hoeverre het plan voldoet aan de eisen in het kader van de luchtvaartveiligheid en of het mogelijk is de wettelijk benodigde verklaring van geen bezwaar af te geven voor het plan. Tijdens de overleggen is een aantal discussiepunten naar voren gekomen. De betrokken overheden hebben afgesproken te werken aan een oplossing waarin zowel het luchtvaart-belang als duurzame-energiebelang met elkaar te verenigen zijn. Wij houden u op de hoogte over uitkomsten van het overleg.

#### *Planning*

De planning van het project is er nu op gericht dat het VKA wordt vertaald in een voorontwerp Rijksinpassingsplan dat in december 2018 aan de overlegpartners (waaronder Provinciale Staten) kan worden voorgelegd. Doel is om in het najaar 2019 de SDE+ subsidie aan te kunnen vragen. Hiervoor is het nodig dat het Rijksinpassingsplan is vastgesteld.

#### **Projectgebied West**

In het projectgebied West hebben de deelnemers (6 exploitanten van lijnopstellingen en 15 solitaire windturbine eigenaren en de windvereniging Windshare) overheden gevraagd mee te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden van het projectgebied. De initiatiefnemers zijn op dit moment in gesprek met de betrokken luchtvaartinstanties en verkennen met welke opstelling zij een haalbare businesscase voor het gebied kunnen realiseren. Als zij hiervoor realistische mogelijkheden zien, willen zij met de betrokken overheden een intentieovereenkomst sluiten.

