



Programma Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (MAB)

Programmaplan plateau 4

Beeldvorming PS

28 november 2018

Lenne Huisman
Programmamanager MAB



2. Programma MAB: aanpak

Plateaubenadering

- . Geen 'groot ICT-programma', maar een 'bundel' van activiteiten
- . In samenhang gezien/bestuurd
- . Stap voor stap ('plateau')

Filosofie

- . Resultaatgericht
- . Hoge kans van slagen (risico's minimaal)
- . Zelf doen (en leren van externe inhuur)
- . 'Must do/no regret'

Programma

- . Kleine programma-organisatie
- . Besturing door IV Raad (met lijnmanagers)
- . Eigenaarschap lijnmanagement (borging resultaten)
- . In samenhang met 'regulier' werk
- . Optimale inzet medewerkers IV (en afdelingen)

3. Programma MAB: plateau kenmerken

Plateau	Jaar	Kernmerken
0/1	2016-2017	onderzoekend, inventariserend en verkennend
2	2017 (vanaf april)	1e stappen voor een toekomst-bestendige IT, investering in kennis/kunde en 'basis' op orde
3	2018	oplevering en (leren) gebruiken van nieuwe IT-systemen; de 'basis' is nu goed op orde
4	2019	nieuwe functionaliteiten en IT-systemen en overdracht (van projectresultaten) naar en borging (van kennis) in de staande organisatie van de provincie


3. Programma MAB: resultaten P3 en ambities P4 (samenvatting)

Thema	Onderwerp	Plateau 3 (gereed)	Plateau 4 (ambitie)
1. Kennis/capaciteit	<ul style="list-style-type: none"> . IV-functies . Rollen 	<ul style="list-style-type: none"> . Ingevuld/geborgd . Uitgewerkt 	<ul style="list-style-type: none"> . Invulling (privacy en datamanagement)
2. Basis op orde	<ul style="list-style-type: none"> . BCM . Digitale paraaf . DMS (eDocs) . Werkplek-O365 . Informatiebeheer . ICT-beheer . Privacy 	<ul style="list-style-type: none"> . Uitgewerkte plannen . Verkenning . Herinrichting & upgrade . Uitgerold . Archiefverordening en BIB . Basis op orde . Basis (AVG compliant) 	<ul style="list-style-type: none"> . Praktijktesten . Systeem tbv vergaderen/besluitvorming . Ondersteuning gebruik . Kwaliteitssysteem . POC DC en aanbesteding . Afronding
3. Digitaal in verbinding	<ul style="list-style-type: none"> . Integratie . Basisregistraties . E-Diensten . Open data 	<ul style="list-style-type: none"> . Deel 1 (ESB) operationeel . BRO tranche 1 . Platform + e-formulieren . GOBS en Open Staten 	<ul style="list-style-type: none"> . Deel 2 (Data-platform) . BRO vervolg . In beheername . Vervolg FS!
4. Ruimte	<ul style="list-style-type: none"> . Omgevingswet/DSO . Natuurketen . VISI 	<ul style="list-style-type: none"> . Verkenningen (oa dossiervorming) . E-formulier . Operationeel 	<ul style="list-style-type: none"> . Voorbereidingen (proefneming) . Voortzetting ambities P3
5. ICT Toekomstvast	<ul style="list-style-type: none"> . IT-landschap . Digi vaardigheid . Mobiele Werkplek . E-Depot . Systeemtoegang . ICT-monitoring . Digitale innovaties 	<ul style="list-style-type: none"> . In beeld/geborgd . Plan en 1e stappen . Voorbereidingen (laptop/telefonie) . (uitstel) . IAM systeem ingericht . Gensys herinrichting . Big data (Natuur) 	<ul style="list-style-type: none"> . Masterclasses . Uitrol . Aansluiting . IAM-systeem gebruik . Big data en blockchain

“Na plateau 4 zal de provincie Flevoland op ICT-gebied in voldoende mate ‘toekomstvast’ zijn”

3. Programma MAB: overzicht plateau 4

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering Provincie Flevoland 2015-2019

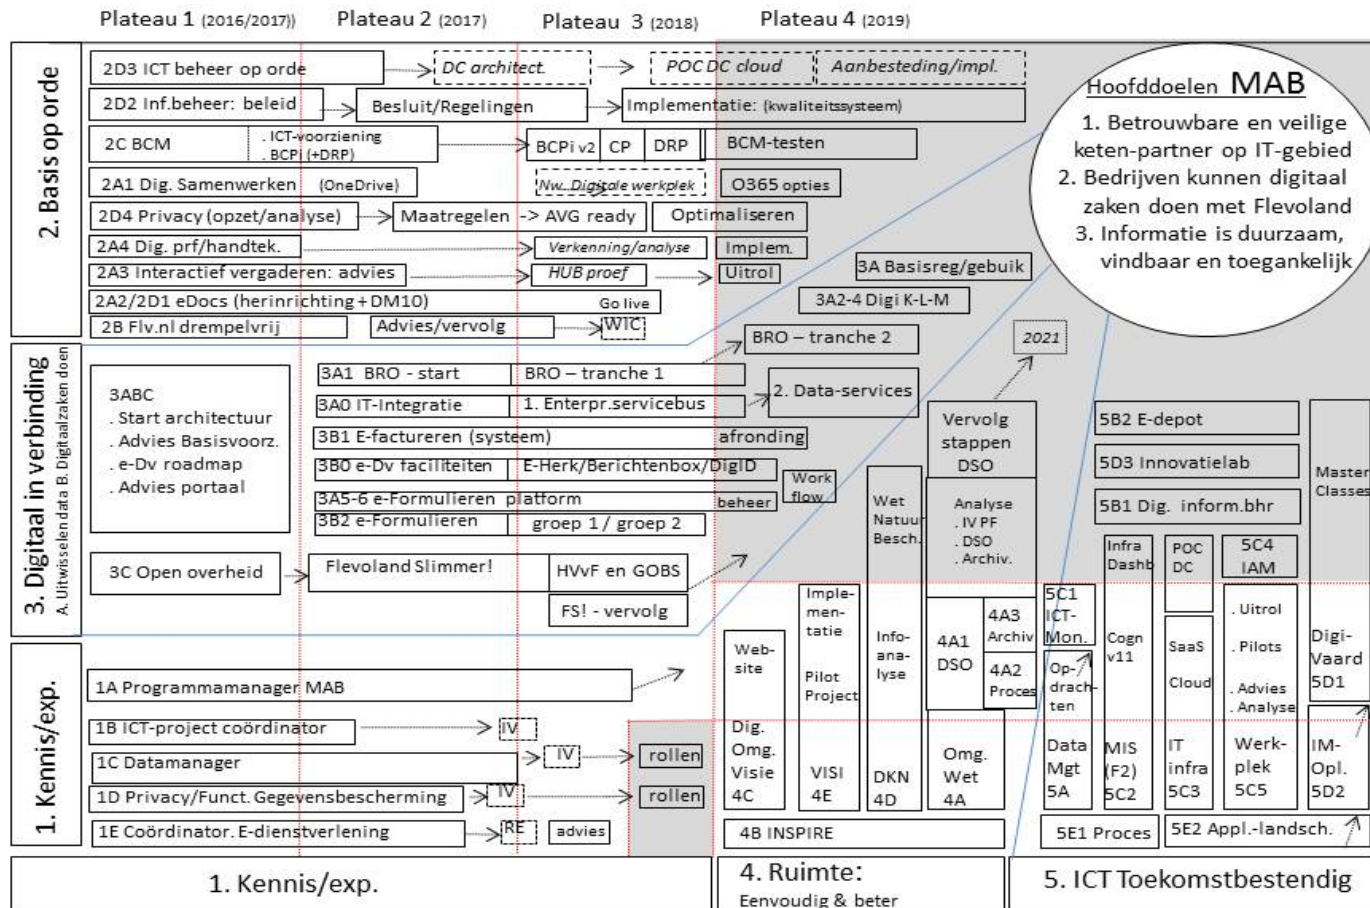

2. Programma MAB - ondersteuning (samenvatting)

Experts

- . Programmamanager
- . Functioneel beheerder werkplek (O365)
- . Adviseur Informatiebeheer
- . Informatie-architect (o.a. digitaal informatiebeheer)
- . Projectleiders (Integratie/data, DSO, Infra Projecten Dashboard, Cloud DC, IAM, Mobiele Werkplek)

Expertise (bedrijf)

- . Open Overheid
- . Digivaardigheden
- . Innovatie

Leverancier

- . ICT-beheer
- . e-Factureren
- . IAM

3. Programma MAB: kosten (per plateau)

Plateau	Jaar	Budget (€ 1000)	Besteed (€ 1000)	Overloop (€ 1000)
0/1	2016/ 2017	€1600	€1300	€ 300
2	2017 (vanaf april)	€2040	€ 920	€ 970
3	2018	€2450	€1315	€ 800
4	2019	€2317		

Overloop plateau 3 naar plateau 4 (grootste posten/beeld week 47)

- . Integratie/data (€ 125k)
- . BRO (€ 94k)
- . Informatiebeheer (€ 88k)
- . Digitale Keten Natuur (€ 100k)
- . DC Cloud (€ 138k)
- . Innovaties (€ 131k)
